

16 листопада

Київ, Unit.City

online&offline

Project Conference

Як відслідкувати
реалізацію
стратегії?



Past Masters and Future Legends

вівторок

серeda

четвер

п'ятниця

субота

неділя

12

13

14


15

16






17

CPD1_Module2 ; Київ, школа PRO PM; Nataliia Prysukhina

Перша зустріч команди

Project Business - Leo Cor Повоєнна відбудова Україн
PRO PM ConstructionКоммерциялық жобалар
бойынша жиналыс (ОУП
PMO (ОУП))LEO Product Development se
Serhii Chekhla

LEO Product Development session

 15 квітня 2022 р. 13:00-14:30 Serhii ChekhlaEmil HomeWorks Emil HomeWorks Emil HomeWorks Emil HomeWorks 

PMO for cities; Oleksiy Prosnit

MVP Summit Feedback Revie
Microsoft Teams Meeting; LauРобоча зустріч по партнера
Нарада Microsoft Teams; Svitl

Today



1 - 7 серпня 2022

понеділок

вівторок

середа

четвер

п'ятниця

субота

неділя

1 Сер

2

3

4

5

6

7

Потрібен відпочинок, беру ...

Перший замовник

Совещание ОУП -

Розгортання рішення, організаційні питання

🕒 3 серпня 2022 р. 10:00-12:00

📍 Железнодорожное шоссе 57

👤 РМО IT

Розгортання рішення, орган
Железнодорожное шоссе 57
РМО IT

CCG: 365 & Project
Mechnikova 2

LEO PPM; Microsoft Teams M

Project Management for N

Power BI Report for audit

Euroizol
Каффа (Skovc
Oleksiy Prosn

Зустріч Парт
Microsoft

OnePlan; Microsoft Teams Mi

Project Asses PPM; Собрат

Робоча зустріч по партне

X-Park Meeting
Serhii Chekhla

Hairdress

English - Lesson 3 - Friends



TAS Agro



acino

КОВАЛЬСЬКА

ДАРНИЦЯ



ЮРІЯ-ФАРМ

Q PARTNERS

енzym



Можливості LEO PPM

UKR мова

Стратегія

Портфель

Програми

Проекти

Ініціативи

Фінанси

OKR

Ризики

Зміни

Ресурси

Стейкхолдери

Продукти

Вигоди

База знань

Документи

Графіки

Інтеграції

Звіти

Шаблони

Тренди

C-Level

Стратегічні цілі та OKR

Management

Портфелі

Програми

Проекти

Продукти

PM & Teams

Класичні, Agile та гібридні підходи

Проекти

Задачі

Блоки функціоналу

Управління стратегією (OKR)

Управління портфелями

Управління запитами/ідеями

Управління проектами

Управління програмами

Управління
продуктами

Управління
фінансами

Управління
стейкхолдерами

Управління
ризиками

Управління змінами

Вивчені уроки

Управління
стадіями
(stage gate)

Управління
життєвим циклом

Управління
ресурсами

Управління
завданнями
проекту

Past Masters

Досягнення стратегічної цілі

Довести частку ринку будівельних компаній до 25% від доходу – збережено

Стратегічна ціль

Картка стратегічної цілі Запити на проєкт Проєкти Портфелі Продукти

Побудова тренду

Загальне

Назва * Довести частку ринку будівельних компаній до 25% від д...

Опис
Конче необхідно сконцентруватися на збільшенні долі будівельних компаній в нашому портфелі замовлень

Власник запису * Olesia Honchar (доступно) ×

Відповідальний Yurii Stepanov (офлайн) ×

Пріоритет Середній

Дата початку 1/1/2024

Крайній термін 12/31/2024


Очікувана дата досягнення 12/31/2024

Фактична дата досягнення ---

Активний звіт про стан

Трекер реалізації

● (Поточне значення)



Звіт про стан

Логування досягнення

<input type="checkbox"/>	Поточне значення	Дата звіту	Додаткові коментарі
<input type="checkbox"/>	21	5/2/2024	Підписано договір з Альфою
<input type="checkbox"/>	20	5/1/2024	Вийшли на ринок Терабітії
<input type="checkbox"/>	17	4/29/2024	Підписано договір з компанією
<input type="checkbox"/>	16	3/30/2024	Проведено конференцію

Рядки: 4

Objectives

Strategic Goals/Pillars

Objective 1

Key Result 1

Key Result N

Active Objectives ⌵ Edit columns Edit filters Filter by keyword

<input type="checkbox"/> Name ↑ ⌵	Objective Status ⌵	Objective Progress, % ⌵				
<input type="checkbox"/> > Вирости в кількості продажів 2024	New	0				
<input checked="" type="checkbox"/> ⌵ Покращення клімату в компанії 2024	Achieved	100				
<input type="checkbox"/> ⌵						
<input type="checkbox"/> Name ↑ ⌵	Status ⌵	Weight Rate, % ⌵	Initial Value ⌵	Current Value ⌵	Target Value ⌵	Progress, % ⌵
<input type="checkbox"/> Впровадження обов'язкових обнімашок	Achieved	30	4	7	7	100
<input type="checkbox"/> Встановлення ваз з квітами в усіх приміщеннях	Achieved	20	5	15	9	250
<input type="checkbox"/> Збільшення долі кавоварок в офісі	Achieved	50	3	10	8	140
Rows: 3						
<input type="checkbox"/> > Покращити рівень задоволеності клієнтів 2024	In Progress	0				


Key Result

← ↻ Save Save & Close + New Deactivate Delete Refresh Check Access Assign Flow Word Templates Run Report Share

Збільшення долі кавоварок в офісі - Saved Achieved Status 9/12/2024 4:47 AM Created On Daniil Balya Created By Daniil Balya Owner


Key Result

General Related Projects

Name * Збільшення долі каво... Result Progress 

Measure as * % Percentage

Initial Value * 3


Current Value  10

Target Value * 8

Description ---

Weight Rate, % * 50

Related Objective * [Покращення кл...](#)


Count of Projects  1

Last updated: 11/15/2024 9:27 AM

Active Status Reports

Realization Tracker

(Current Value)



Month (Report Date)	Current Value
Jul 2024	3
Aug 2024	5
Sep 2024	7
Mar 2025	8
Jun 2025	10

Status Reports + New Status Report

<input type="checkbox"/>	Current Val...	Report Date ↓	Additional comments ↓
<input type="checkbox"/>	10	6/25/2025	Коментар Червня
<input type="checkbox"/>	8	3/27/2025	Коментар березня
<input type="checkbox"/>	7	9/23/2024	Коментар вересня
<input type="checkbox"/>	5	8/5/2024	Коментар Серпня
<input type="checkbox"/>	3	7/1/2024	Коментар Липня

Rows: 5

Оцінка запитів за допомогою Slider control

LEO PPM Implementation in A company – збережено

Запит на проєкт

Olesia Honchar
Автор

1/16/2024 1:16 PM
Дата створення

Project Request Lifecycle
Активно протягом 9 міс.

Новий

Узгодження Стратегії (9 Міс.)

Аналіз

На Розгляді

Картка запиту на проєкт

Бізнес-кейс

Продукти

Вигоди

Затвердження !

Загальне

Назва запиту * LEO PPM Implementation in A company

Опис запиту на проєкт ---

Власник запису * Daniil Balya (зайнято)

Ініціатор ---

Тип запиту на проєкт * Розробка нових продуктів

Управління

Поточна стадія

Керівник проєкту * Oleg Snurnikov (доступно)

Спонсор * Oleksiy Prosnitskyi (не турбувати)

Замовник ---

Ухвалене рішення ---

Створити проєкт із запиту? Ні

Критерії відбору

Пріоритет запиту на проєкт	<input type="text" value="1"/>	<input type="range"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="7"/>
Узгодженість зі стратегією	<input type="text" value="1"/>	<input type="range"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="7"/>
Інноваційність	<input type="text" value="1"/>	<input type="range"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="7"/>
Узгодженість цілей	<input type="text" value="1"/>	<input type="range"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="8"/>
Простота виконання	<input type="text" value="1"/>	<input type="range"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="8"/>
Безризиковість	<input type="text" value="1"/>	<input type="range"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="7"/>

Контроль реалізації milestones

01. Business Central Implementation – збережено

План · Класична форма проєкту

Initiation Поточна стадія 1/16/2024 12:32 PM Дата створення BusinessCentralImplementation Власник запису

Classic Project Lifecycle Активно протягом 10 міс.

Ініціація Планування Виконання (9 Міс.) Запуск Закриття

Картка проєкту Статус Ресурси Завдання Планування Календар Базовий план Фінанси Продукти Стейкхолдери Ризики Інциденти Статусні звіти Засвоєні уроки

Загальне

Назва * 01. Business Central Implementation

Опис Впровадження Business Central може допомогти підвищити ефективність операцій, знизити витрати та підвищити конкурентоспроможність на ринку.

Менеджер проєкту * Oleksiy Prosnitskiy (не турбувати)

Спонсор проєкту Daniil Balva (зайнято)

Milestone status 11.11.2024

2024		
<input type="radio"/>	Контракт підписаний	17.04.2024
<input checked="" type="radio"/>	Бізнес кейс підписано	08.05.2024
<input type="radio"/>	Фінальне ТЗ узгоджено	04.09.2024

Completed
 Delayed
 Future

Керуйте milestones або deliverables
Без потреби переходу в графік проєкту

Статусні звіти в проектах

LEO CONSULTING LEO PPM Demo

← Зберегти Зберегти та закрити + Новий проект зти проект Вим

01. Business Central Implementation – збережено

План · Класична форма проекту ▾

Classic Project Lifecycle
Активно протягом 9 міс.

Ініціація Планування

Картка проекту Статус Ресурси Завдання ПлануКалендар Базові

Пов'язані

<input type="checkbox"/>	Автор ▾	Дата створення ▾	Дата звіту ▾	% Завершення ▾
<input type="checkbox"/>	Serhii Chekhla (Не в ме...)	5/2/2024 7:35 AM	5/2/2024	0.13
<input type="checkbox"/>	Oleksiy Prosnitskyu (Зай...)	3/21/2024 10:44 AM	3/21/2024	0.13
<input type="checkbox"/>	Serhii Chekhla (Не в ме...)	8/12/2024 11:15 AM	8/10/2024	0.11
<input type="checkbox"/>	Serhii Chekhla (Не в ме...)	5/15/2024 7:31 AM	5/16/2024	0.13

Рядки: 8

Швидке створення: Статусний звіт

Дата звіту

11/10/2024

Коментар

Все чудово, тільки нічого не виходить

Розклад

* Не задано >10% <10% Без відхилень

Якість

* Не задано >10% <10% Без відхилень

Трудовитрати

* Не задано >10% <10% Без відхилень

Витрати

* Не задано >10% <10% В бюджеті

Ресурси

* Не задано Недоступні Під ризиком Доступні

Обсяг

* Не задано Кілька змін Зі змінами Без змін

Зберегти й закрити

Скасувати

Управління стейкхолдерами

01. Business Central Implementation – збережено

Initiation
Поточна стадія

1/16/2024 12:32 PM
Дата створення

Busi
Влас

План · Класична форма проєкту

Classic Project Lifecycle
Активно протягом 9 міс.

Ініціація

Планування


Виконання (9 Міс.)

Запуск

Картка проєкту Статус Ресурси Завдання Планування Календар Базовий план Фінанси Продукти Стейкхолдери Ризики Інциденти Статусні звіти

Матриця стейкхолдерів

Матриця ранжування по впливу та інтересу

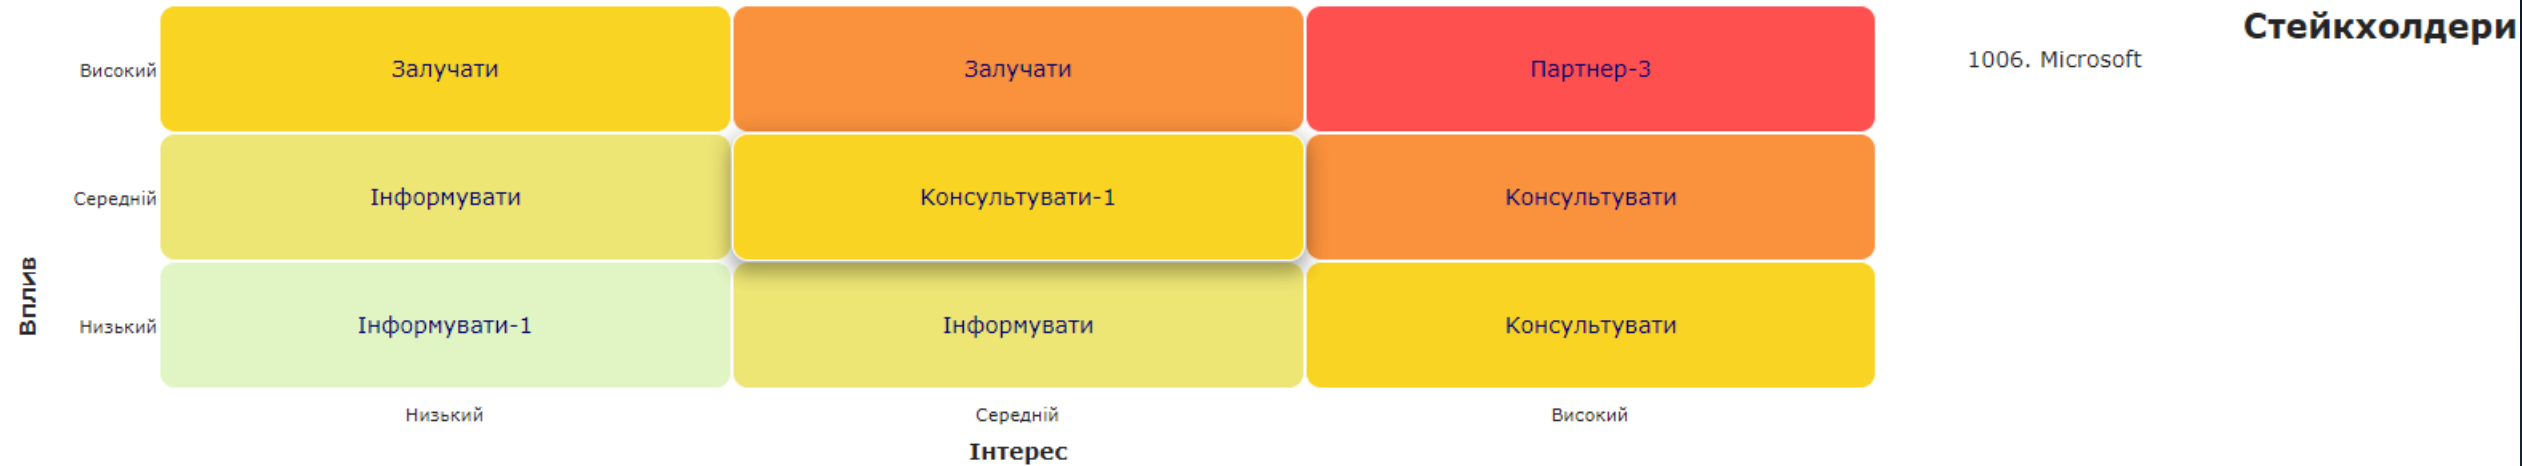

Стейкхолдери проєкту

Список всіх стейкхолдерів проєкту

+ Створити Стейкхолдер + Додати наявну

<input type="checkbox"/>	Назва ↑	Посада	Пов'язано з	Вплив	Інтерес	Поточний рівень підтр...	Потрібний рівень підтрим...	Тип комунікації	Відпо
<input type="checkbox"/>	Microsoft		Проєкт	Сере...	Серед...	Нейтральний	Нейтральний	E-mail	
<input type="checkbox"/>	Serhii Chekhla	Head of PP	Проєкт	Висо...	Високий	Нейтральний	Провідний	E-mail	

Матриця ризиків

01. Business Central Implementation – збережено

План · Класична форма проєкту

Initiation
Поточна стадія

1/16/2024 12:32 PM
Дата створення

BusinessCentralImplementation
Власник запису

Classic Project Lifecycle
Активно протягом 9 міс.

Ініціація

Планування

Виконання (9 Міс.)


Запуск

Закриття

Картка проєкту · Статус · Ресурси · Завдання · Планування · Календар · Базовий план · Фінанси · Продукти · Стейкхолдери · **Ризики** · Інциденти · Статусні звіти · Засвоєні уроки

Матриця

Матриця ранжування по впливу та ймовірності

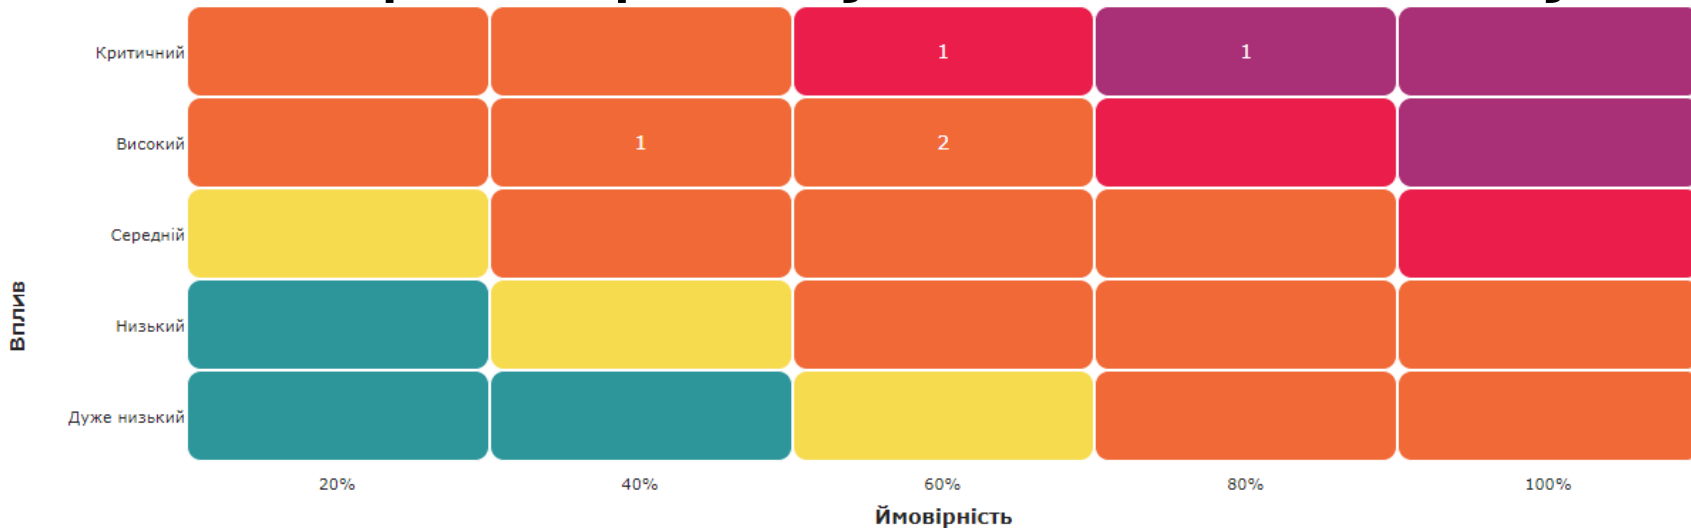

Ризики

- 1003. Відмова від участі стейкхолдерів
- 1002. Втрата даних
- 1042. Затягування термінів через незрілість підрядника
- 1001. Недостатня підготовка персоналу
- 1004. Неправильна оцінка вимог

Пов'язані ризики

Список всіх ризиків проєкту

+ Створити Ризик + Додати наявну сутніс... Оновити

<input type="checkbox"/>	Назва ↑	Тип ризику	Категорії ризику	Статус	Імовірність	Вплив	Стратегія ризику (загрози)	Відповідальний за ст...	Термін мо...	Пов'язано з
<input type="checkbox"/>	Відмова від участі стейкхолдерів	Загроза	Ризик зацікавлени...	Виз...	Середній/С...	Критичний/Крит...	Уникати	Olesia Honchar (Не на ...)		Проєкт
<input type="checkbox"/>	Втрата даних	Загроза	Ризик продуктивно...	Виз...	Низький/Н...	Високий/Висока	Запасний	Anastasiia Komendant (...)		Проєкт

Модальні вікна

The screenshot displays a web application interface for LEO PPM Demo. A modal dialog box titled "Create Project from Request" is centered on the screen. The dialog contains the following text:

Шановний користувач,
якщо Ви хочете створити Проект з даного запиту, натисніть OK, збережіть запис. Зачекайте трохи, процес може зайняти певний час. Потім оновіть сторінку. У полі Проект має з'явитись посилання на проект.
Або натисніть Cancel щоб відмінити створення.

At the bottom of the dialog are two buttons: "Cancel" and "OK".

The background interface shows a sidebar with navigation options like "Головна", "Останні", "Закріплено", "Домашня", "Домашня Сторінка", "Стратегія", "PPM", "Запити на проект", "Портфелі", "Програми", "Проекти", and "Артефакти". The main content area displays a project request for "LEO PPM in Apple Music" with a status of "Новий (9 Міс.)". A table of selection criteria is visible on the right side of the interface.

Критерій відбору	Значення	Максимум	Важкість
Пріоритет запиту на проект	1	10	8
Узгодженість зі стратегією	1	10	10
Інноваційність	1	10	8
Узгодженість цілей	3	10	8
Простота виконання	1	10	8
Безризиковість	1	10	8

Автоформування документів

https://leoppmdemo.crm4.dynamics.com/main.aspx?appid=47b7455a-0baf-ee11-a569-000d3ad7ec2d&pagetype=entityrecord&etn=msdyn_project&id=dd2b2a08-fe53-4b81-814...

Learn | Microsoft D... Microsoft Dynamics... OnePlan PRO PM LEO

LEO CONSULTING LEO PPM Demo Пошук

Зберегти Зберегти та закрити Новий проект Копіювати проект Вимкнути Відкрити в Project Видалити Оновити Перевірити доступ Надати спільний доступ

Business Central Implementation – збережено

План · Класична форма проекту

Initiation Поточна стадія 1/16/2024 12:32 PM Дата створення BusinessCentralImplementation Власник запису

Classic Project Lifecycle Активно протягом 10 міс.

Ініціація Планування Виконання (9 Міс.) Запуск Закриття

Картка проекту Статус Ресурси Завдання Планування Календар Базовий план Фінанси Продукти Стейкхолдери Ризики Інциденти Статусні звіти Засвоєні уроки

операції, знизити витрати та підвищити конкурентоспроможність на ринку.

Менеджер проекту * [Oleksiy Prosnitskyi \(зайнято\)](#) ×

Спонсор проекту [Daniil Balya \(не на місці\)](#) ×

Замовник [Юрій Охрименко](#) ×

Кінцевий користувач [Марія Шевченко](#) ×

Статус Активний

Інструмент планування Project for the Web

Тип проекту IT

[Завантажити статус](#)

Пов'язані

Пов'язана програма [Міграція на Microsoft 365](#) ×

% Трудовитрат **17%**

Останнє оновлення статусів 11/5/2024 2:36 PM

Якість	Не задано	>10%	<10%	Без відхилень
Витрати	Не задано	>10%	<10%	В бюджеті
Ресурси	Не задано	Недоступні	Під ризиком	Доступні
Зміст	Не задано	Кілька змін	Зі змінами	Без змін

Milestone status 15.11.2024

2024		
🔴	Контракт підписаний	17.04.2024
🟢	Бізнес кейс підписано	08.05.2024
🔴	Фінальне ТЗ узгоджено	04.09.2024

Базові плани

Базовий план на рівні завдань

01. Business Central Implementation – збережено

План · Класична форма проекту ▾

Initiation
Поточна стадія

1/16/2024 12:32 PM
Дата створення

BusinessCentralImplementation
Власник запису

Classic Project Lifecycle
Активно протягом 9 міс.



Ініціація



Планування



Виконання (9 Міс.)



Запуск



Закриття

Картка проекту Статус Ресурси Завдання Планування Календар Базовий план Фінанси Продукти Стейкхолдери Ризики Інциденти Статусні звіти Засвоєні уроки

Меню



Корегування 3 етапу (Версія: 3) 19/03/2024 Основний ▾

Дата створення 19/03/2024
Автор: Olesia Honchar

Опис: Доповнення

Оновити

№	Назва завдання	Базовий початок	Початок	Відхилення початку	Базове завершення	Завершення	Відхилення по завершенню	Базова тривалість	Тривалість	Відхилення по тривалості	Базові трудовитрати	Трудовитрати	Відхилення по трудовитратам	Виконано %	Прогноз %	Відхилення %
Σ	Загалом по проекту	16/11/2023	16/11/2023	0	22/07/2024	04/09/2024	33	178	210	32	799.6	648	-152	--	--	--
1	Business Central Implementation	16/11/2023	16/11/2023	0	22/07/2024	04/09/2024	33	177	210	33	799.6	648	-152	10%	0%	10%
2	1. Ініціація проекту	16/11/2023	16/11/2023	0	10/01/2024	08/05/2024	86	39	124	85	205	207	2	42%	0%	42%
3	Бізнес кейс підписано Нова	--	08/05/2024	0	--	08/05/2024	0	0	0	0	0	0	0	100%	0%	100%
4	1.1 Визначення цілей проекту	16/11/2023	16/11/2023	0	20/11/2023	20/11/2023	0	3	3	0	24	24	0	100%	0%	100%
5	1.2 Написання Бізнес-кейсу	21/11/2023	21/11/2023	0	22/11/2023	06/12/2023	11	2	12	10	16	40	24	0%	0%	0%
6	1.3 Визначення зацікавлених сторін	23/11/2023	07/12/2023	11	28/11/2023	12/12/2023	11	4	4	0	32	10	-22	50%	0%	50%
7	1.4 Написання статуту проекту	29/11/2023	13/12/2023	11	30/11/2023	14/12/2023	11	2	2	0	16	16	0	0%	0%	0%
8	1.5 Погодження попередніх пунктів з замовником і спонсором	01/12/2023	15/12/2023	11	05/12/2023	19/12/2023	11	3	3	0	21	21	0	0%	0%	0%
9	1.6 Пошук підрядника на виконання робіт	06/12/2023	06/12/2023	0	21/12/2023	21/12/2023	0	12	12	0	96	96	0	83%	0%	83%
10	Підрядник знайдений Видалено	10/01/2024	--	0	10/01/2024	--	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%

10 версій out-of-the-box (up to 100)

01. Business Central Implementation – збережено

План · Класична форма проекту ▾

Classic Project Lifecycle
Активно протягом 9 міс.

Ініціація Планування Виконання (9 Міс.)

Картка проекту Статус Ресурси Завдання Планування Календар **Базовий план** Фінанси Продукти Стейкхолдери

Меню Корегування 3 етапу (Версія: 3) 19/03/2024 Основний Дата створення 19/03/2024 Автор: Olesia Honchar Опис: Доповнення

№		Базовий початок	Початок
Σ	Загалом по проекті	16/11/2023	16/11/2023
1	Business Central	16/11/2023	16/11/2023
2	1. Ініціація проекту	16/11/2023	16/11/2023
3	Бізнес кейс	--	08/05/2023
4	1.1 Визначення цілей проекту	16/11/2023	16/11/2023
5	1.2 Написання Бізнес-кейсу	21/11/2023	21/11/2023
6	1.3 Визначення зацікавлених сторін	23/11/2023	07/12/2023
7	1.4 Написання статуту проекту	29/11/2023	13/12/2023
8	1.5 Погодження попередніх пунктів з замовником і спонсором	01/12/2023	15/12/2023

Filters:

- Критичний шлях
- Віха
- Відхилення по завершенню
- $-x \leq 3$
- $3 < x \leq 6$
- $x > 6$

Збереження нового БП Основний БП Перезапис існуючого БП

Версія: 1

Назва базового плану
Основний

Опис базового плану
Введіть опис базового плану

Статус:

Зберегти

Вибір основного базового плану

01. Business Central Implementation – збережено

План · Класична форма проєкту ▾

Classic Project Lifecycle
Активно протягом 9 міс.

Ініціація Планування Виконання (9 Міс.)

Картка проєкту Статус Ресурси Завдання Планування Календар **Базовий план** Фінанси Продукти Стейкхолдери

Меню Корегування 3 етапу (Версія: 3) 19/03/2024 Основний Дата створення 19/03/2024 Автор: Olesia Honchar Опис: Доповнення

№		Базовий початок	Початок
Σ	Загалом по проєкті	16/11/2023	16/11/2023
1	Business Central	16/11/2023	16/11/2023
2	1. Ініціація проєкту	16/11/2023	16/11/2023
3	Бізнес кейс	--	08/05/2024
4	1.1 Визначення цілей проєкту	16/11/2023	16/11/2023
5	1.2 Написання Бізнес-кейсу	21/11/2023	21/11/2023
6	1.3 Визначення зацікавлених сторін	23/11/2023	07/12/2023
7	1.4 Написання статуту проєкту	29/11/2023	13/12/2023
8	1.5 Погодження попередніх пунктів з замовником і спонсором	01/12/2023	15/12/2023

Filters: ×

- Критичний шлях
- Віха
- Відхилення по завершенню
- $-x \leq 3$
- $3 < x \leq 6$
- $x > 6$

Збереження нового БП **Основний БП** Перезапис існуючого БП

Оберіть БП як основний

Оберіть базовий план: ▾

- Основний (Версія: 1) 10/11/2024
- Корегування 3 етапу (Версія: 3) 19/03/202...

Статус:

Зберегти налаштування

Вибір базового плану

План · Класична форма проекту ▾

Classic Project Lifecycle

Активно протягом 9 міс.

Поточна стадія

Ініціація

Планування

Виконання (9 Міс.)

Запуск

Картка проекту

Статус

Ресурси

Завдання

Планування

Календар

Базовий план

Фінанси

Продукти

Стейкхолдери

Ризики

Інциденти

Меню



Корегування 3 етапу (Версія: 3) 19/03/2024 Основний ▾

Дата створення 19/03/2024
Автор: Olesia Honchar

Опис: Доповнення

№		Базовий початок	Початок	Відхилення початку	Базове завершення	Завершення	Відхилення по завершенню	Базова тривалість	Тривалість	Відхилення по тривалості	Базові трудовитрати	Трудовитрати
Σ	Загалом по проекті	16/11/2023	16/11/2023	0	22/07/2024	04/09/2024	33	178	210	32	799.6	648
1	Business Central	16/11/2023	16/11/2023	0	22/07/2024	04/09/2024	33	177	210	33	799.6	648
2	1. Ініціація проекту	16/11/2023	16/11/2023	0	10/01/2024	08/05/2024	86	39	124	85	205	207
3	Бізнес кейс	--	08/05/2024	0	--	08/05/2024	0	0	0	0	0	0
4	1.1 Визначення цілей проекту	16/11/2023	16/11/2023	0	20/11/2023	20/11/2023	0	3	3	0	24	24
5	1.2 Написання Бізнес-кейсу	21/11/2023	21/11/2023	0	22/11/2023	06/12/2023	11	2	12	10	16	40
6	1.3 Визначення зацікавлених сторін	23/11/2023	07/12/2023	11	28/11/2023	12/12/2023	11	4	4	0	32	10
7	1.4 Написання статуту проекту	29/11/2023	13/12/2023	11	30/11/2023	14/12/2023	11	2	2	0	16	16
8	1.5 погодження попередніх пунктів з замовником і спонсором	01/12/2023	15/12/2023	11	05/12/2023	19/12/2023	11	3	3	0	21	21

Filters:

- Критичний шлях
- Віха
- Відхилення по завершенню
- $-x \leq 3$
- $3 < x \leq 6$
- $x > 6$

Базовий план портфеля

Будівництво котеджних містечок – збережено

Портфель

1/16/2024 1:10 PM

Дата створення



Olesia Honchar

Власник запису

Картка портфеля Програми Запити на проєкт **Проєкти** Стейкхолдери Ризики Інциденти

Пов'язані

+ Створити План + Додати наявну сутніс... Оновити

Фільтрування за кл...

<input type="checkbox"/>	Назва ▾	Менеджер проєкту ▾	Тип проєкту ▾	Статус ▾	Інструмен... ▾	Дата початку ▾	Фактична дата ... ▾	% Прогрес ▾	Тривалість (днів) ▾	Дата завершення ▾
<input type="checkbox"/>	Котеджне містечко "Край спокою"	Olesia Honchar (Не н...	Розробка нових про...	Закритий	MS Planner	1/6/2024		27	178.00	2/5/2025
<input type="checkbox"/>	Котеджне містечко "Зелений острів"	Olesia Honchar (Не н...	Маркетинг	Активний	MS Project	1/6/2024			66.00	9/30/2024
<input type="checkbox"/>	Котеджне містечко "Аквамарин"	Daniil Balya (Не на мі...	Розробка нових про...	Активний	MS Project	1/6/2024		73	41.00	2/15/2023

Рядки: 3

№	Назва завдання	Базовий початок	Початок	Відхилення початку	Базове завершення	Завершення	Відхилення по завершенню	Базова тривалість	Тривалість	Відхилення по тривалості
Σ	Portfolio Total	03/06/2024	21/12/2022	-379	05/02/2025	05/02/2025	0	178	556	378
Σ	> Котеджне містечко "Аквамарин"	--	21/12/2022	0	--	15/02/2023	0	0	41	41
Σ	> Котеджне містечко "Край спокою"	03/06/2024	03/06/2024	0	05/02/2025	05/02/2025	0	178	178	0
Σ	> Котеджне містечко "Зелений острів"	01/07/2024	01/07/2024	0	30/09/2024	30/09/2024	0	66	66	0

Фінанси проекту

Три рівня вкладеності

01. Business Central Implementation – збережено
План · Класична форма проєкту ▾

Classic Project Lifecycle
Активно протягом 9 міс.

Ініціація Планування Виконання (9 Міс.)

Картка проєкту Статус Ресурси Завдання Планування Календар Базовий план **Фінанси** Продукти Ст...

Test		0
✓ Виробниче обладнання		300,000
✓ IT обладнання		500,000
Сервер		10,133
✓ Торговельне обладнання		170,000
▾ 2. Ліцензії		1,300,000
✓ Microsoft		500,000
✓ SAP		800,000
3. Інше		0
▾ Операційні витрати		0

2.8M
2.1M
1.4M

Налаштування Конфігурація **Статті витрат**

Оберіть необхідні статті витрат

Стаття витрат першого рівня
Капітальні витрати, Операційні витрати ▾

Стаття витрат другого рівня
1. Заробітна плата, 1. Заробітна плата, 2. Ліцензії, 2. Лі... ▾

Стаття витрат третього рівня
Microsoft, SAP, Test, Виробниче обладнання, IT обладн... ▾

Застосувати зміни

Загальний cash-flow

01. Business Central Implementation – збережено

Initiation
Поточна стадія

1/16/2024 12:32 PM
Дата створення

BusinessCentralImplementation
Власник запису

План · Класична форма проєкту

Classic Project Lifecycle
Активно протягом 10 міс.

Ініціація

Планування

Виконання (9 Міс.)

Запуск

Закриття

Картка проєкту Статут Ресурси Завдання Планування Календар Базовий план **Фінанси** Продукти Стейкхолдери Ризики Інциденти Статусні звіти Засвоєні уроки

Базовий план, Бюджет... 2024 2025 2026 2027 2028


Оновити




Базовий план

2024

	Загальні суми за рік			Січень			Лютий			Березень	
	Базовий план	Бюджет	Факт	Базовий план	Бюджет	Факт	Базовий план	Бюджет	Факт	Базовий план	Бюджет
▼ Капітальні витрати	2,842,500	2,270,000	2,842,500	387,500	145,000	387,500	490,000	500,000	490,000	765,000	875,000
> 1. Обладнання	1,303,000	970,000	1,303,000	133,000	145,000	133,000	490,000	500,000	490,000	130,000	225,000
> 2. Ліцензії	1,539,500	1,300,000	1,539,500	254,500	0	254,500	0	0	0	635,000	650,000
3. Інше	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▼ Операційні витрати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
> 1. Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Оренда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Підтримка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net CF за період	2,842,500	2,270,000	2,842,500	387,500	145,000	387,500	490,000	500,000	490,000	765,000	875,000
Залишок \$ на початок періоду	0	0	0	0	0	0	387,500	145,000	387,500	877,500	645,000
Залишок \$ на кінець періоду	0	0	0	387,500	145,000	387,500	877,500	645,000	877,500	1,642,500	1,520,000

Business Process Flow Viewer



LEO PPM Demo

+




- Home
- Recent
- Pinned
- Home page
- Home
- Strategy
- PPM
- Project Requests
- Portfolios
- Programs
- Projects
- Artefacts

Будівництво котеджних містечок - Saved




1/16/2024 3:10 PM
Created On


Olesia Honchar
Owner

Summary
Programs
Project Requests
Projects
Stakeholders
Risks
Issues

Related + New Project


Filter by keyword

<input type="checkbox"/>	Name	Project manager	Project Type	Status	Tool	St
<input type="checkbox"/>	Котеджне містечко "Край спокою"	 Olesia Honchar (Av...)	New Product Devel...	Closed	MS Plan...	1/
<input type="checkbox"/>	Котеджне містечко "Зелений острів"	 Olesia Honchar (Av...)	Marketing	Active	MS Proj...	1/
<input type="checkbox"/>	Котеджне містечко "Аквамарин"	 Daniil Balya (Busy)	New Product Devel...	Active	MS Proj...	1/


Rows: 3

Projects via Lifecycle + New Project


Котеджне містечко "Край спокою"



Котеджне містечко "Зелений острів"




Котеджне містечко "Аквамарин"



№	Task Name	Baseline Start	Start	Start Variance	Baseline Finish	Finish	Finish Variance	Baseline Duration
Σ	Portfolio Total	03/06/2024	21/12/2022	-379	05/02/2025	05/02/2025	0	178
Σ	> Котеджне містечко "Аквамарин"	--	21/12/2022	0	--	15/02/2023	0	0
Σ	> Котеджне містечко "Край спокою"	03/06/2024	03/06/2024	0	05/02/2025	05/02/2025	0	178
Σ	> Котеджне містечко "Зелений острів"	01/07/2024	01/07/2024	0	30/09/2024	30/09/2024	0	66

Integration

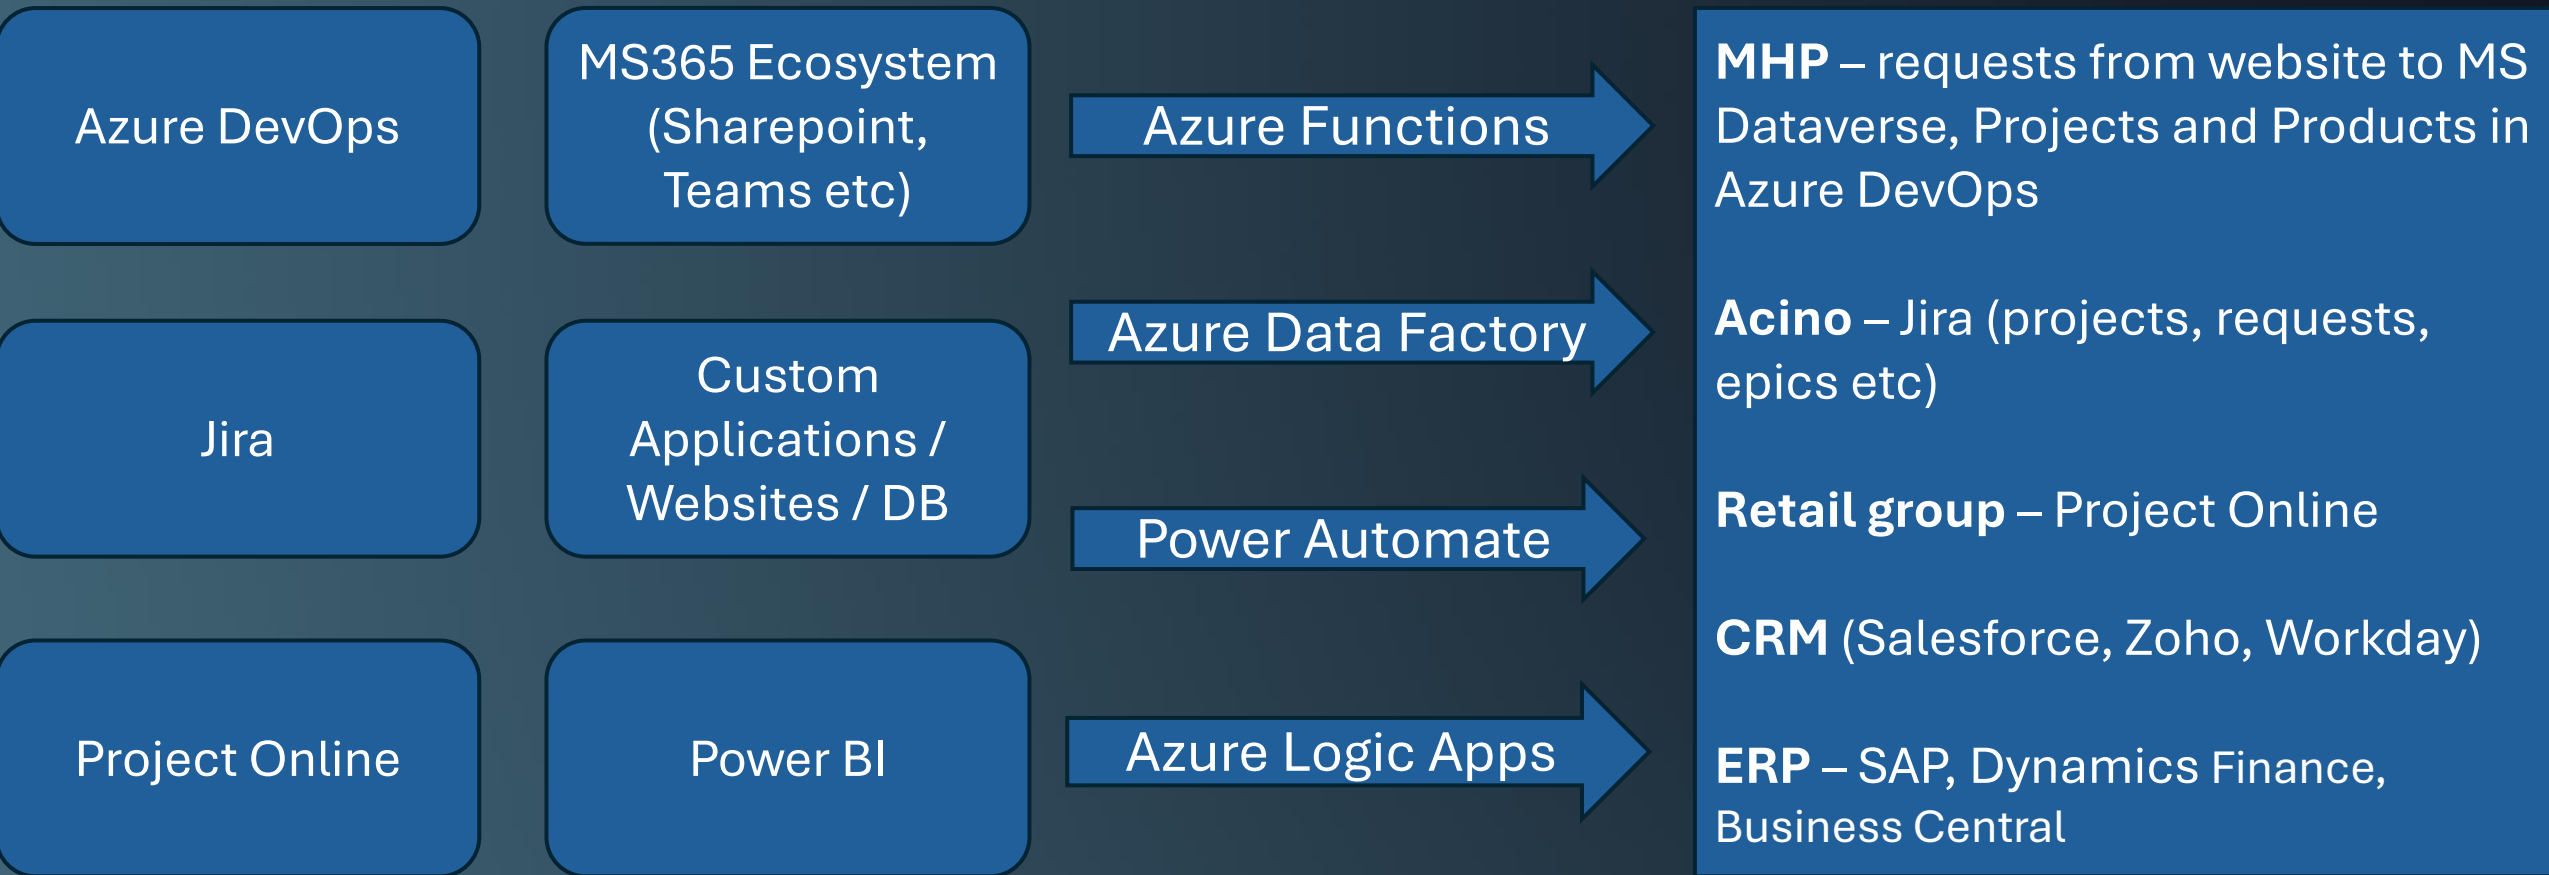

Gantt Chart

Ukrainian UI

Tested 5000 tasks

Unlimited years period

Real time task calculation

Freedom to develop customer features

Expected behavior

Hot keys


Full screen mode

Task Search

Outline level (1-5)


Integration and automation

Gantt Chart: Zoom

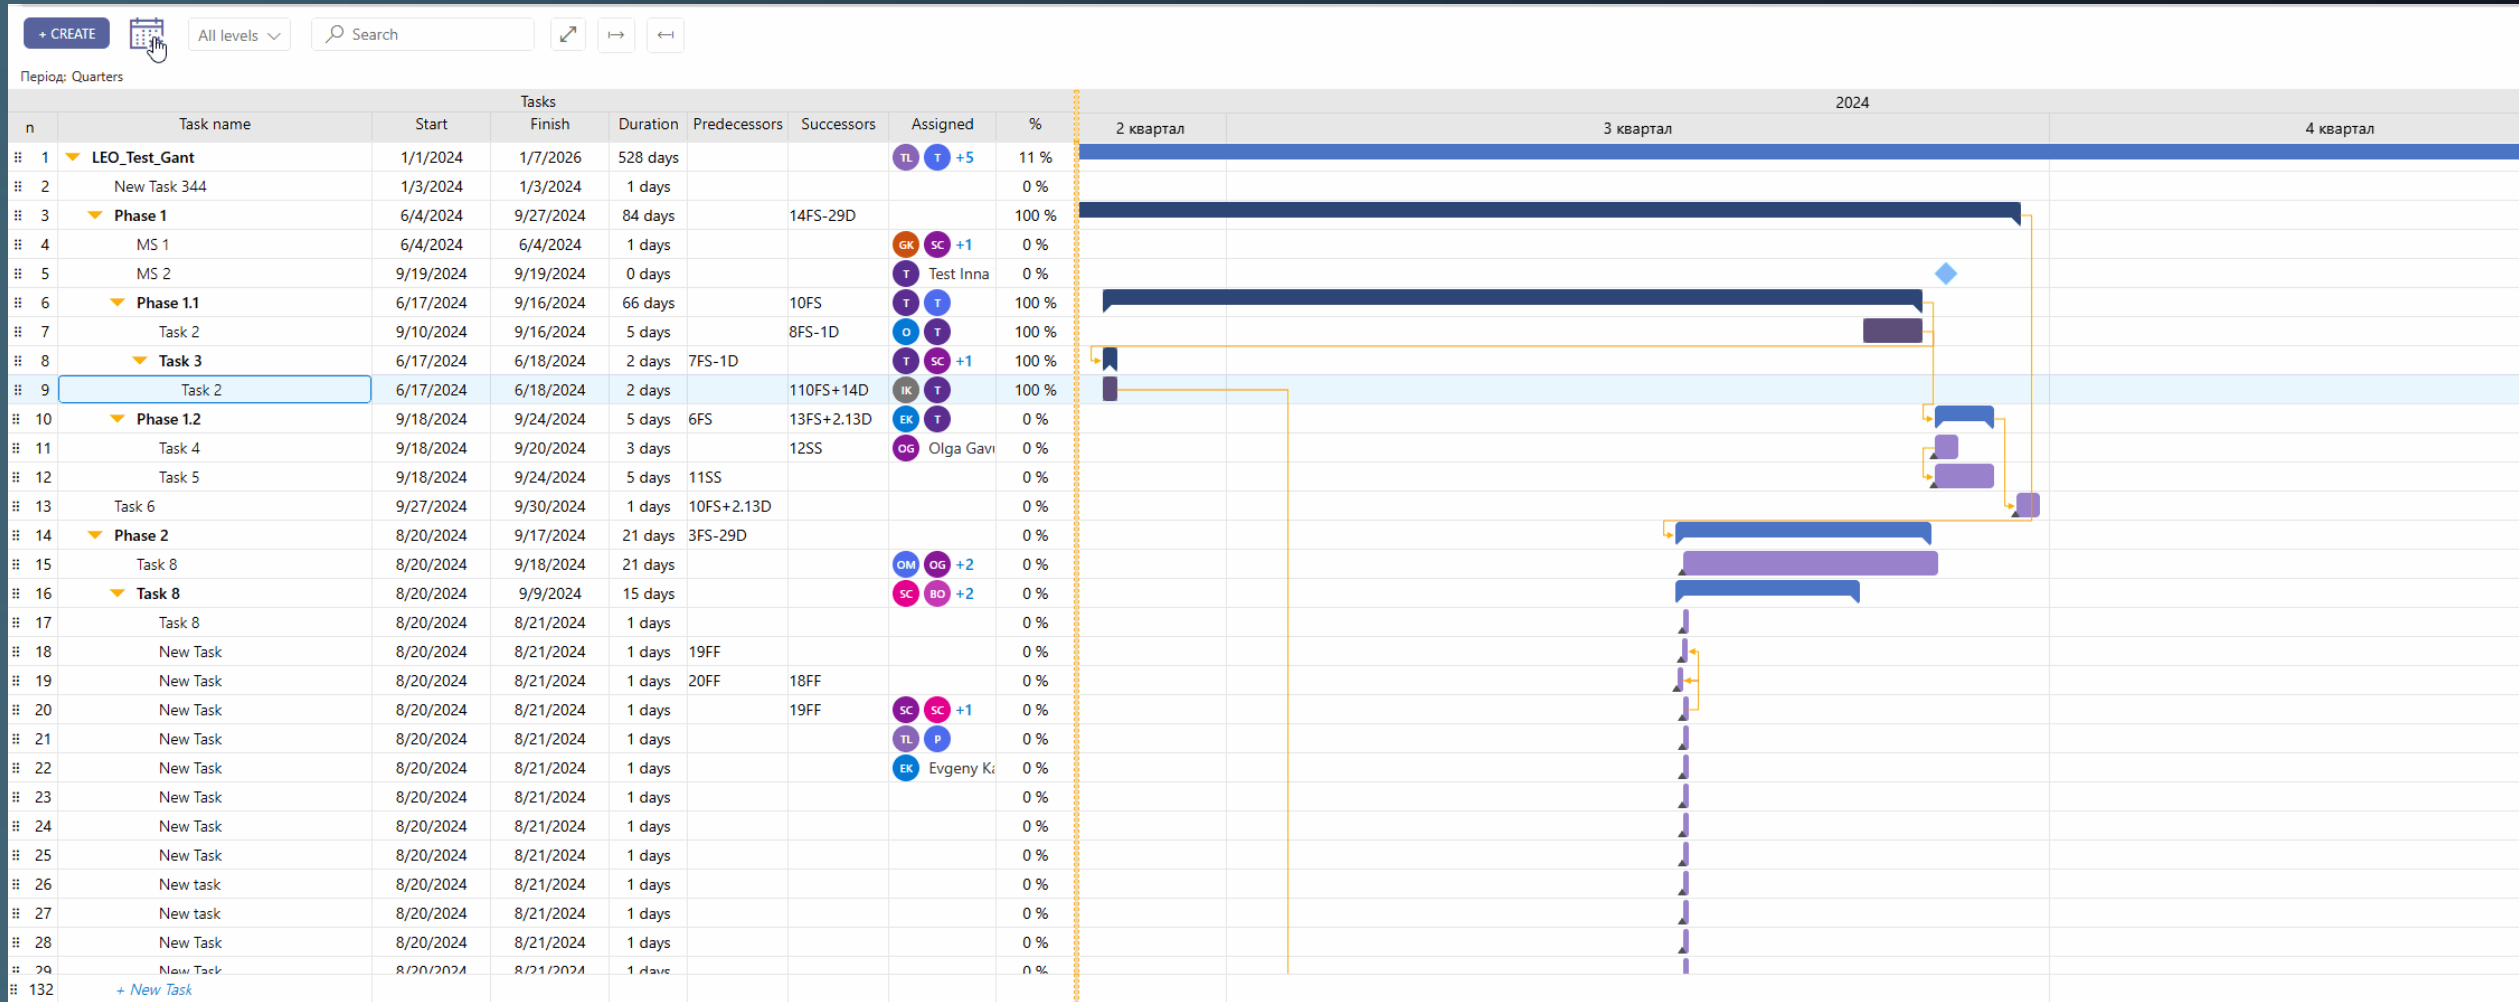


Days, Week, Month, Quarter and automatically scroll to the task

Gantt Chart: Resize

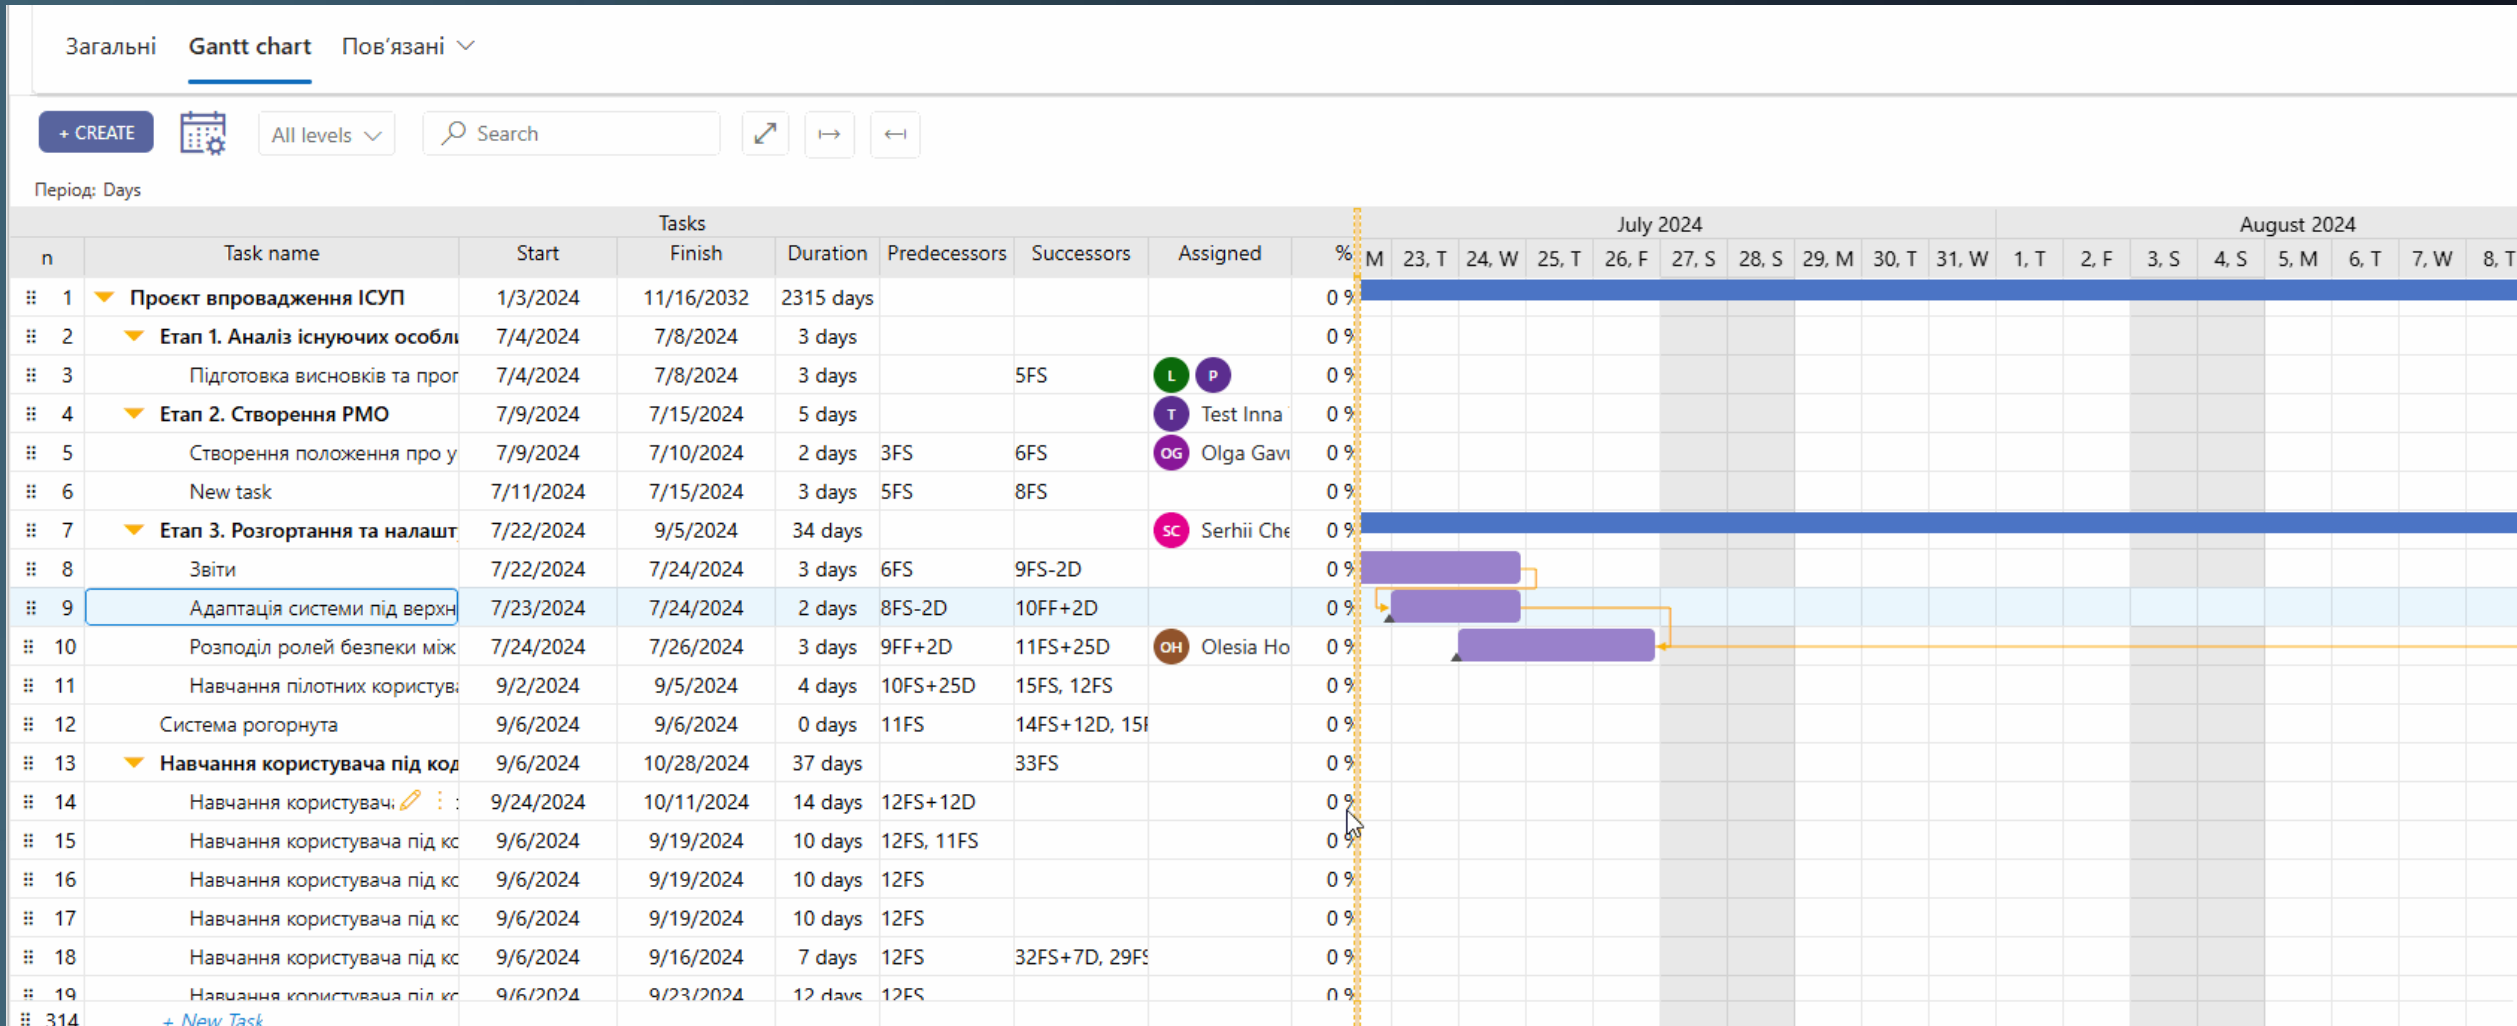


Resize grid or chart

Gantt Chart: Side Panel

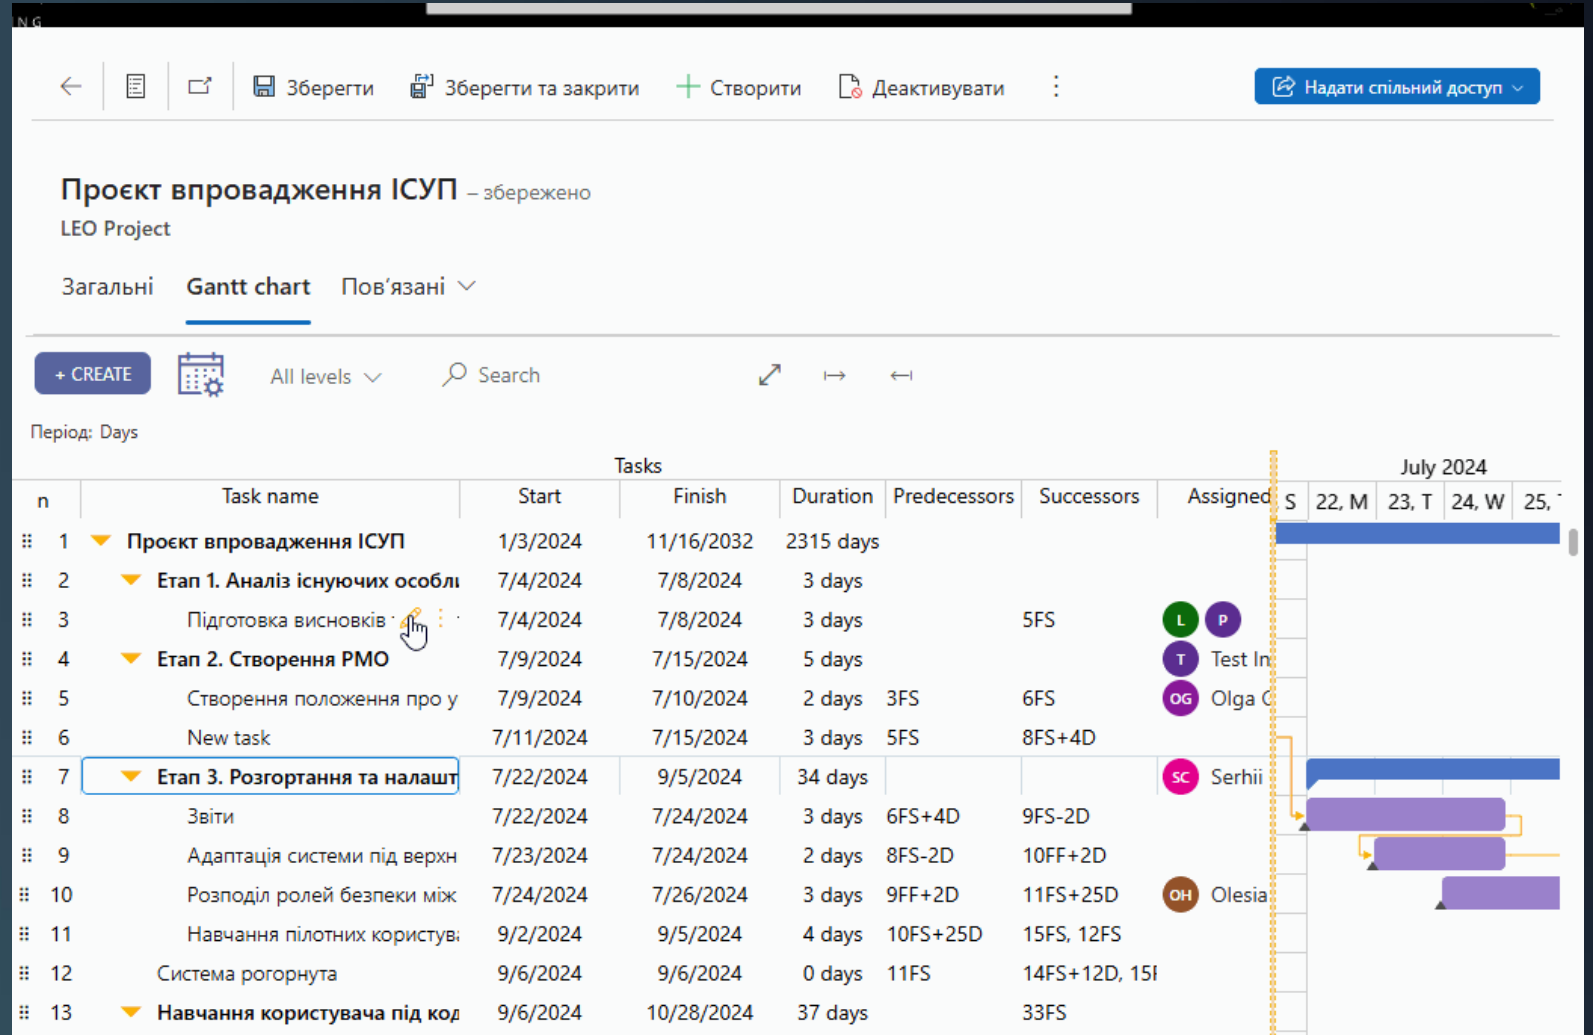

Edit tasks in a different ways

Gantt Chart: Move and resize tasks

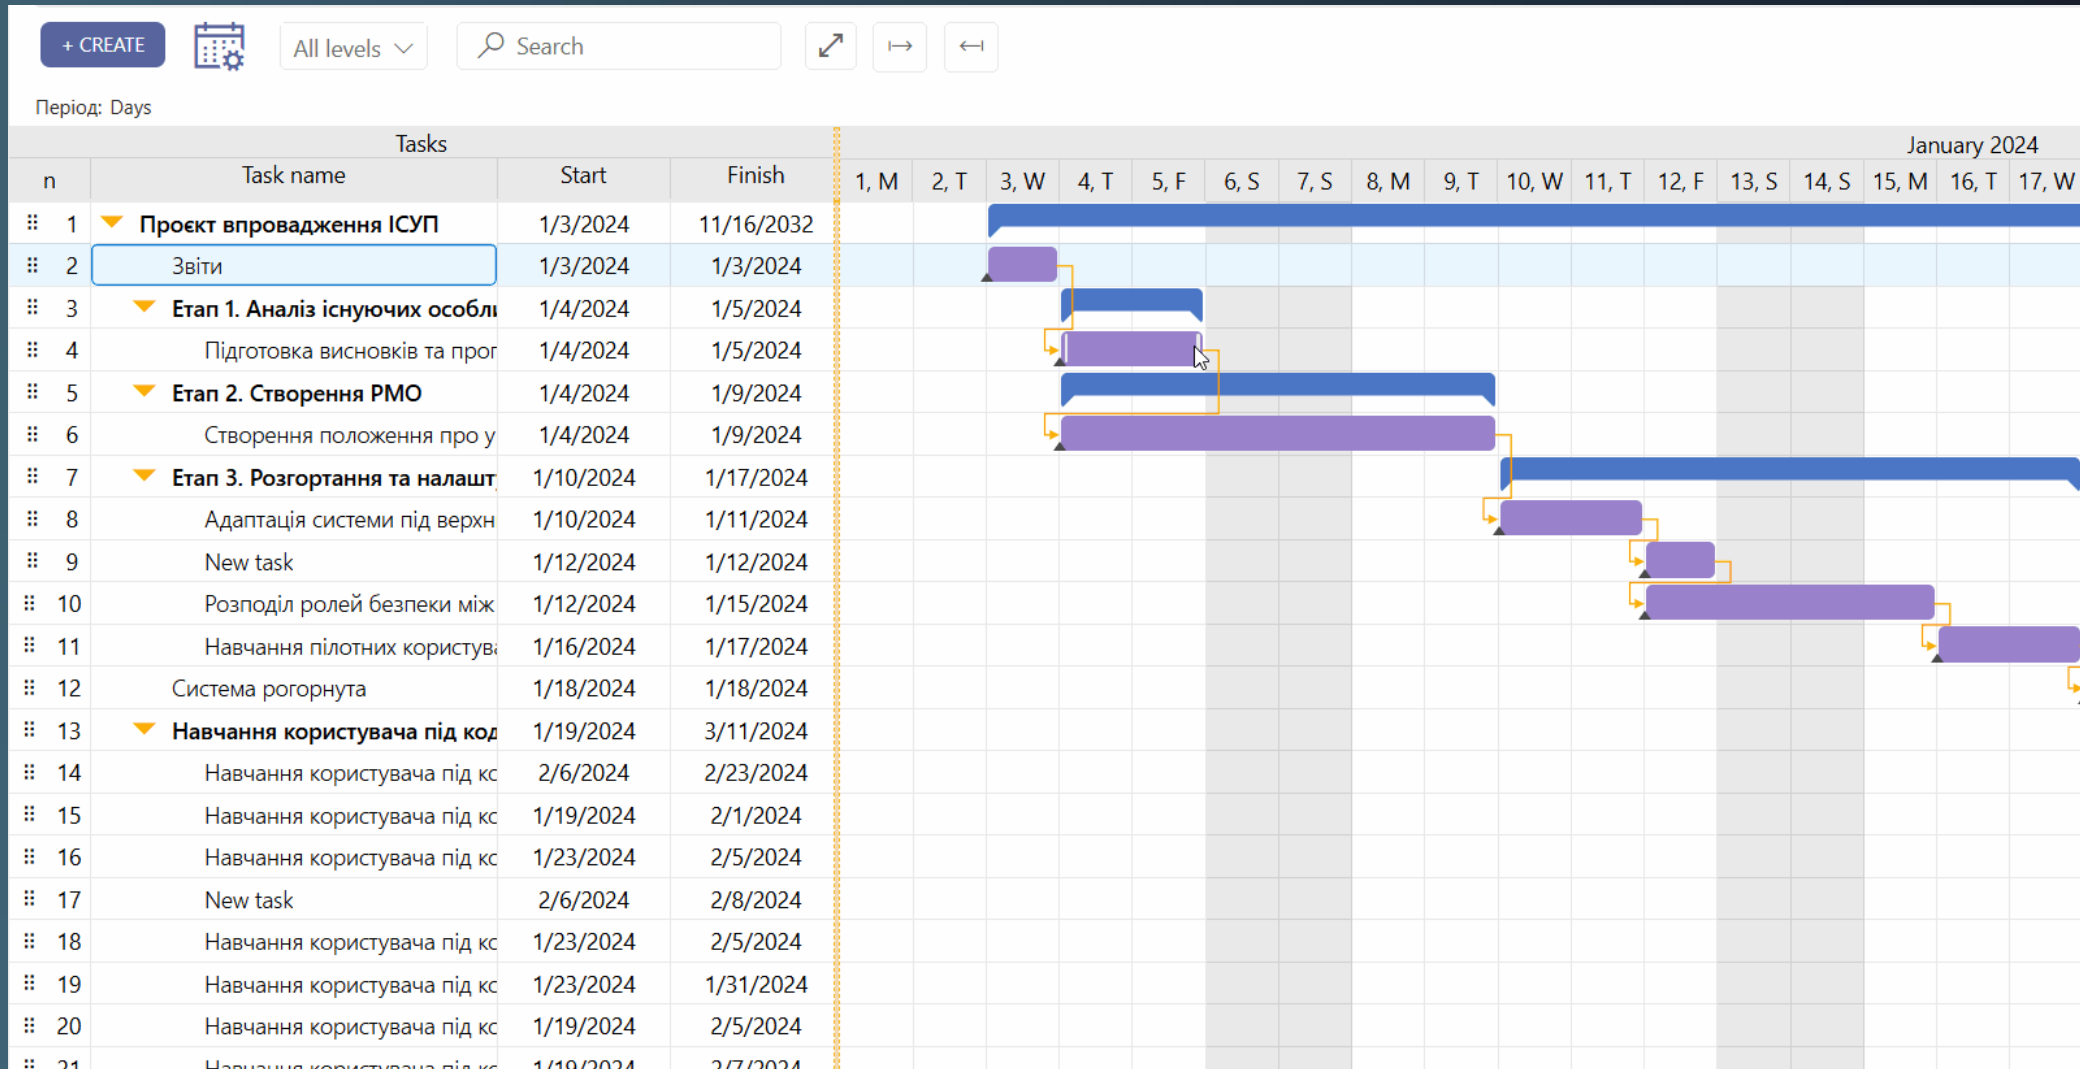

Change tasks start date and duration by moving on UI


Gantt Chart: Reorder tasks

Період: Quarters

n	Task name	Start	Finish	Duration	Predecessors	Successors	Assigned	%	3 квар
1	Проект впровадження ІСУП	1/3/2024	11/16/2032	2315 days				0 %	
2	Етап 1. Аналіз існуючих особливостей бізнесу	7/4/2024	7/8/2024	3 days				0 %	
3	Підготовка висновків та пропозицій	7/4/2024	7/8/2024	3 days		5FS	P SC +2	0 %	
4	Етап 2. Створення РМО	9/6/2024	9/12/2024	5 days			T Test Inna	0 %	
5	Створення положення про управління проектами	9/6/2024	9/9/2024	2 days	3FS	16FS	OG Olga Gavi	0 %	
6	Етап 3. Розгортання та налаштування LEO PPM	9/13/2024	10/30/2024	34 days			SC Serhii Che	0 %	
7	Звіти	9/13/2024	9/17/2024	3 days	16FS	8FS-2D		0 %	
8	Адаптація системи під верхньорівневі вимоги	9/16/2024	9/17/2024	2 days	7FS-2D	9FF+2D		0 %	
9	Розподіл ролей безпеки між користувачами	9/17/2024	9/19/2024	3 days	8FF+2D	10FS+25D	OH Olesia Ho	0 %	
10	Навчання пілотних користувачів роботи з пілотом	10/25/2024	10/30/2024	4 days	9FS+25D	14FS, 11FS		0 %	
11	Система рогорнута	10/31/2024	10/31/2024	0 days	10FS	13FS+12D, 14F		0 %	
12	Навчання користувача під кодом 19	10/31/2024	12/20/2024	37 days		33FS		0 %	
13	Навчання користувача під кодом 20	11/18/2024	12/5/2024	14 days	11FS+12D			0 %	
14	Навчання користувача під кодом 21	10/31/2024	11/13/2024	10 days	11FS, 10FS			0 %	
15	Навчання користувача під кодом 22	10/31/2024	11/13/2024	10 days	11FS			0 %	
16	New task	9/10/2024	9/12/2024	3 days	5FS	7FS		0 %	
17	Навчання користувача під кодом 23	10/31/2024	11/13/2024	10 days	11FS			0 %	
18	Навчання користувача під кодом 24	10/31/2024	11/8/2024	7 days	11FS	32FS+7D, 29FS		0 %	
19	Навчання користувача під кодом 25	10/31/2024	11/15/2024	12 days	11FS			0 %	
20	Навчання користувача під кодом 26	10/31/2024	11/19/2024	14 days	11FS	21FS, 22FS, 23F		0 %	
21	Навчання користувача під кодом 27	11/20/2024	12/5/2024	12 days	20FS	33FS		0 %	
22	Навчання користувача під кодом 28	11/20/2024	12/5/2024	12 days	20FS	33FS		0 %	
23	Навчання користувача під кодом 29	11/20/2024	12/5/2024	12 days	20FS	33FS		0 %	

Reorder task or group of tasks in grid

Gantt Chart: Quick menu

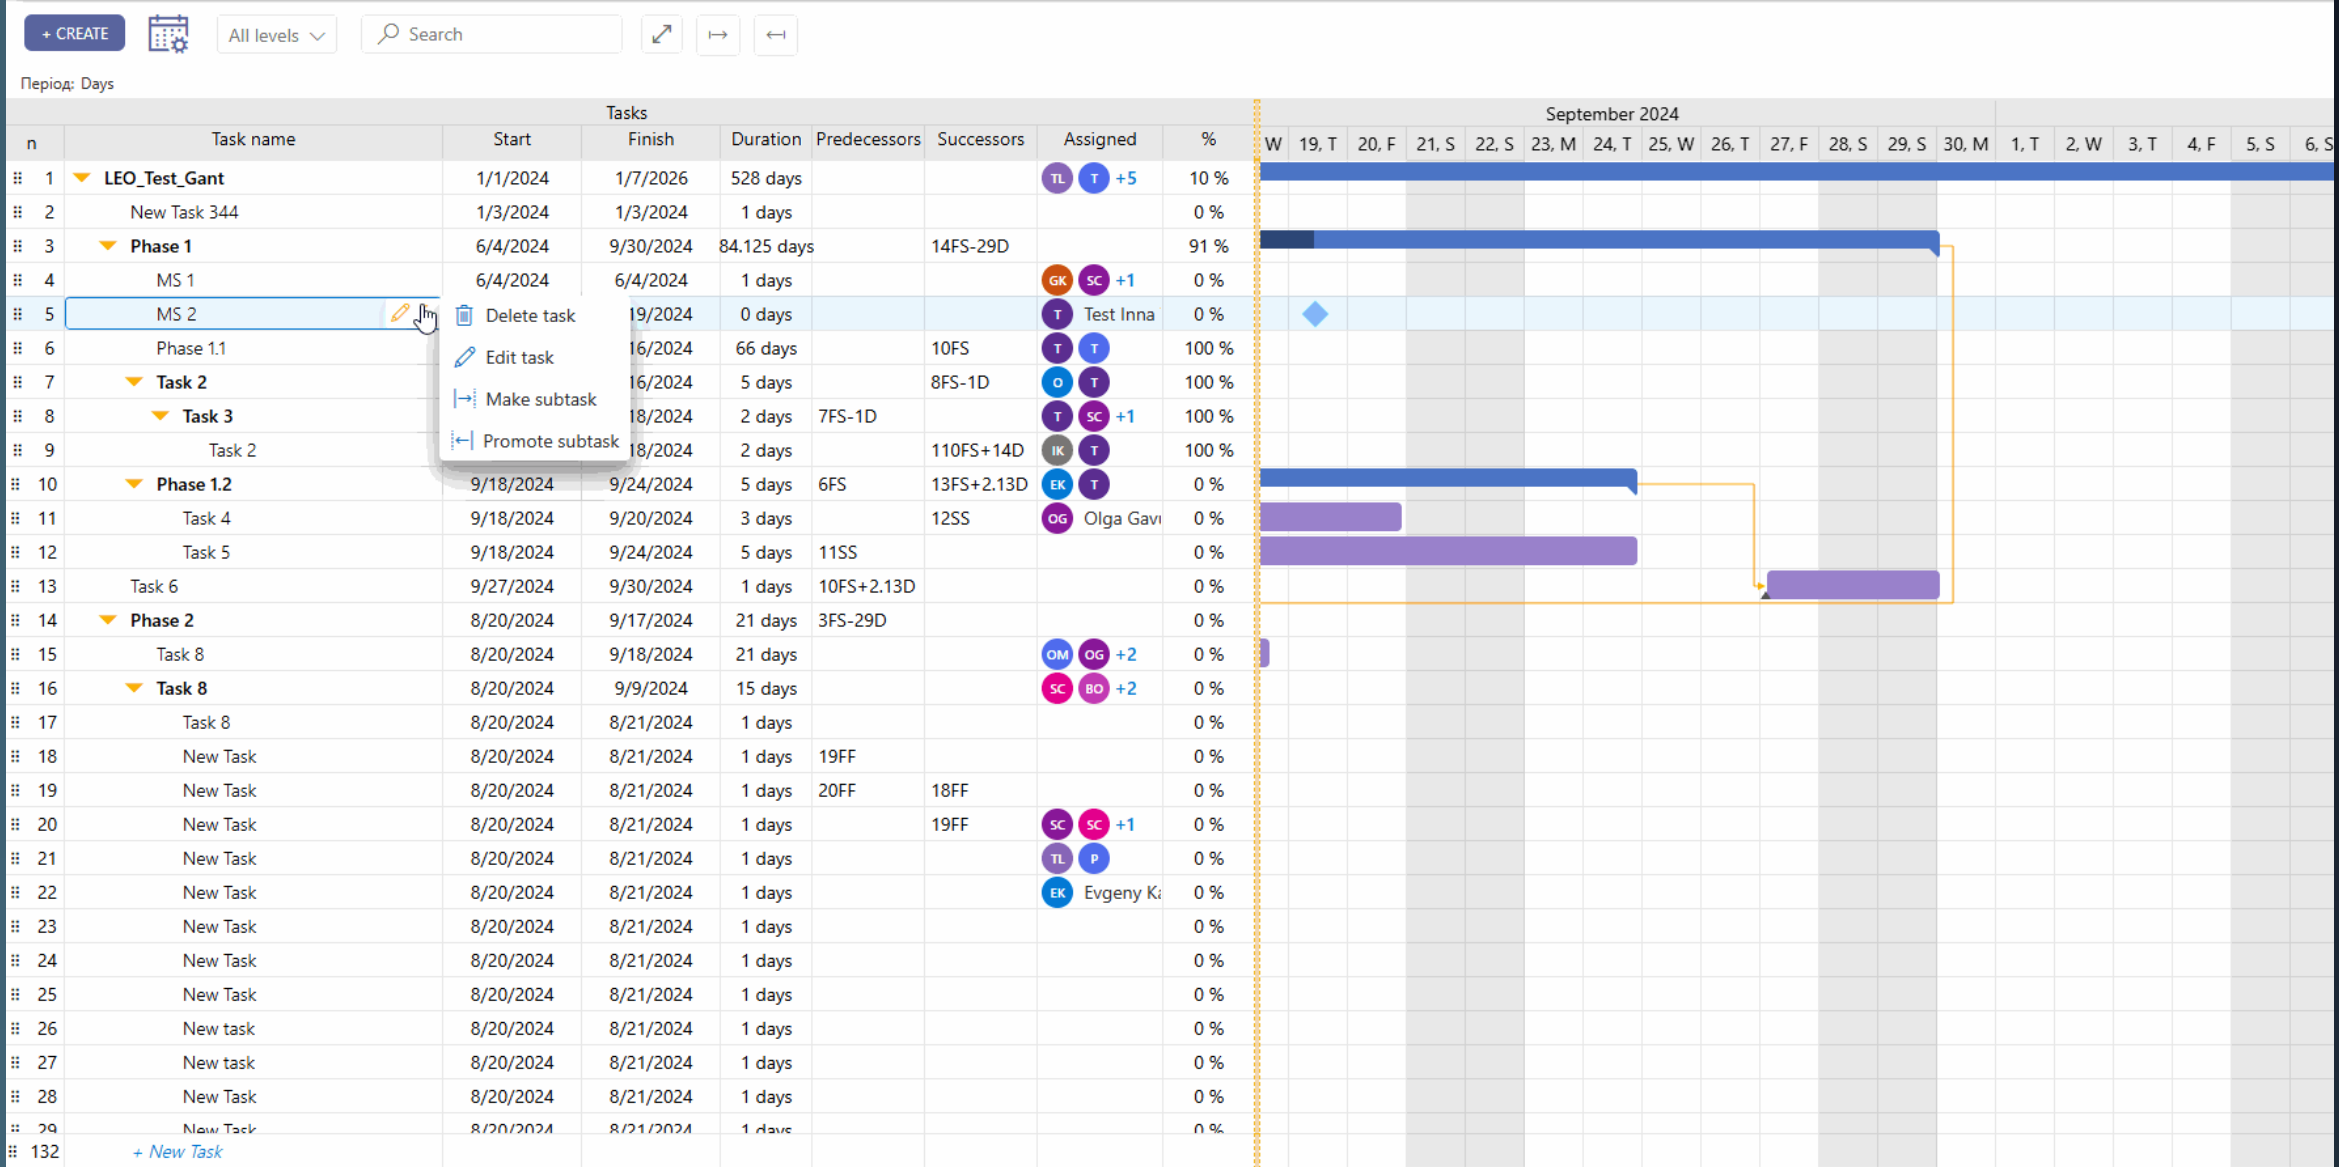


Gantt Chart: Tasks Outline Level

Період: Days

n	Task name	Start	Finish	Duration	Predecessors	Successors	Assigned
1	LEO_Test_Gant	1/1/2024	1/7/2026	528 days			TL T +
2	New Task 344	1/3/2024	1/3/2024	1 days			
3	Phase 1	6/17/2024	9/30/2024	75.125 days		15FS-29D	
4	MS 1	9/19/2024	9/19/2024	0 days			GK SC +
5	MS 2	9/19/2024	9/19/2024	0 days			T Test I
6	Phase 1.1	6/17/2024	9/16/2024	66 days		11FS	T T
7	Task 2	6/17/2024	6/18/2024	2 days		8FS-1D	O T
8	Task 3	6/17/2024	6/18/2024	2 days	7FS-1D		T SC +
9	New task	6/18/2024	6/18/2024	1 days			
10	Task 2	6/17/2024	6/18/2024	2 days		111FS+14D	IK T
11	Phase 1.2	9/18/2024	9/24/2024	5 days	6FS	14FS+2.13D	EK T
12	Task 4	9/18/2024	9/20/2024	3 days		13SS	OG Olga
13	Task 5	9/18/2024	9/24/2024	5 days	12SS		
14	Task 6	9/27/2024	9/30/2024	1 days	11FS+2.13D		
15	Phase 2	8/20/2024	9/18/2024	21 days	3FS-29D		
16	Task 8	8/20/2024	9/18/2024	21 days			OM OG +
17	Task 9	8/20/2024	9/18/2024	15 days			


Collapse tasks depending on Level in WBS

Gantt Chart: Auto Go to Task

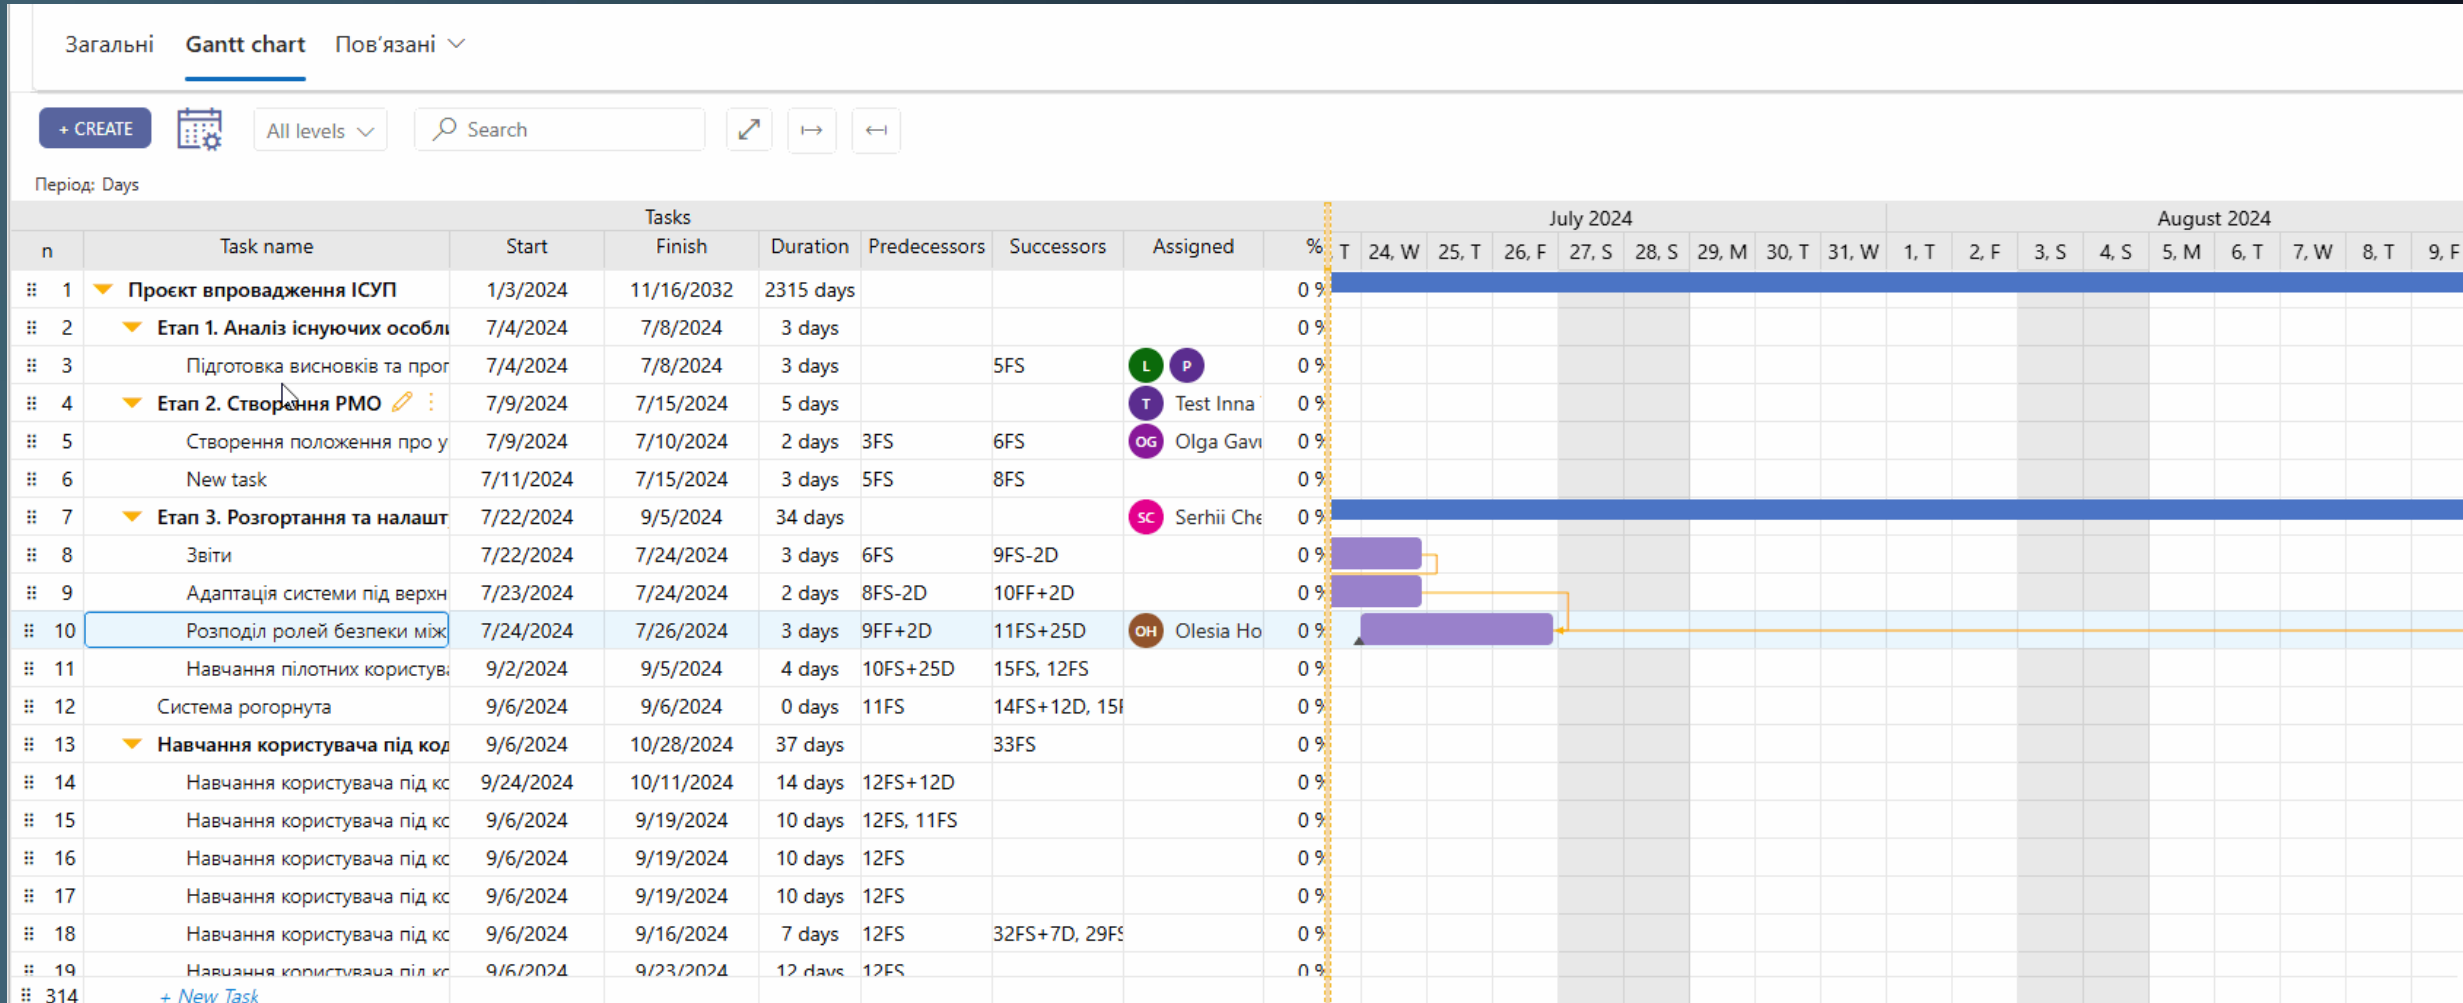

Automatically chart shows selected task

Gantt Chart: Show Just Grid

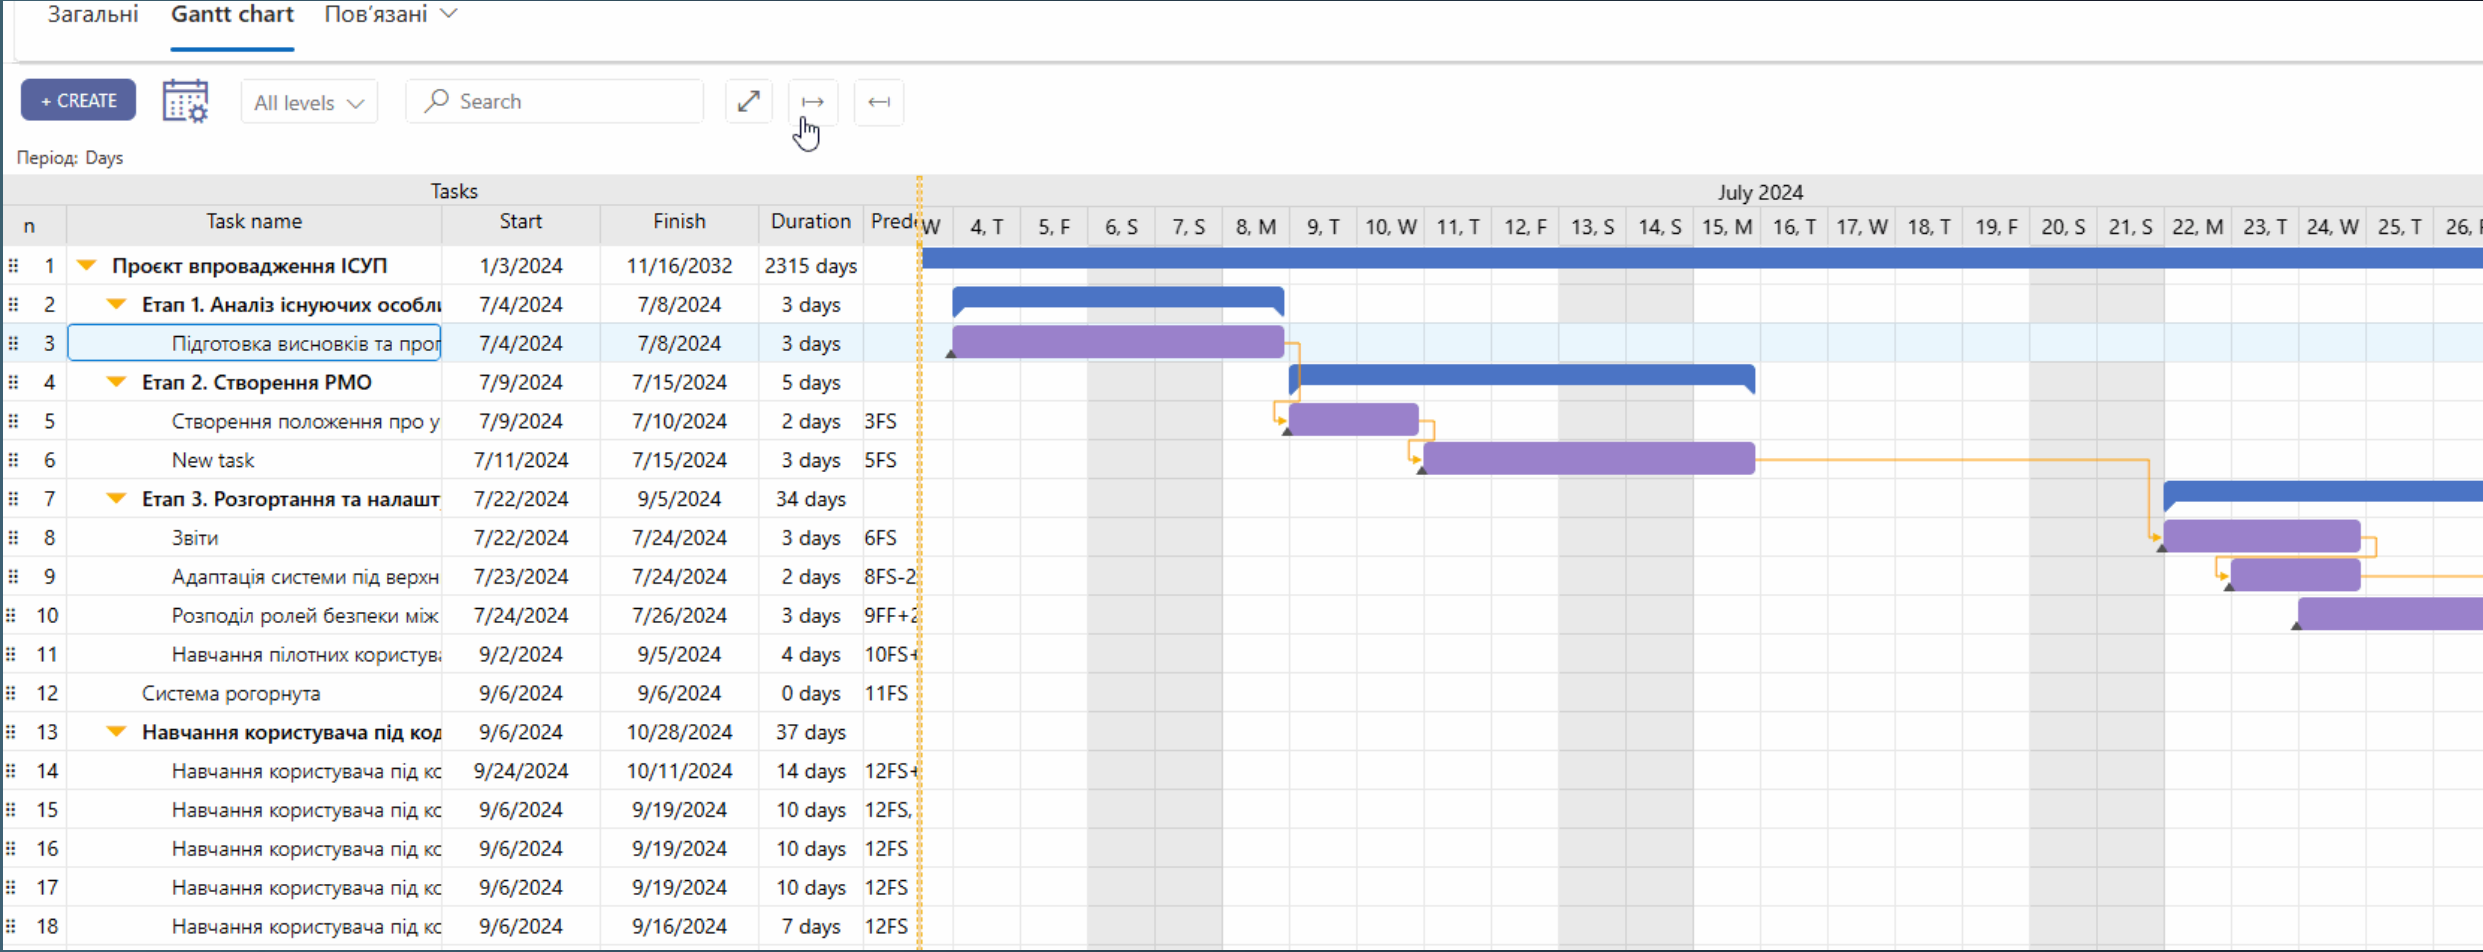





Quickly change schedule just for grid mode







Gantt Chart: Human Error messages

Проект впровадження ІСУП – збережено
LEO Project

Загальні **Gantt chart** Пов'язані ▾





+ CREATE  All levels ▾   

Період: Days






Tasks									
n	Task name	Start	Finish	Duration	Predecessors	Successors	Assigned	%	S
1	▶ Проект впровадження ІСУП	1/3/2024	11/16/2032	2315 days				0 %	
2	Звіти 	9/9/2024	9/11/2024	3 days				0 %	
3	▶ Етап 1. Аналіз існуючих особливостей бізнесу	7/4/2024	7/8/2024	3 days				0 %	
4	Підготовка висновків та пропозицій	7/4/2024	7/8/2024	3 days		6FS+44D	  +2	0 %	
5	▶ Етап 2. Створення РМО	9/9/2024	9/9/2024	1 days			 Test Inna	0 %	
6	Створення положення про управління проектами	9/9/2024	9/10/2024	2 days	4FS+44D	17FS-1D	 Olga Gavr	0 %	
7	▶ Етап 3. Розгортання та налаштування LEO PPM	9/10/2024	10/23/2024	32 days			 Serhii Che	0 %	
8	Адаптація системи під верхньорівневі вимоги та робота	9/16/2024	9/17/2024	2 days		10FF-3D		0 %	

Error message when you try to create wrong relationship

Gantt Chart: 4 Dependency Types

+ CREATE  All levels   

Період: Quarters

n	Task name	Start	Finish	Duration	Predecessors	Successors	Assigned	%	3 квар
1	Проект впровадження ІСУП	1/3/2024	11/16/2032	2315 days				0%	
2	Етап 1. Аналіз існуючих особливостей бізнесу	7/4/2024	7/8/2024	3 days				0%	
3	Підготовка висновків та пропозицій	7/4/2024	7/8/2024	3 days		5FS	 +2	0%	
4	Етап 2. Створення РМО	9/6/2024	9/12/2024	5 days			 Test Inna	0%	
5	Створення положення про управління проектом	9/6/2024	9/9/2024	2 days	3FS	6FS	 Olga Gav	0%	
6	New task	9/10/2024	9/12/2024	3 days	5FS	8FS		0%	
7	Етап 3. Розгортання та налаштування LEO PPM	9/13/2024	10/30/2024	34 days			 Serhii Che	0%	
8	Звіти	09/13/2024	09/17/2024	3	6FS	9FS-2D		0	
9	Адаптація системи під верхньорівневі вимоги	9/16/2024				10FF+2D		0%	
10	Розподіл ролей безпеки між користувачами	9/17/2024				11FS+25D	 Olesia Ho	0%	
11	Навчання пілотних користувачів роботі з пілот	10/25/2024				15FS, 12FS		0%	
12	Система рогорнута	10/31/2024				14FS+12D, 15FS		0%	
13	Навчання користувача під кодом 19	10/31/2024				33FS		0%	
14	Навчання користувача під кодом 20	11/18/2024						0%	
15	Навчання користувача під кодом 21	10/31/2024						0%	
16	Навчання користувача під кодом 22	10/31/2024	11/13/2024	10 days	12FS			0%	
17	Навчання користувача під кодом 23	10/31/2024	11/13/2024	10 days	12FS			0%	
18	Навчання користувача під кодом 24	10/31/2024	11/8/2024	7 days	12FS	32FS+7D, 29FS		0%	
19	Навчання користувача під кодом 25	10/31/2024	11/15/2024	12 days	12FS			0%	
20	Навчання користувача під кодом 26	10/31/2024	11/19/2024	14 days	12FS	21FS, 22FS, 23FS		0%	
21	Навчання користувача під кодом 27	11/20/2024	12/5/2024	12 days	20FS	33FS		0%	
22	Навчання користувача під кодом 28	11/20/2024	12/5/2024	12 days	20FS	33FS		0%	
23	Навчання користувача під кодом 29	11/20/2024	12/5/2024	12 days	20FS	33FS		0%	

Existing Dependencies

- Training of the first group


Search task...

Name: Dependency:

- Training of the second group

Finish-Start, Start-Start, Finish-Finish, Start-Finish

Gantt Chart: Insert Task

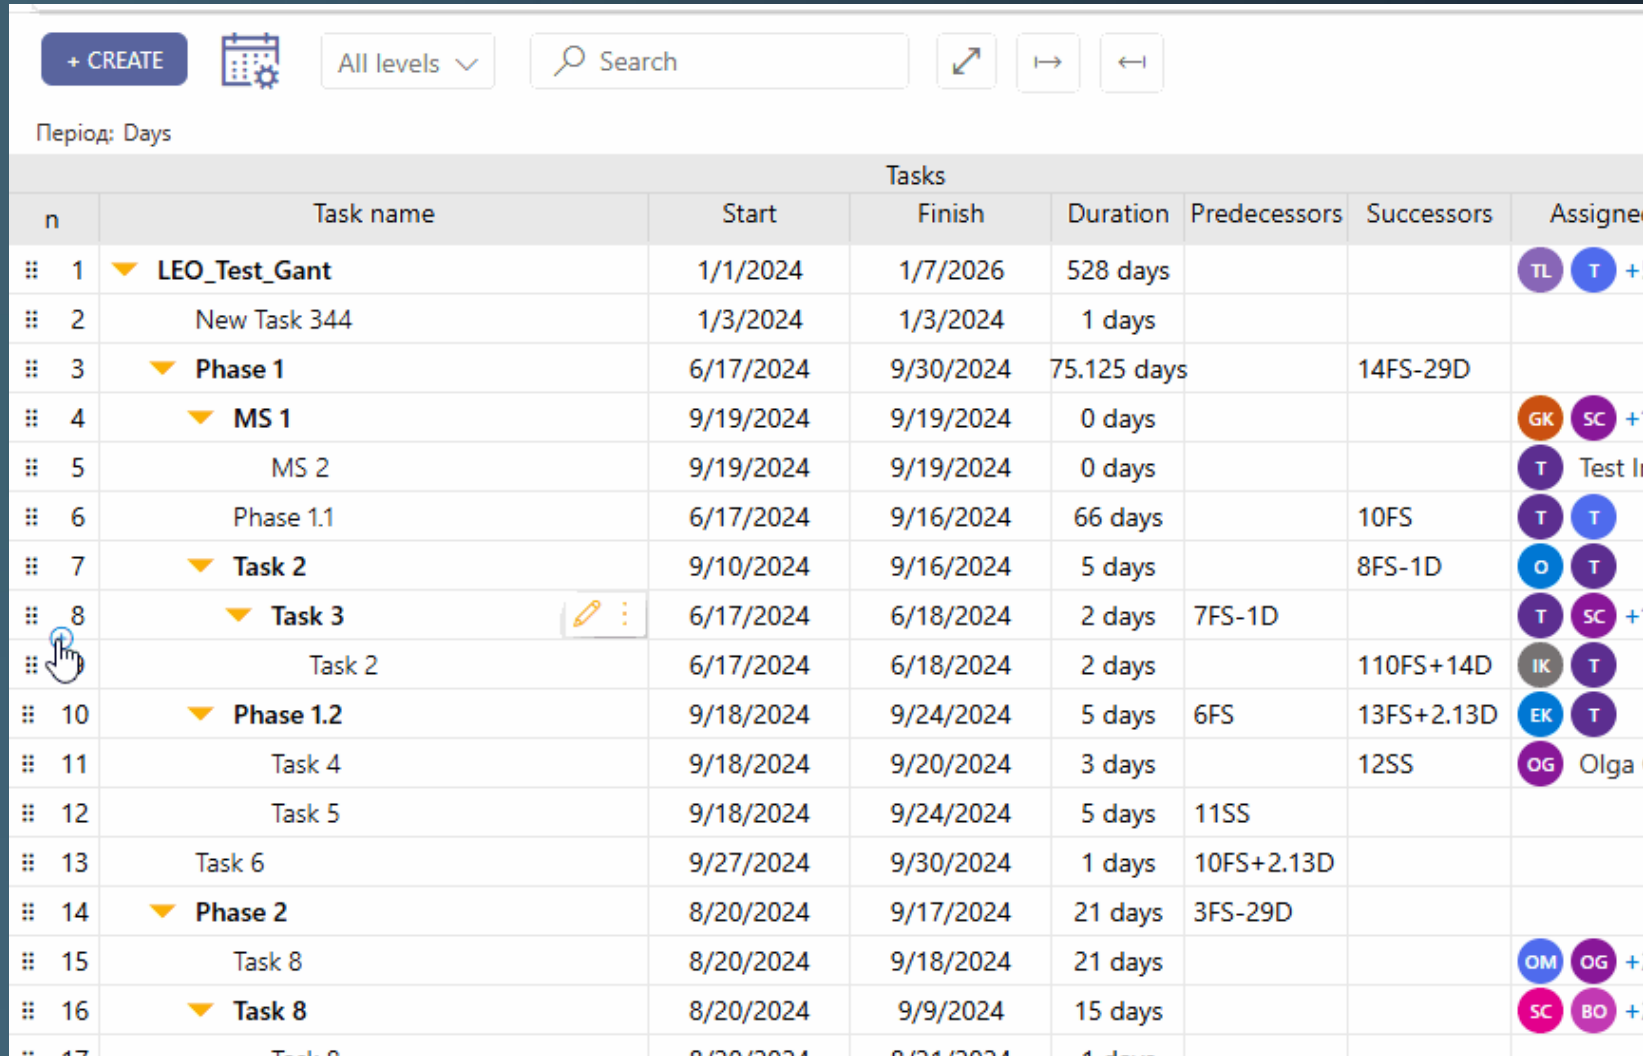


The screenshot shows a Gantt chart software interface with a task list table. The table has columns for task ID, name, start, finish, duration, predecessors, successors, and assignees. A hand cursor is pointing to the 'Task 2' row, which is being inserted between 'Task 3' and 'Phase 1.2'.

n	Task name	Start	Finish	Duration	Predecessors	Successors	Assigned
1	LEO_Test_Gant	1/1/2024	1/7/2026	528 days			TL, T
2	New Task 344	1/3/2024	1/3/2024	1 days			
3	Phase 1	6/17/2024	9/30/2024	75.125 days		14FS-29D	
4	MS 1	9/19/2024	9/19/2024	0 days			GK, SC
5	MS 2	9/19/2024	9/19/2024	0 days			T, Test I
6	Phase 1.1	6/17/2024	9/16/2024	66 days		10FS	T, T
7	Task 2	9/10/2024	9/16/2024	5 days		8FS-1D	O, T
8	Task 3	6/17/2024	6/18/2024	2 days	7FS-1D		T, SC
9	Task 2	6/17/2024	6/18/2024	2 days		110FS+14D	IK, T
10	Phase 1.2	9/18/2024	9/24/2024	5 days	6FS	13FS+2.13D	EK, T
11	Task 4	9/18/2024	9/20/2024	3 days		12SS	OG, Olga
12	Task 5	9/18/2024	9/24/2024	5 days	11SS		
13	Task 6	9/27/2024	9/30/2024	1 days	10FS+2.13D		
14	Phase 2	8/20/2024	9/17/2024	21 days	3FS-29D		
15	Task 8	8/20/2024	9/18/2024	21 days			OM, OG
16	Task 8	8/20/2024	9/9/2024	15 days			SC, BO
17	Task 9	8/20/2024	8/21/2024	1 days			


Inset task wherever you want

Gantt Chart: Assignments

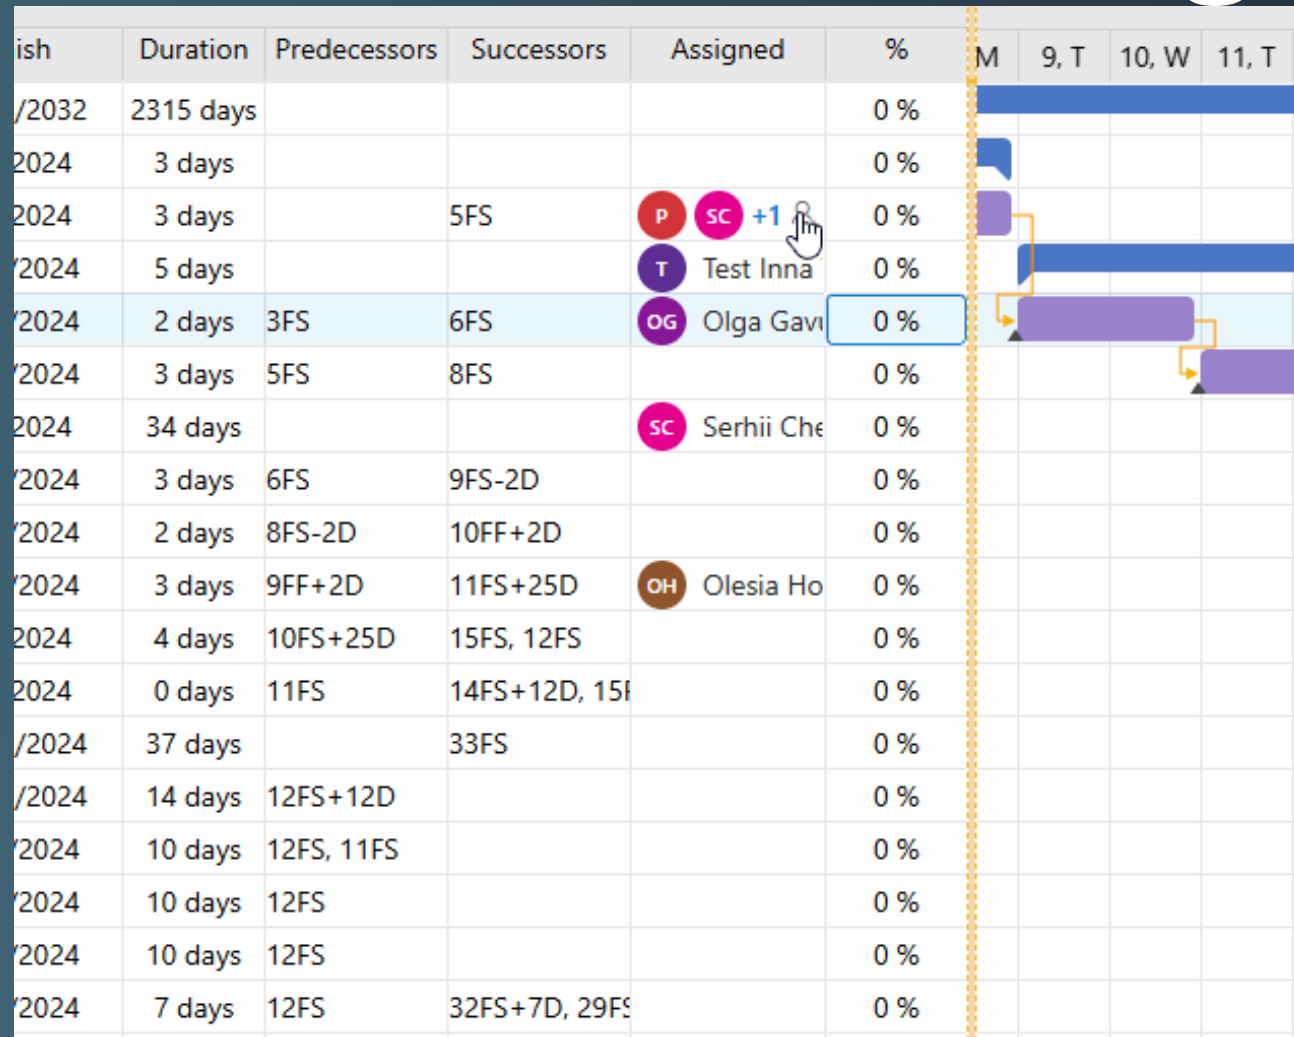

Choose multi-responsible from AAD catalog

Gantt Chart: Build Task Link on UI

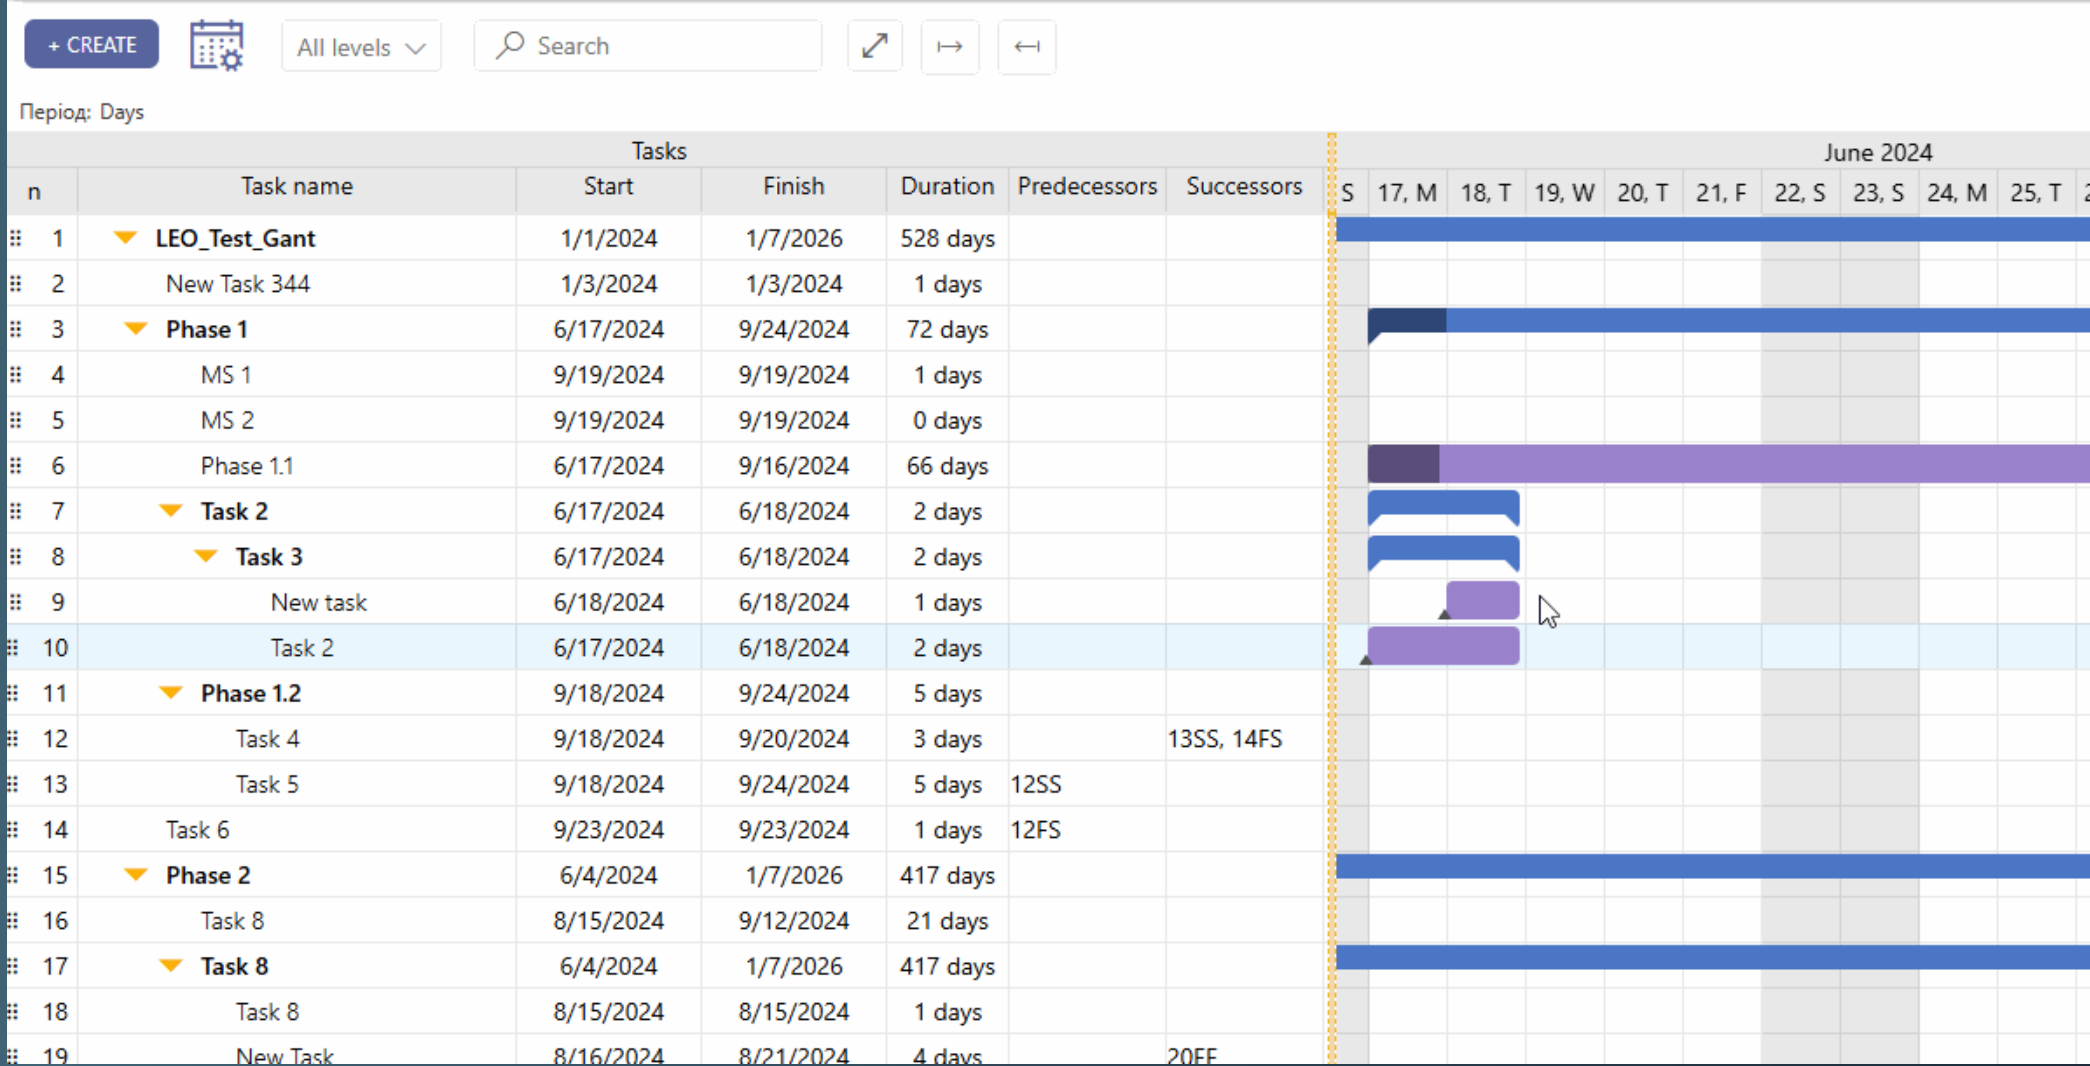

Create task links on Gantt Chart

Future Legends

Areas of Improvement 2025

- OKR
- Gantt Chart
- Roadmap
- Product Management
- Finance
- BI
- Timesheeting
- AI

Gantt Future

Work with Tasks and dependencies on UI
Elapsed days and Hard/Soft Links
10 Project Baselines on Task Level
Custom Columns and Task Types

Print or PDF
Schedule Templates
Kanban board


Resource sheet
Cross project dependencies
Import from Excel | Export to Excel

Import from Microsoft Project
Custom security for schedule



2025

LEO PPM

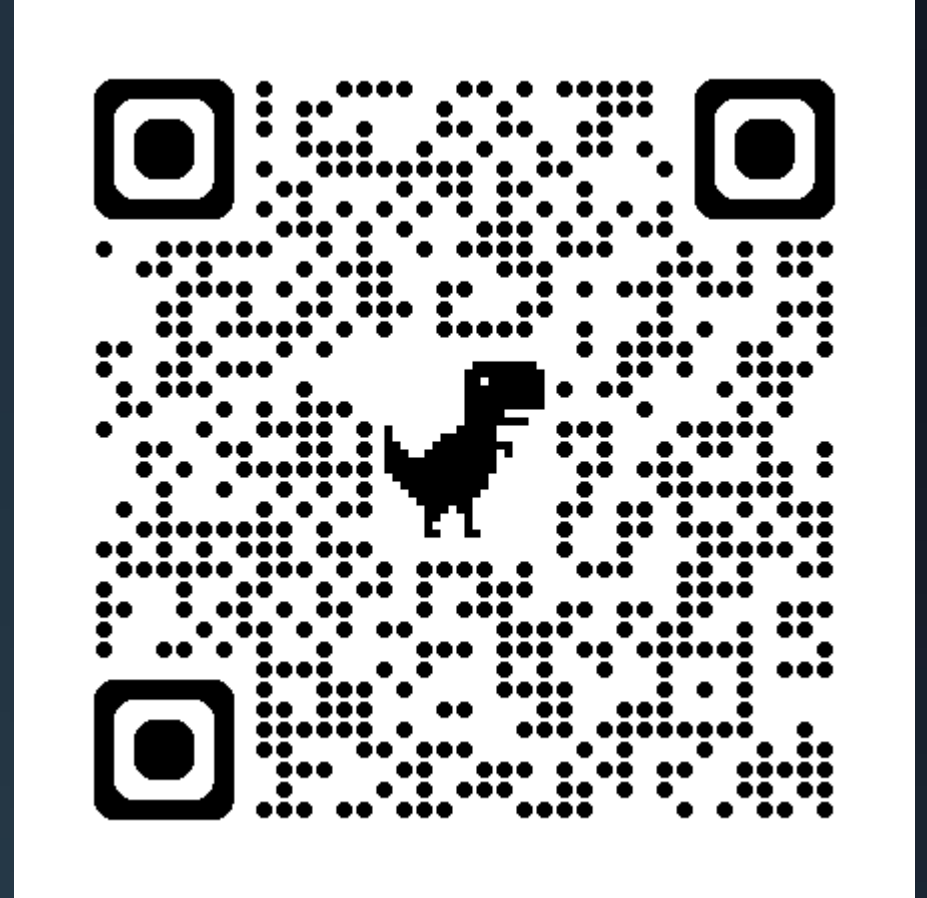





Олексій Просніцький

+ 38 067 4054701

mvp@leoconsulting.com.ua

LEO Consulting
