

# Microsoft закриває Project Online

кому дістанеться крісло  
управління проектами?



- онлайн подія
- 15 вересня о 17:00
- Олексій Просніцький



# LEO CONSULTING



Центр компетенцій в Україні з управління проектами та Microsoft Project

<https://leoconsulting.com.ua>

**14**

Years  
of work

**80**

Implemented  
projects

**40**

Conferences  
and clubs

**310**

Articles

**10**

Books and  
self-readers

**105**

Companies

**7C**  
GROUP

 **PIEA**

 **Q PARTNERS**

 **pro energy**

  
**E-JOB**  
NIKOLAYEV

**ТАВРІЯ В**

**blago**<sup>®</sup>  
developer

  
GAZDA

 **КОВАЛЬСЬКА**

  
**АСТАРТА-КИЇВ**

 **АВРОПА**  
МУЛЬТИМАРКЕТ

  
EUROIZOL


**Avalon**




  
**VELMART**

 **CCG™**  
development

 **CHEST**

 **ProfInstall**  
Проектування • Монтаж • Сервіс

 **SYSTEM**  
CAPITAL  
BUILDING




**Innoware**  
Powering Business



**acino**



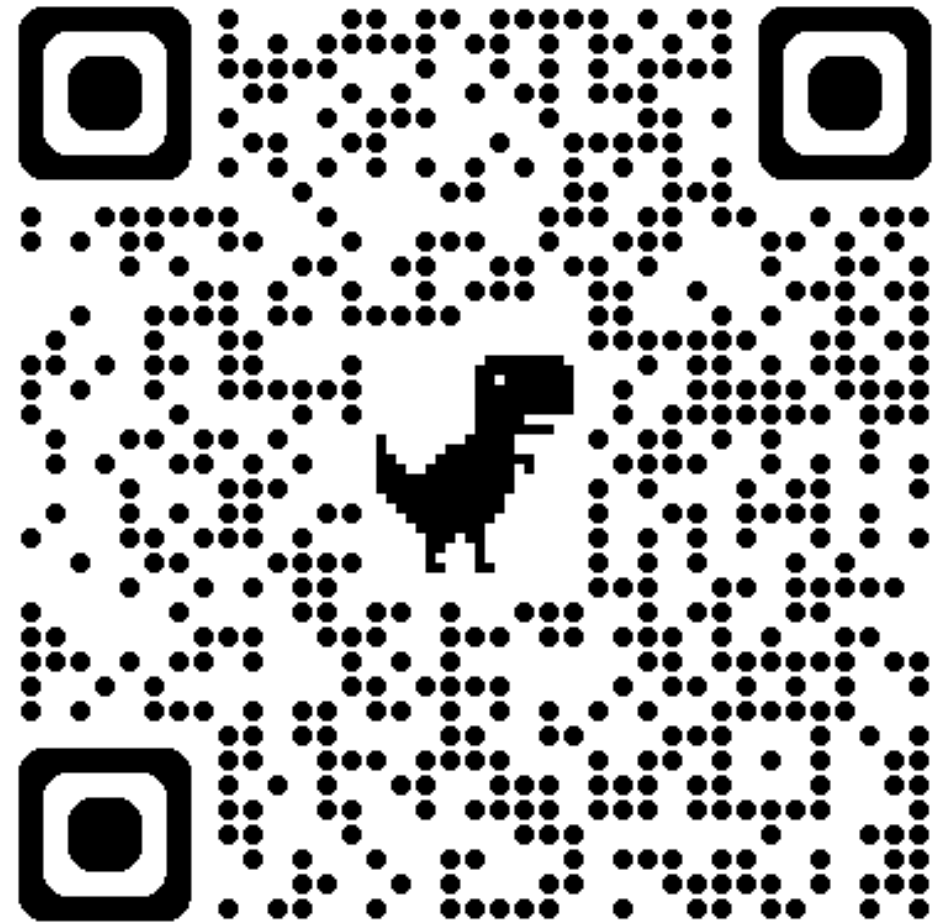

<https://leoconsulting.com.ua/baza-znan/knigi-z-microsoft-project/>

- Самоучитель Microsoft Project 2010
- Самоучитель Microsoft Project Server 2010
- Самоучитель развертывание и IT администрирование Microsoft Project Server 2010
- Самоучитель Microsoft Project 2013
- Самоучитель развертывание и IT администрирование Microsoft Project Server 2013
- Самоучитель Microsoft Project 2016
- Самоучитель развертывание и IT администрирование Microsoft Project Server 2016
- Самоучитель развертывание и IT администрирование Microsoft Project Server 2019





PLANNER BLOG 5 MIN READ

## Microsoft Project Online is retiring: What you need to know



**George Bullock**  MICROSOFT

Sep 05, 2025

After more than a decade of supporting project managers and teams around the world, **Project Online** will officially retire on **September 30, 2026**. We know this is a significant change, and we want to acknowledge the impact it may have on your organization, your workflows, and your planning processes.

This update is **exclusive to Project Online and does not affect Project desktop, Project Server, or Planner** (which brings together Project for the web, Planner in Microsoft 365, and To Do).



# Project Online Lifecycle

2012

Announced

2016-2021

Golden Age

2026


Closed

2013

Released

2018

Unofficial Stop

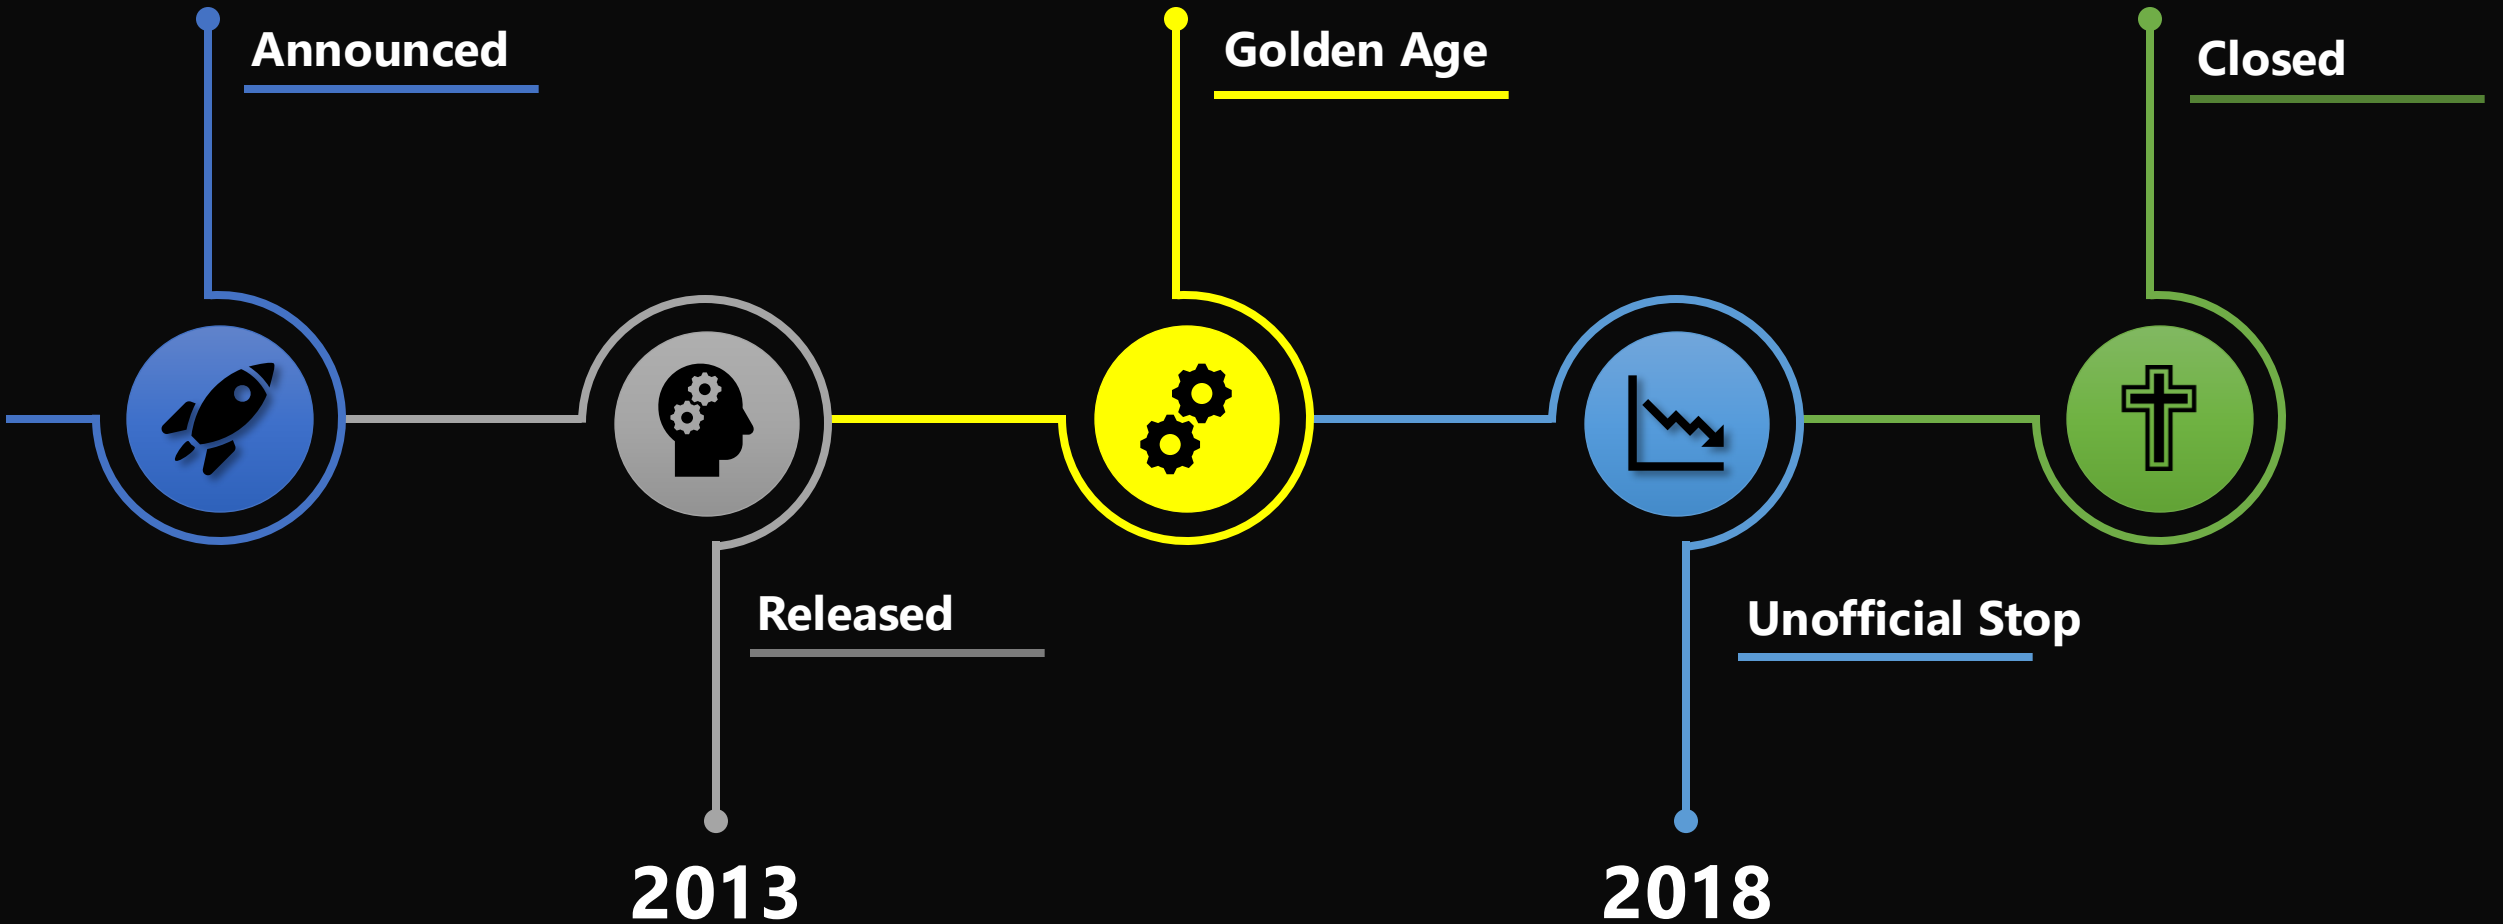



WHY GOD  
**WHY?**  
WE HAD A DEAL  
LET THE OTHERS GROW OLD  
NOT ME!

---

Project Online = Project Server

---

Застарілий UX / UI

---

Зменшення кількості користувачів

---

Внутрішній канібалізм в Microsoft

---

Нішевість

---

Обмеженість використання

---

Неможливість вбудувати AI / Copilot

---

A close-up photograph of a baby crying, with a blue background. The baby's face is the central focus, showing a wide-open mouth and furrowed brows. The lighting is soft, highlighting the texture of the baby's skin and hair. The background is a solid, deep blue color.

**Pain is not so  
close to pleasure**

*Not Queen*

ОГЛЯД



ПОДІЛИТИСЯ ПІДПИСАТИСЯ

# 17 Головна сторінка

Пошук у цей сайт

- Проекти
- Затвердження
- Завдання
- Табель
- Ресурси
- РЕДАГУВАТИ ПОСИЛАННЯ

## Проекти та домашні завдання



UP\_LEO [Read-Only] - Project Professional

File Task Resource Report Project View Developer Help PRO PM Ex-Change Gantt Chart Format Tell me what you want to do

№	I	%		WBS	Завдання	Баз. Тр-сть		Баз. Початок		Баз. Заверш.		Qtr 1, 2025	Qtr 2, 2025	Qtr 3, 2025	
		План	Факт			Δ %	Тр-сть	Тр-сть	<i	Початок	<i				Заверш.
0		66%	42%	0	UP_LEO	120,5 day	120,5 day	Ved 01.01.25	Ved 01.01.25	Fri 20.06.25	Fri 20.06.25				42%
1	✓	100%	100%	1	Проект розпочато	0 days	0 days	Ned 01.01.25	Ned 01.01.25	Ned 01.01.25	Ned 01.01.25				100%
2	✓	100%	100%	2	Розробка концепції	27,5 days	24,5 days	Thu 02.01.25	Mon 06.01.25	Mon 10.02.25	Fri 07.02.25				100%
11	✓	100%	99%	3	Контракція	88,38 days	96,5 days	Mon 03.02.25	Mon 03.02.25	Fri 06.06.25	Ned 18.06.25				99%
17	✓	100%	100%	4	Проектування	15 days	17 days	Thu 20.02.25	Fri 21.02.25	Thu 13.03.25	Mon 17.03.25				100%
21	✓	62%	30%	5	БМР	79,88 days	78 days	Thu 06.03.25	Mon 10.03.25	Fri 13.06.25	Fri 13.06.25				30%
22	✓	100%	100%	5.1	Котлован	3 days	3,5 days	Thu 06.03.25	Sat 10.03.25	Tue 11.03.25	Thu 13.03.25				100%
26	✓	100%	100%	5.2	Фундамент	16,5 days	14,5 days	Tue 11.03.25	Fri 14.03.25	Mon 31.03.25	Mon 31.03.25				100%
27	✓	100%	100%	5.2.1	Влаштування опалубки	2 days	2 days	Tue 11.03.25	Fri 14.03.25	Thu 13.03.25	Sat 15.03.25				100%
28	✓	100%	100%	5.2.2	Залиття бетону	0,5 days	0,5 days	Thu 13.03.25	Mon 17.03.25	Fri 14.03.25	Mon 17.03.25				100%
29	✓	100%	100%	5.2.3	Висихання бетону	14 days	12 edays	Fri 14.03.25	Mon 17.03.25	Fri 28.03.25	Sat 29.03.25				100%
30	✓	100%	100%	5.2.4	Демонтаж опалубки	2 days	1 day	Fri 28.03.25	Sat 29.03.25	Mon 31.03.25	Mon 31.03.25				100%
31	✓	100%	100%	5.2.5	Фундамент готовий	0 days	0 days	Mon 31.03.25	Sat 29.03.25	Mon 31.03.25	Sat 29.03.25				100%
32	✓	100%	59%	5.3	Каркас	16,5 days	16,5 days	Mon 31.03.25	Sat 29.03.25	Fri 18.04.25	Thu 17.04.25				59%
33	✓	100%	100%	5.3.1	Кладка зовнішніх стін	5 days	5 days	Mon 31.03.25	Sat 29.03.25	Sat 05.04.25	Thu 03.04.25				100%
34	✓	100%	100%	5.3.2	Кладка внутрішніх стін	5 days	5 days	Mon 31.03.25	Sat 29.03.25	Sat 05.04.25	Thu 03.04.25				100%
35	✓	100%	50%	5.3.3	Влаштування перекриття	5,5 days	5,5 days	Sat 05.04.25	Fri 04.04.25	Fri 11.04.25	Thu 10.04.25				50%
36	✓	100%	0%	5.3.4	Влаштування даху	6 days	6 days	Fri 11.04.25	Thu 10.04.25	Fri 18.04.25	Thu 17.04.25				0%
37	✓	100%	0%	5.3.5	Каркас готовий	0 days	0 days	Fri 18.04.25	Thu 17.04.25	Fri 18.04.25	Thu 17.04.25				0%
38	✓	100%	0%	5.4	Мережі	10 days	10 days	Fri 18.04.25	Thu 17.04.25	Ned 30.04.25	Tue 29.04.25				0%
46	✓	1%	0%	5.5	Чорнове оздоблення	14 days	14 days	Ned 30.04.25	Tue 29.04.25	Ned 21.05.25	Tue 20.05.25				0%
52	✓	3%	0%	5.6	Благоустрій	35 days	35 days	Tue 29.04.25	Tue 29.04.25	Fri 13.06.25	Fri 13.06.25				0%
60	✓	21%	0%	6	Постачання	27,5 days	27,5 days	Tue 29.04.25	Tue 29.04.25	Sat 07.06.25	Sat 07.06.25				0%
61	✓	21%	0%	6.1	Постачання дерев	27,5 days	27,5 days	Tue 29.04.25	Tue 29.04.25	Sat 07.06.25	Sat 07.06.25				0%
67	✓	0%	0%	7	Закриття проекту	5 days	5 days	Fri 13.06.25	Fri 13.06.25	Fri 20.06.25	Fri 20.06.25				0%

07 АНАЛІЗ ВІДХИЛЕНЬ

---

Єдина система налаштувань

---

Управління безпекою

---

Єдина база ресурсів

---

Корпоративні дані

---

Звіти в Power BI

---

Наявність Microsoft Project Desktop

A wooden signpost stands in a grassy field with a white picket fence and trees in the background. The signpost has two wooden signs attached to it. The top sign is a wooden plank with a blue arrow pointing left and the words "THIS WAY" written in blue. The bottom sign is a wooden plank with a blue arrow pointing right and the words "THAT WAY" written in blue. The signpost is made of a vertical wooden post.

THIS WAY

THAT WAY

Будь-яке рішення – компроміс



- Управління проектами
- Управління стратегією
- Управління програмами
- Управління портфелем проєктів
- Управління ідеями/ініціативами/запитами на проєкт
- Управління життєвими циклами
- Робота з погодженнями / затвердження
- Робота з артефактами (ризики/стейкхолдери/запити на зміни)
- Управління фінансами
- Управління продуктами
- Управління вигодами

- **Управління проєктами**
- Управління стратегією?
- Управління програмами?
- Управління портфелем проєктів?
- Управління ідеями/ініціативами/запитами на проєкт
- Управління життєвими циклами?
- Робота з погодженнями / затвердження?
- Робота з артефактами (ризики/стейкхолдери/запити на зміни)
- Управління фінансами?
- Управління продуктами?
- Управління вигодами?



# The new Microsoft Planner



# Planner Premium (ліцензія Planner Plan 1 & 3)

Planner

My plans > **Business Central Implementation** Grid Board Timeline Reports Charts People Goals Assignments Share

Filter by keyword

Baseline Filters Conditional coloring

	% complete	Task Name	Duration	Assigned to	Bucket	Priority	Labels
1	4%	<b>Business Central Implementation</b>	230 days			Medium	
2	17%	<b>1. Ініціація проекту</b>	29 days			Medium	
3	50%	1.1 Визначення цілей проекту	3 days	Oleksiy Prosnitskyy	Виконавець	Medium	Contracts
4	50%	1.2 Написання Бізнес-кейсу	4 days	Olesia Honchar	Виконавець	Medium	Backlog
5	0%	1.3 Визначення зацікавлених сторін	4 days	Daniil Balya	Виконавець	Medium	
6	0%	1.4 Написання статуту проекту	2 days	Anastasiia Komendant	Виконавець	Medium	
7	0%	1.5 Погодження попередніх пунктів з замов...	3 days	Svitlana Pyvovarova	Виконавець	Medium	
8	0%	1.6 Пошук підрядника на виконання робіт	5 days	Oleksiy Prosnitskyy	Виконавець	Medium	
9	12%	<b>2. Планування проекту</b>	53 days			Medium	
10	100%	2.1 Створення графіку проекту	6 days	Anastasiia Komendant	Замовник	Medium	Green
11	0%	2.3 Погодження ресурсів з спонсором прое...	1 day	Anastasiia Komendant	Оргпитання	Low	Yellow
12	0%	2.2. Визначення ресурсів проекту	26 days	Daniil Balya	Виконавець	Urgent	Yellow
13	0%	2.4 Погодження графіку проекту	10 days	Anastasiia Komendant	Замовник	Urgent	Yellow
14	0%	2.5 Підписання контракту з підрядником	6 days	Svitlana Pyvovarova	Backlog	Important	Backlog
15	0%	Контракт підписаний	0 days	Anastasiya Pushkarenko	Замовник	Medium	Contracts
16	0%	<b>3. Збір вимог</b>	106 days			Medium	

+ Add new task

+ New plan

	Planner Plan 1	Planner Plan 3
Зв'язки	Finish-Start	Finish-Start, Finish-Finish Start-Finish, Start-Start
Затримки та випередження	Hi	Так
Базовий план	Hi	Так
Кількість базових планів	0	1
Історія змін	Hi	Так
Зв'язок з цілями	Hi	Так
Корегування планових трудовитрат по дням	Hi	Так
Можливість побудови звітів в Power BI по базовому плану	Hi	Hi
Можливість створити користувацькі поля організації	Hi	Hi
Створення графік з шаблону	Hi	Hi
Імпорт з Ексель	Hi	Hi
Можливість задавати власні назви стовпчиків	Hi	Hi
Корегування трудовитрат по окремим призначенням	Hi	Hi
Можливість кастомізувати інструмент	Hi	Hi

- **Управління проєктами**
- Управління стратегією
- Управління програмами
- Управління портфелем проєктів
- **Управління ідеями/ініціативами/запитами на проєкт**
- Управління життєвими циклами
- Робота з погодженнями / затвердження
- **Робота з артефактами (ризики/стейкхолдери/запити на зміни)**
- Управління фінансами
- Управління продуктами
- Управління вигодами

# Planner Premium (ліцензія Planner Plan 1 & 3) + Power BI + Power Apps

Microsoft Project

←
Read Only Grid
Show Chart
New Plan
Delete
Refresh
Visualize this view
Email a Link
Flow
Excel Templates
Export to Excel
Import
Share

### All Projects

Group By: (no grouping)

Name	Start Date	Finish Date	Earliest Start Date	Effort (Hours)	Effort Completed (H...)	% Complete	Project Status	Project manager	MS Project Document
Business Plan	12/1/2022	4/30/2025 5:00 PM	12/1/2022 9:00 AM	616.00	24.00	0.03	Active	Serhii Chekhla	(No Name)
Calculations	2/4/2023	2/4/2023 9:00 AM	2/4/2023 9:00 AM	---	---	---	Active	Oleksiv Prosnitskyy	(No Name)
CPM5_Project_Starting_Up	11/7/2020	4/18/2025 5:00 PM							
Emil Consulting	8/8/2025	8/15/2025 5:00 PM							
Homework	5/13/2025	5/13/2025 9:00 AM							
Leo_PPM_1	8/25/2025	9/23/2025 5:00 PM							
Marketing Campaign	3/1/2024	12/12/2024 5:00 ...							
Plan with AI Project Man...	4/14/2025	4/16/2025 5:00 PM							
Premium Plan	4/21/2024	6/28/2024 5:00 PM							
Program development te...	7/16/2025	3/25/2026 5:00 PM							
Project Management	3/18/2023	7/26/2023 5:00 PM							
Project Management	10/3/2023	1/26/2024 5:00 PM							
PROPM план на 2024-20...	9/20/2024	3/19/2025 5:00 PM							
Resource Assignments	3/2/2023	3/8/2023 5:00 PM							
SES building test 1 plan	7/10/2025	9/8/2025 5:00 PM							

## Portfolio Dashboard

Projects

69

Effort

2,989

Hours

Effort Completed

450

Hours

Effort Remaining

2,539

Hours

Projects by Progress

Effort by Project

Projects by Project Manager

Project	Link	Project Manager	Start	Finish	Progress	Effort (Hours)	Task Count	Overdue Tasks	Late Tasks	On Track Tasks	Future Tasks	Completed Tasks
Святослав_DPM1_Test		Святослав Качк...	10/21/2019	10/21/2019	0 %	0						
SVIT_DPM1_Учебный_проект		Світлана Шевче...	10/21/2019	10/21/2019	0 %	0						
БРИТАНИЯ5		Olena Bilous	10/21/2019	10/30/2019	7 %	78	14	11				3
Проект Марина Ю		Марина Юдіна	10/21/2019	10/30/2019	18 %	160	12	11				1
Стоматологічна клініка створення арх бюро		Оксана Хороша...	11/1/2019	11/1/2019	0 %	0	1	1				
Проект без имени		Оксана Хороша...	11/1/2019	11/1/2019	0 %	0						
Проект без имени		Оксана Хороша...	11/1/2019	11/1/2019	0 %	0						
Проект без имени		Оксана Хороша...	11/2/2019	11/2/2019	0 %	0						
Проект без имени		Оксана Хороша...	11/2/2019	11/2/2019	0 %	0						
Проект без имени		Оксана Хороша...	11/2/2019	11/2/2019	0 %	0						
<b>Total</b>						<b>3,281</b>	<b>487</b>	<b>289</b>	<b>12</b>			<b>167</b>

PORTFOLIO DASHBOARD
PORTFOLIO TIMELINE
PORTFOLIO MILESTONES
RESOURCE DASHBOARD
RESOURCE ASSIGNMENTS
TASK OVERVIEW
PROJECT TIMELINE
MY WORK
MY TIMELINE

# Робота з рівнями ієрархії в Microsoft Project

UP\_LEO [Read-Only] - Project Professional

File Task Resource Report Project **View** Developer Help PRO PM Ex-Change Gantt Chart Format

Task Views: Gantt Chart, Task Usage, Task Board, Network Diagram, Calendar, Other Views

Resource Views: Team Planner, Resource Plan, Resource Usage, Resource Sheet, Other Views

Outline, Tables, Filter, Group by

№	I	% План	% Факт	Δ %	WBS	Завдання	Тр-с
0		66%	42%	●	0	UP_LEO	120,5
1	✓	100%	100%	●	1	Проект розпочато	0 d
2	✓	100%	100%	●	2	▷ Розробка концепції	24 5
11		100%	99%	●	3	▷ Контрактація	96 5
17	✓	100%	100%	●	4	▷ Проектування	17 c
21	📅	62%	30%	●	5	◀ БМР	78 c
22	✓📅	100%	100%	●	5.1	▷ Котлован	3,5 c
26	✓📅	100%	100%	●	5.2	▷ Фундамент	14 5
32	📅	100%	59%	●	5.3	◀ Каркас	16 5
33	✓📅	100%	100%	●	5.3.1	Кладка зовнішніх стін	5 d
34	✓📅	100%	100%	●	5.3.2	Кладка внутрішніх стін	5 d
35	📅	100%	50%	●	5.3.3	Влаштування перекриття	5,5 c
36	📅	100%	0%	●	5.3.4	Влаштування даху	6 d

СТА З ОБСЯГАМИ

Outline menu:  
+ Show Subtasks  
- Hide Subtasks  
++ All Subtasks  
Level 1  
Level 2  
Level 3  
Level 4  
Level 5  
Level 6  
Level 7  
Level 8  
Level 9

LEO Planner

My plans > Business Central Implementation

Grid Board Timeline

Filter by keyword

% complete Task Name

No	Progress	% complete	Task Name	Duration	No	Start	Finish	Duration	Predecessors	Successors	Assigned	Work
1	4%	4%	Business Central Implementation	230 d	1	8/25/2025	12/30/2025	92 d				35 h
2	17%	17%	1. Ініціація проекту	29 d	2	8/25/2025	8/27/2025	3 d				24 h
3	50%	50%	1. Ініціація проекту	3 d	3	8/25/2025	8/27/2025	3 d			Oleksiy P	24 h
4	50%	50%	1.2 Написання Бізнес-кейсу	4 d	4	9/15/2025	9/17/2025	3 d			Olesia Ho	0 h
					5	9/15/2025	9/17/2025	3 d				0 h
					8	9/18/2025	10/7/2025	14 d				0 h
					9	9/18/2025	9/24/2025	5 d	7FS	10FS		0 h
					10	9/25/2025	9/29/2025	3 d	9FS	11FS		0 h

Planner не підтримує на відміну від LEO Gantt можливість швидко «збирати» та «розбирати» проєкт по рівням ієрархії

11	0%	0%	2.3 погодження ресурсів з спонсором проєкту	1 d	23	11/26/2025	12/2/2025	5 d	22FS	24FS		0 h
12	0%	0%	2.2. Визначення ресурсів проєкту	26 d	24	12/3/2025	12/8/2025	4 d	23FS			0 h
13	0%	0%	2.4 погодження графіку проєкту	10 d	25	12/12/2025	12/22/2025	7 d				0 h
14	0%	0%	2.5 Підписання контракту з підрядником	6 d	26	12/12/2025	12/15/2025	2 d				0 h
15	0%	0%	Контракт підписаний	0 d	28	12/16/2025	12/22/2025	5 d	27FS			0 h
16	0%	0%	3. Збір вимог	106 d	29	12/26/2025	12/30/2025	3 d				0 h
					32							0 h

+ Add new task

# LEO Plan

- Home
- Recent
- Pinned
- Home Page
- Home Page
- PPM
- Ideas

← | 📄 | 🗑️ | 💾 Save | 💾 Save & Close | + New | 🗑️ Deactivate | 🗑️ Delete | 🔄 Refresh | 🔍 Check Access | 📄 Process | 👤 Assign | ⚙️ Flow | 📄 Word Templates | 📄 Run Report | ➦ Share

### LEO PPM Implementation for Invest Company - Saved

Project · Classic Project Form

Serhii Chekhla Created By | 8/25/2025 4:08 AM Created On

Agile Project Lifecycle Active for 20 days

Initiation (20 D) | Planning | Agile Iterations | Deployment & Hypercare | Closing

Summary | Project Charter | **Gantt Chart** | Finance | Products | Stakeholders | Risks | Issues | Benefits | Lessons Learned | Snapshots | Form assist

Gantt Chart Board

+ Add | Level 2 | 🔍 | 🔄 | ⏪ | ⏩ | ⚙️ | 🗑️ | 📄 | Select Baseline | On Auto Move

Period: Days | Template: Впровадження AI

№	Name	Start	Finish	Duration	Predecessors	Successors	Assigned	Work	Actual	Remaining	Bucket	November 2025								
												T	19, W	20, T	21, F	22, S	23, S	24, M	25, T	26, W
18	Збір фідбеку, моніторинг	10/28/2025	11/3/2025	5 d	17FS	19FS		0 h	0 h	0 h	Блок 1									
19	Адаптація/корекція рішень	11/4/2025	11/10/2025	5 d	18FS	21FS	SC Serhii Che	0 h	0 h	0 h	Блок 1									
20	Фаза 4: Масштабування	11/11/2025	12/8/2025	20 d				11 h	7 h	4 h	Блок 1									
21	Масштабування рішень	11/11/2025	11/18/2025	6 d	19FS	22FS		0 h	0 h	0 h	Блок 1									
22	Додаткове навчання п	11/19/2025	11/25/2025	5 d	21FS	23FS	OP SC 👤	11 h	7 h	4 h	Блок 1									
23	Оптимізація бізнес-процесів	11/26/2025	12/2/2025	5 d	22FS	24FS	Assigned	Work	Actual	Remaining	✖: 1									
24	Внутрішня база AI-кейсів/гайд	12/3/2025	12/8/2025	4 d	23FS		OP Oleksiy P...	5 h	4 h	1 h	🗑️: 1									
25	Фаза 5: Оцінка результатів і стр	12/12/2025	12/22/2025	7 d			SC Serhii Ch...	6 h	3 h	3 h	🗑️									
26	Аналіз результатів	12/12/2025	12/15/2025	2 d																
28	Формування фінального звіту	12/16/2025	12/22/2025	5 d	27FS															
29	Пропозиції щодо довгостроко	12/26/2025	12/30/2025	3 d																
30	Визначення наступних кроків	12/26/2025	12/30/2025	3 d							Блок 1									
32	+ Create NewTask																			


# LEO Plan – 3 500 USD/year (no user constraints)

Роль	Power Apps Per Plan	Power BI Pro	Power Automate Per User Plan
Керівник проекту	+		
Керівник портфелю	+	+	
РМО	+	+	
Топ-менеджмент	+	+	
Консультант	+	+	
Service account	+	+	+




Project Server

# Project Server Subscription Edition

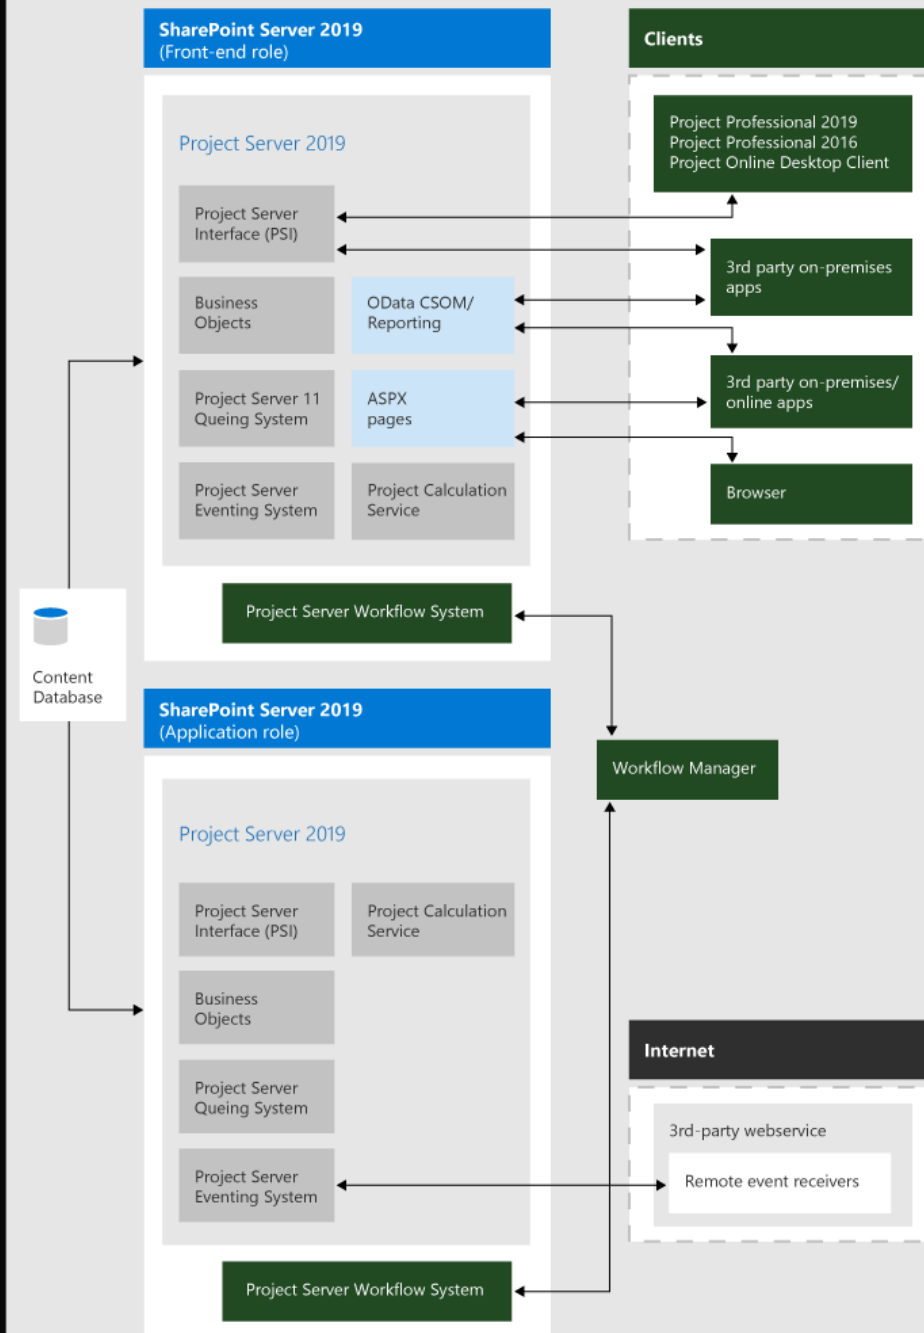

1. Windows Server (2019 чи 2022 чи 2025, версії Standard чи Datacenter).
2. SharePoint Server Subscriptions Enterprise
3. Project Server Subscriptions
4. SQL Server (2019, 2022, версія Standard чи Enterprise)
5. Project Professional (2019, 2021, 2024, Online Desktop Client)  
для кожного керівника проекту
6. Client Access License (CAL) для Project Server, SharePoint Standard, SharePoint Enterprise всім іншим

# Власна або хмарна інфраструктура

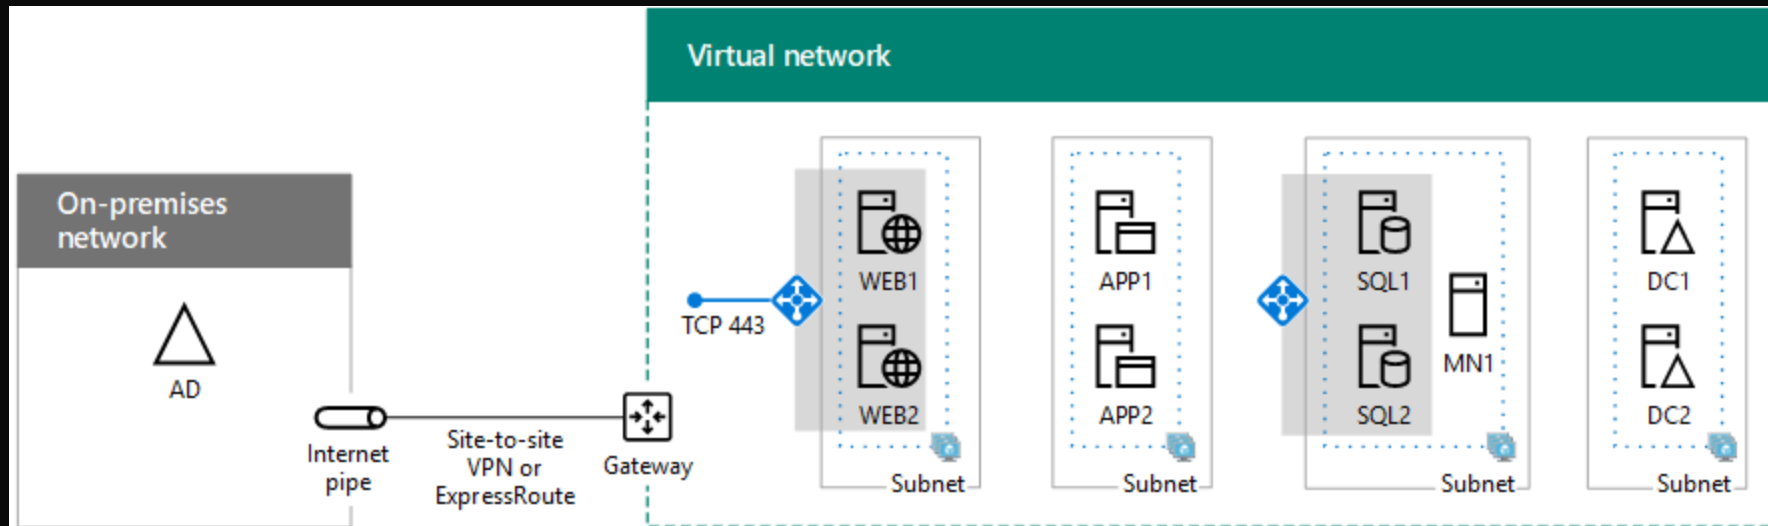

# Timesheets

ОГЛЯД ТАБЕЛЬ ПАРАМЕТРИ

Зберегти Надіслати Додати рядок Попередній Далі Вибрати період

Надіслати Завдання Період

- Проекти
- Затвердження
- Завдання
- Табель**
- Ресурси
- РЕДАГУВАТИ ПОСИЛАННЯ

Табель відкрито. Можна надіслати оновлення або активувати його. **Усього: 40г** **Період:** 08.09.2025 0:00 - 14.09.2025 23:59

	Назва проекту	Ім'я або опис з	Примітка	Категорія вист	Стан процесу	Тип часу	Пн 08.09	Вт 09.09	Ср 10.09	Чт 11.09	Пт 12.09	Сб 13.09	Нд 14.09
<input type="checkbox"/>	CPM17_Homewo	Бюджетування і		Стандартний		Фактичні		4г					
						Запланована робота							
<input type="checkbox"/>	DEMO	Верхній рівень		Стандартний		Фактичні	4г				4г		
						Запланована робота							
<input type="checkbox"/>	CPM17_Homewo	Призначити рес		Стандартний		Фактичні			8г				
						Запланована робота							
<input type="checkbox"/>	CPM17_Homewo	Розробити реєс		Стандартний		Фактичні				8г			
						Запланована робота							
<input type="checkbox"/>	Адміністративн	Адміністративн		Адміністративн		Фактичні	4г	4г			4г		
						Запланована робота							
<input type="checkbox"/>	Адміністративн	Відпустка		Відпустка		Фактичні							
						Запланована робота							
<input type="checkbox"/>	Адміністративн	Тимчасова непр		Тимчасова непр		Фактичні							
						Запланована робота							
	Обсяг роботи					Фактичні	8г	8г	8г	8г	8г		
						Запланована робота							

Код	Найменування	Приблизна вартість, USD/ПДВ
H04-01320	Microsoft SharePoint Server SLng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 AP	18 000 (на три роки)
H22-01283	Microsoft Project Server SLng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 AP	14 000 (на три роки)
76N-01177	Microsoft SharePoint Enterprise CAL SLng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 AP Device CAL	220 (на три роки)
76N-01575	Microsoft SharePoint Enterprise CAL SLng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 AP User CAL	290 (на три роки)
H05-01756	Microsoft SharePoint Standard CAL SLng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 AP Device CAL	250 (на три роки)
H05-01757	Microsoft SharePoint Standard CAL SLng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 AP User CAL	320 (на три роки)
H21-01763	Microsoft Project Server CAL SLng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 AP Device CAL	400 (на три роки)
H21-01764	Microsoft Project Server CAL SLng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 AP User CAL	530 (на три роки)
DG7GMGF0PWHC-0003	Microsoft Windows Server 2025 Standard - 16 Core License Pack	1411.20
DG7GMGF0M7XV-0003	Microsoft SQL Server 2022 Enterprise Core - 2 Core License Pack	18146.40
DG7GMGF0M7XW-0002	Microsoft SQL Server 2022 Standard Core - 2 Core License Pack	4732.80
DG7GMGF0PN45-0001	Microsoft Project Professional 2024	1356.00



!2031!

Looking

**Ahead**



- Управління проектами
- Управління стратегією
- Управління програмами
- Управління портфелем проєктів
- Управління ідеями/ініціативами/запитами на проєкт
- Управління життєвими циклами
- Робота з погодженнями / затвердження
- Робота з артефактами (ризики/стейкхолдери/запити на зміни)
- Управління фінансами
- Управління продуктами
- Управління вигодами

# LEO PPM Planner Edition

LEO CONSULTING LEO PPM Demo

Пошук

Показувати як Показати діаграму Створити Видалити Оновити Візуалізувати це пода... Надіслати посилання Потік

Надати спільний доступ

### Активні стратегічні цілі

Змінити стовпці Змінити фільтри Фільтрування за кл... Візуалізувати

Назва	Статус цілі	Відповідаль...	Пріор...	Дата поч...	Одиниці вимі...	Початкове ...	Поточне значен...	Цільове значе...	Очікувана дата досягне...
Відкрити 50 нових магазинів до 2027 року	У процесі	Daniil Balya (...)	Крит...		#Число	0	5	50	12/1/2027
<b>Поточне значення</b>									
Поточне значення	Дата звіту	Додаткові коментарі							
5	4/10/2025	Відкриття 2-х магазинів в Яремче							
3	3/20/2025	Відкриття магазину в Верховині							
2	2/15/2025	Магазин в Косіві							
1	1/12/2025	Магазин в Криворівні							
Рядки: 4									
Довести частку ринку будівельних компаній до ...	У процесі	Yurii Stepanov...	Сере...	1/1/2024	%Проценти	15	23	25	12/31/2024
Забезпечити найкращий досвід клієнтів на ринк...	У процесі	Anastasiia Ko...	Сере...	11/1/2023	#Число	80	90	95	11/29/2024
Збільшення долі ринку до 40%	Нова	Daniil Balya (...)	Висо...	1/10/2025	%Проценти	30		40	12/30/2025
Збільшення лояльності співробітників NPS	Досягнуто	Olesia Honch...	Сере...	1/1/2024	#Число	7	9	9	11/29/2025
Збільшити вдвічі кількість Замовників по продук...	Нова	Serhii Chekhla...	Висо...	1/1/2024	#Число	10	11	20	12/30/2024
Збільшити оборот від операційної діяльності на ...	Нова	Oleksiy Prosnі...	Висо...	1/1/2024	%Проценти	100	105	150	9/29/2024
Зменшити операційні витрати на 5%	Призупин...	Serhii Chekhla...	Сере...	1/1/2024	%Проценти	100	99	95	7/31/2024
Підвищити лояльність Замовників до 99%	У процесі	Nataliia Rusu...	Сере...	11/1/2023	%Проценти	90	91	99	12/30/2024
Рядки: 10									

Головна Останні Закріплено Домашня Домашня Сторінка Стратегія Звіти Стратегічні цілі Дашборди Стратегічні цілі PPM Запити на проект Портфелі Програми Проекти Артефакти Задачі Ризики Інциденти Стейкхолдери Засвоєні уроки Продукти PPM



	<b>Planner Plan 3</b>	<b>LEO Gantt</b>
Зв'язки	Finish-Start, Finish-Finish Start-Finish, Start-Start	Finish-Start, Finish-Finish Start-Finish, Start-Start
Затримки та випередження	Так	Так
Базовий план	Так	Так
Кількість базових планів	1	10
Історія змін	Так	Ні
Зв'язок з цілями	Так	Ні
Корегування планових трудовитрат по дням	Так	Ні
Можливість побудови звітів в Power BI по базовому плану	Ні	Так
Можливість створити користувацькі поля організації	Ні	Так
Створення графіку з шаблону	Ні	Так
Імпорт з Ексель	Ні	Так
Можливість задавати власні назви стовпчиків	Ні	Так
Корегування трудовитрат по окремим призначенням	Ні	Так
Можливість кастомізувати інструмент	Ні	Так



acino



# LEO PPM Planner Edition – 7 000 USD/year (no user constraints)

Роль	Project Plan 3	Project Plan 1	Power BI Pro	Power Automate Per User Plan
Керівник проекту	+			
Керівник портфелю		+	+	
РМО	+		+	
Топ-менеджмент		+	+	
Консультант			+	
Service account			+	+

# LEO PPM Gantt Edition – 9 000 USD/first year (no user constraints)

Роль	Power Apps Per Plan	Power BI Pro	Power Automate Per User Plan
Керівник проекту	+		
Керівник портфелю	+	+	
РМО	+	+	
Топ-менеджмент	+	+	
Консультант	+	+	
Service account	+	+	+

OnePlan

# OnePlan

	Plan Type	Name	Business Unit	State	Status	Schedule Health	Financial Health	Effort Health	Issue Health	Budget	Benefits	Estimated End	% Done (Summary)
Portfolio	Application Development (1)	Applications	Active	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	\$701,110.00	\$750,000.00	11/19/2024	0%
Program	Agile Development (4)	Applications	Active	(3) Off Track	(1) On Track	(1) On Track	(3) Off Track	(1) On Track	(1) On Track	\$701,110.00	\$750,000.00	11/19/2024	0%
Project	Demo modifications and updates	Applications	Active	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	\$43,660.00	\$100,000.00	07/05/2024	54%
Epic	Integration with Third-Party Systems	Applications	Active	(2) At Risk	(2) At Risk	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	\$499,850.00	\$450,000.00	10/10/2024	57%
Epic	Security and Compliance Improvement	Applications	Active	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	\$157,600.00	\$200,000.00	11/19/2024	40%
Epic	User Interface Enhancements (1)	Applications	Active	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	\$0.00	\$0.00	08/07/2024	63%
Portfolio	Brand Management Portfolio (1)	Marketing	Active	(2) At Risk	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	\$2,628,515.00	\$2,120,000.00	06/25/2025	0%
Program	Brand Management (4)	Marketing	Active	(3) Off Track	(2) At Risk	(3) Off Track	(3) Off Track	(1) On Track	(1) On Track	\$2,628,515.00	\$2,120,000.00	06/25/2025	13%
Project	Marketing - Project Pro	Marketing	Active	(3) Off Track	(3) Off Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	\$193,000.00	\$170,000.00	07/17/2024	0%
Project	New Project	Marketing	On Hold	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	\$708,590.00	\$1,000,000.00	06/14/2024	0%
Project	SEO Optimization	Marketing	Active	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	\$954,805.00	\$350,000.00	12/17/2024	17%
Project	Social Media Strategy	Marketing	Active	(3) Off Track	(3) Off Track	(3) Off Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	\$772,120.00	\$600,000.00	06/25/2025	0%
Portfolio	Business Transformation (1)	Transformation	Active	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	\$1,836,946.67	\$6,450,000.00	10/09/2026	0%
Program	Digital Transformation (6)	Transformation	Active	(2) At Risk	(2) At Risk	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	\$1,836,946.67	\$6,450,000.00	10/09/2026	0%
Epic	Bachmanity	Transformation	Proposed	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	\$0.00	\$0.00	05/05/2025	0%
Project	Change Management	Transformation	Active	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	\$278,000.00	\$300,000.00	04/14/2025	34%
Project	Cloud Migration	Transformation	Active	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	\$468,654.17	\$1,000,000.00	03/28/2025	40%
Epic	Customer Experience Redesign	Transformation	Active	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	\$919,762.50	\$5,000,000.00	10/09/2026	26%
Project	Implementation Change Plan	Transformation	Proposed	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	(1) On Track	\$0.00	\$0.00	02/06/2024	0%

General Resources Advanced Plan Types Notifications Schedules Tools Group Audit

[+ Add Type](#) Note: Plan type names are tied to reporting items and name changes will require report updates.

	Name
<a href="#">+</a> <a href="#">✎</a> <a href="#">🗑️</a>	▼ Portfolio
<a href="#">+</a> <a href="#">✎</a> <a href="#">🗑️</a>	▼ Program
<a href="#">+</a> <a href="#">✎</a> <a href="#">🗑️</a>	Project
<a href="#">+</a> <a href="#">✎</a> <a href="#">🗑️</a>	Epic
<a href="#">+</a> <a href="#">✎</a> <a href="#">🗑️</a>	▼ Objective
<a href="#">+</a> <a href="#">✎</a> <a href="#">🗑️</a>	Key Result
<a href="#">+</a> <a href="#">✎</a> <a href="#">🗑️</a>	Idea

- General
- Users
- Calendars
- Fields
- Format Rules
- Backup/Restore
- Subscription
- Apps**
- Financial Plan
- Help Guide
- Insights
- Integrations
- KanBan Plan
- Microsoft Teams
- My Work Plan
- Plan Details
- Portfolio Plan

# OnePlan

OnePlan | LEO DEMO

## Service interface to support Rest API

This plan has been locked for editing by Oleksiy Prosnitskyy on 29/04/2024 08:31 pm [Unlock](#)

WBS	Name	Health Status	Duration	Start	Due	Timeline													
						21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20
	<b>Service interface to support Rest API</b>		<b>224 days</b>	<b>10/01/2022</b>	<b>17/11/2022</b>	Service interface to support Rest API													
1	<b>Scope</b>	<b>(1) On Track</b>	<b>7 days</b>	<b>10/01/2022</b>	<b>18/01/2022</b>	Scope													
1.1	Determine project scope	(1) On Track	1 day	10/01/2022	10/01/2022	Determine project scope													
1.2	Define preliminary resources	(1) On Track	2 days	11/01/2022	12/01/2022	Define preliminary resources													
1.3	Secure project sponsorship	(1) On Track	2 days	13/01/2022	14/01/2022	Secure project sponsorship													
1.4	Secure core resources	(1) On Track	2 days	17/01/2022	18/01/2022	Secure core resources													
1.5	Scope complete	(1) On Track	0 days	18/01/2022	18/01/2022	Scope complete													
2	<b>Analysis/Software Requirements</b>	<b>(1) On Track</b>	<b>19 days</b>	<b>19/01/2022</b>	<b>15/02/2022</b>	Analysis/Software Requirements													
2.1	Conduct needs analysis	(1) On Track	6 days	19/01/2022	27/01/2022	Conduct needs analysis													
2.2	Draft preliminary software spe...	(1) On Track	4 days	27/01/2022	02/02/2022	Draft preliminary software specifications													
2.3	Develop preliminary budget	(1) On Track	3 days	02/02/2022	07/02/2022	Develop preliminary budget													
2.4	Review software specifications...	(1) On Track	1 day	07/02/2022	08/02/2022	Review software specifications/budget with team													

Tasks | New Item

			8h 0m	8h 0m	8h 0m	8h 0m	8h 0m	-	-	40h 0m	
--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	---	---	--------	--

	NAME ↑	CHARGE TYPE	MON 1	TUE 2	WED 3	THU 4	FRI 5	SAT 6	SUN 7	TOTAL	PROGRESS
--	--------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------

<input type="checkbox"/>	▼ Customer Feedback Interface										
--------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Release 3 Plan: Customer Feedback Interface	5h 0m	5h 0m				10h 0m	<div><div style="width: 18h / 264h;"></div></div>
--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------------------------	-------	-------	--	--	--	--------	---------------------------------------------------

<input type="checkbox"/>	▼ Delivering Agile Solutions										
--------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Release 4 Plan: Delivering Agile Solutions	3h 0m	3h 0m				6h 0m	<div><div style="width: 6h / 224h;"></div></div>
--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------------------------	-------	-------	--	--	--	-------	--------------------------------------------------

<input type="checkbox"/>	▼ Server Upgrades										
--------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Secure project sponsorship Plan: Server Upgrades		8h 0m	8h 0m	8h 0m		24h 0m	<div><div style="width: 24h / 16h;"></div></div>
--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------------------------------	--	-------	-------	-------	--	--------	--------------------------------------------------

# OnePlan Pricing



Product ▾

Solutions ▾

Customer Success ▾

Resources ▾

About Us

Pricing

Login

Contact

Try OnePlan

## Free

# \$0

Max 1 user

Try for free

For individuals getting started with project & work management

### Key features

- ✓ Insights AI
- ✓ Portfolio Plan
- ✓ Work Plan
- ✓ My Work
- ✓ Mobile
- ✓ Microsoft Teams Integration

## Basic

# \$10

3+ Users

Try for free

For small teams looking to collaborate & track project progress

### Key features

- ✓ Insights AI
- ✓ Portfolio Plan
- ✓ Work Plan
- ✓ My Work
- ✓ Mobile
- ✓ Microsoft Teams Integration
- ✓ Timesheets
- ✓ Sofia GPT

## Professional

# \$30

3+ Users

Try for free

For companies looking to align strategies and projects

### Key features

- ✓ Insights AI
- ✓ Portfolio Plan
- ✓ Work Plan
- ✓ My Work
- ✓ Mobile
- ✓ Microsoft Teams Integration
- ✓ Status Reports
- ✓ Timesheets
- ✓ Sofia GPT

## Enterprise

Contact Us For Price

3+ Users

Try for free

For companies managing complex portfolios with security and advanced reporting & analytics

### Key features

- ✓ Insights AI
- ✓ Portfolio Plan
- ✓ Work Plan
- ✓ My Work
- ✓ Mobile
- ✓ Microsoft Teams Integration
- ✓ Status Reports
- ✓ Timesheets
- ✓ Sofia GPT




Welcome to OnePlan!





# Projectum xPM

# Projectum xPM: Power PPM

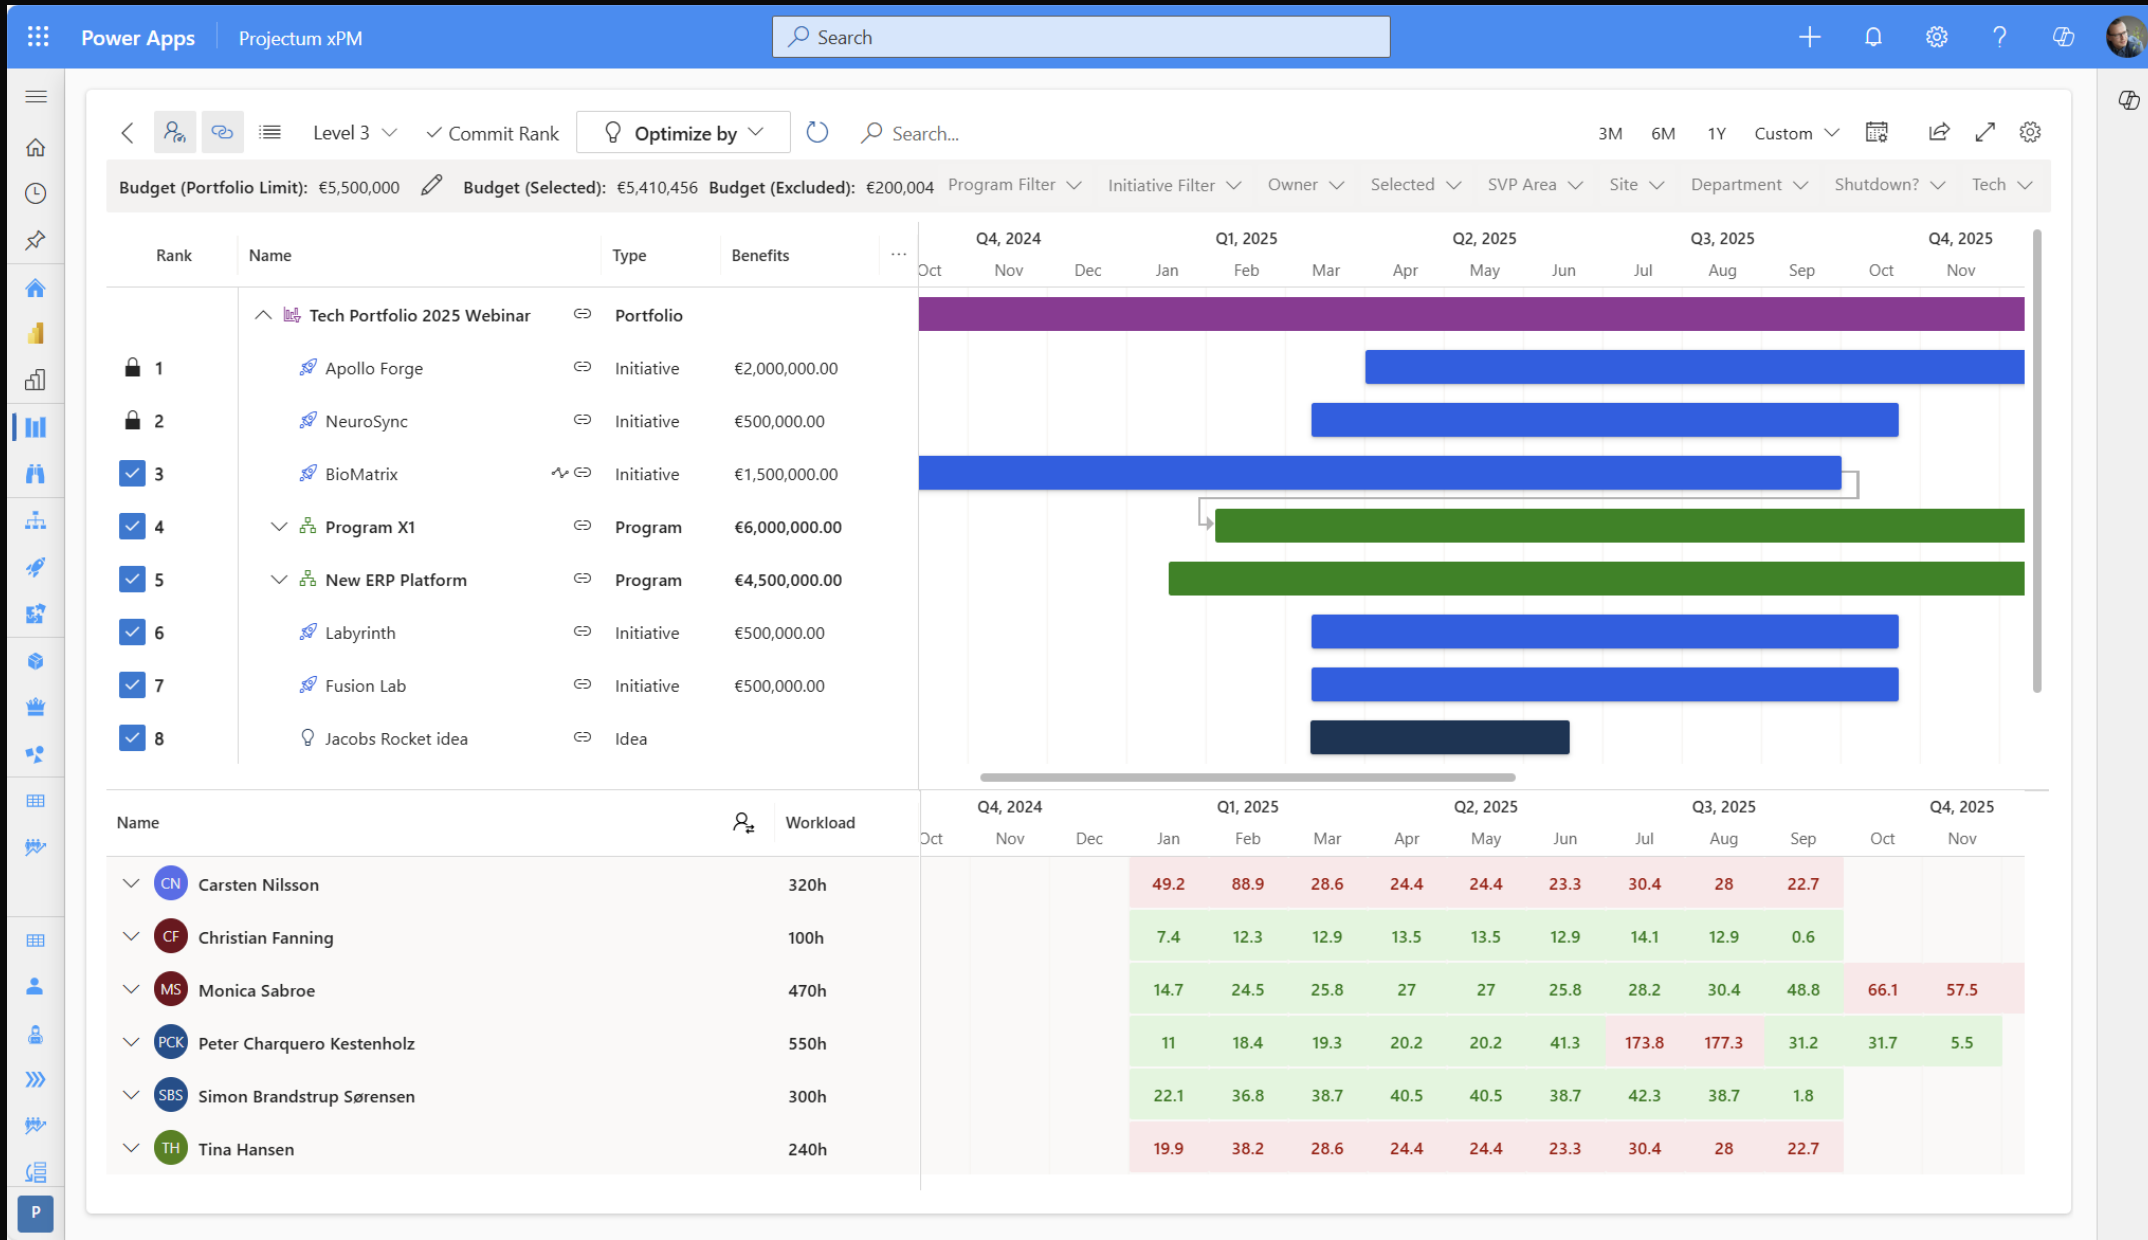

# Projectum xPM: Team Planner

Power Apps | Projectum xPM

Search

All Levels | Search...

Month | Apr 2025 → Sep 2025 | Today

Role | Manager | Project Plan | Owner | State

Name	Group by resource	Workload	Q2, 2025			Q3, 2025	
			Apr	May	Jun	Jul	Aug
AR Alexander Rosager		1,486 h	96%	94%	93%	104%	39%
AI Sentinel		279 h	56.41	56.41	53.85	58.97	53.85
Kristoffer #1		348 h	87	87	83.05	90.95	0
PFJ Test Heatmap		425 h	100.00	100.00	100	125	0
Scale up the Baltics		433 h	87.44	87.44	83.46	91.41	83.46
ASR Ali Shah Ravn		78 h	18%	1%	1%	3%	1%
AI Sentinel		78 h	60.5	2	2	11	2
AS Amalie Søndergaard		250 h	65%	6%	1%	1%	1%
NeuroSync		250 h	222.00	22	2	2	2
AS Anders Sørensen		350 h	65%	36%	0%	0%	0%
AI Resource Upgrade in Azure		225 h	150	75	0	0	0
AI Sentinel		75 h	25.00	50.00	0	0	0
Kristoffer #1		50 h	50.00	0	0	0	0
AS Annesofie Sørensen		420 h	1%	23%	11%	43%	43%
Catalyst Lab		420 h	2	80	38.18	150	150
ASL Artem Stærmosse Lishchenko		196 h	28%	1%	0%	27%	0%
NeuroSync		196 h	95.65	4.35	0	96	0
ART Asbjørn Reenberg Thomsen		188 h	11%	11%	11%	11%	10%
LATAM		188 h	37.93	37.93	36.21	39.66	36.21
CJ Casper Juul-Gregersen		1,730 h	115%	114%	109%	87%	71%

# Projectum xPM: Time for Teams

Power Apps | Projectum xPM

Search

Remember to submit your previous timesheet

21 Apr - 27 Apr (W 17)

Open Submit Approve

All Tasks	Planned Work	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	Period Total
Administration									
Business as Usual		3	3	3	7	3			19
Operations Management		3	3	3	3	3			15
Resource Management					2				2
Continuous Improvement					2				2
Innovation Projects		1	5	4	1	1			12
Process Improvement Project				4					4
Technology Implementation Project		1	5						6
Product Development Project					1	1			2
Accelerated Growth (SAP-PS-2308)		2				4			6
Develop Software		2				4			6
Demo of resource management March 2025 (SAP-PS-2854)	50								
ERP Implementation (SAP-PS-2321)	150	2							2
Define Project Scope	150	2							2
Enhanced Digital Upgrade (SAP-PS-2713)	50								
Project Charter Development	10								
Project Closure Meeting	5								
<b>Total</b>		8	8	7	8	8	0	0	39

# Projectum xPM: Pricing

## PROJECTUM xPM mid-market license model



**STARTING FROM**

**13.320 EUR/VAT**

per year

- ✓ Incl. 25 Managers
- ✓ Incl. 25 Team Members PREMIUM

## PROJECTUM xPM Enterprise license model



**STARTING FROM**

**24.000 EUR/VAT**


per year

- ✓ Incl. 50 Managers
- ✓ Incl. 50 Team Members PREMIUM

# Будівельні проекти



Task Name	% Complete	Bas Dur
Project Code - Project Name	0%	26.
RFQ Phase	0%	
RFQ Phase (Review of Request, Acceptance or Reject)	0%	
Initialization Phase	0%	7
Customer requirements - (DOORS)	0%	
System Architecture - preliminary (DOORS)	0%	
Feasibility Study Report	0%	
Preliminary Planning Chart	0%	
Quotation	0%	
Publish all documents	0%	
Project Planning	0%	
Project Monitoring	0%	0.
System Requirements Development	0%	11.
System requirements - preliminary (DOORS)	0%	
Feasibility Study Report - updated, if applicable	0%	
System requirements - updated (DOORS)	0%	
System requirements - baseline (DOORS)	0%	
System requirements - baseline comparison (DOORS)	0%	
Meeting Report	0%	0.
Publish all documents	0%	
Sample Project Plan DND Process	0%	0
Project Code - Project Name	0%	14.
RFQ Phase	0%	
RFQ Phase (Review of Request, Acceptance or Re	0%	
Initialization Phase	0%	7
Customer requirements - (DOORS)	0%	
System Architecture - preliminary (DOORS)	0%	
Feasibility Study Report	0%	
Preliminary Planning Chart	0%	
Quotation	0%	
Publish all documents	0%	
Project Planning	0%	

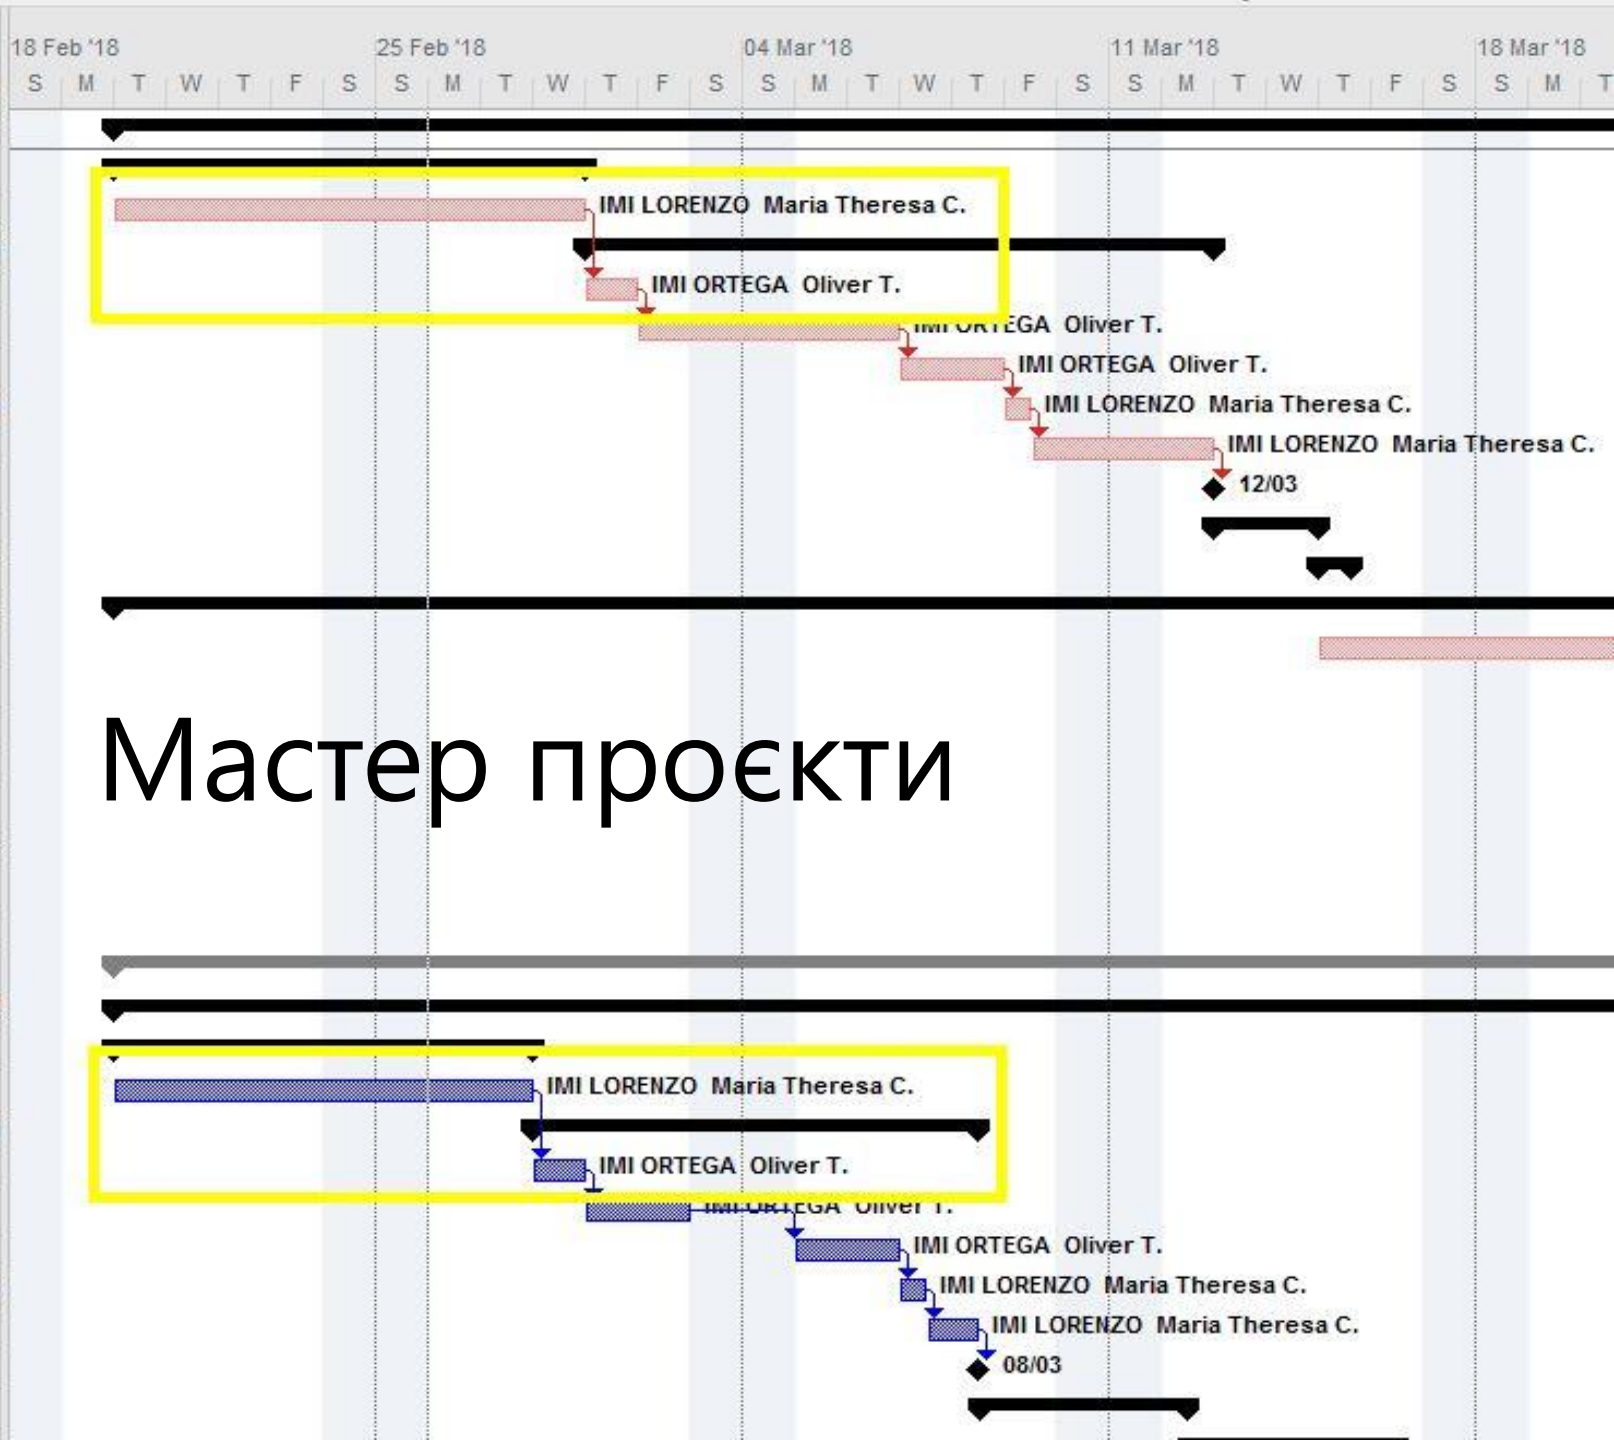




Project Server

# ORACLE

# PRIMAVERA

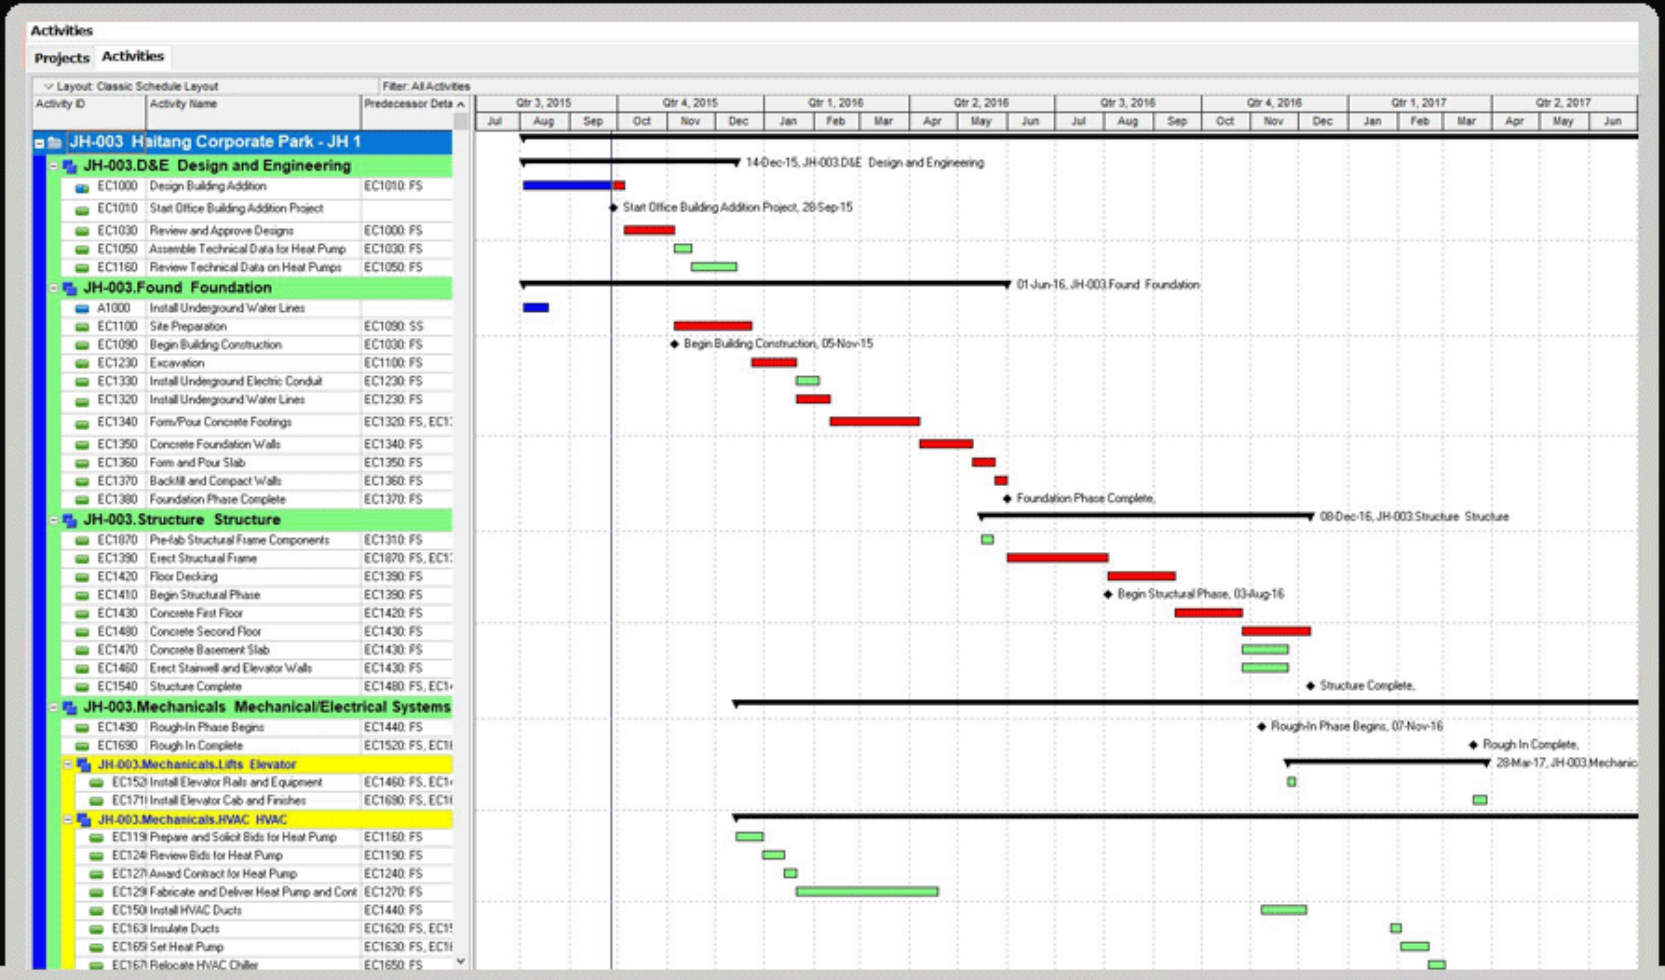

## Пропонуються наступні пакети впровадження Primavera

### Базовий

**\$10 000**  
за проект

Рекомендовано для компаній з середнім або високим рівнем технологічної зрілості в управлінні проектами, які мають компетенції з впровадження Primavera своїми силами, або для автоматизації управління окремими проектами

- ✘ Оцінка вимог та розробка ТЗ
- ✘ Організаційний консалтинг
- ✘ Реінжиніринг бізнес-процесів
- ✘ Розробка технічного проекту
- ✓ Постачання ліцензій ПЗ
- ✓ Розгортання АСУПр або закупівля

### Стандарт

**\$100 000**  
за проект

Рекомендовано для компаній з середнім або високим рівнем технологічної зрілості в управлінні проектами, які НЕ мають власних компетенцій з впровадження Primavera та автоматизації і регламентації проектної діяльності

- ✓ Оцінка вимог та розробка ТЗ
- ✘ Організаційний консалтинг
- ✘ Розробка технічного проекту
- ✘ Реінжиніринг бізнес-процесів
- ✓ Постачання ліцензій ПЗ
- ✓ Розгортання АСУПр або закупівля

### Екстра

**\$300 000**  
за проект

Рекомендовано для компаній з необхідністю реінжинірингу процесів управління проектами або компаній, які виконують більше 20 проектів одночасно, або реалізують складні високобюджетні, високоризикові проекти і програми

- ✓ Оцінка вимог та розробка ТЗ
- ✓ Організаційний консалтинг
- ✓ Розробка технічного проекту
- ✓ Реінжиніринг бізнес-процесів
- ✓ Постачання ліцензій ПЗ
- ✓ Розгортання АСУПр або закупівля



## Пропонуються наступні пакети PRIMAVERA HOSTED

### Базовий

**\$750**  
Щомісячно

Рекомендовано для окремих проектів, або компаній, з кількістю великих та середніх проектів до 5. Максимальна кількість користувачів: 30.

- ✓ Доступ до розгорнутої АСУПр
- ✓ Технічне адміністрування АСУПр
- ✓ Резервування та відновлення
- ✓ Адміністративна документація
- ✓ Користувацька документація
- ✓ Off-line адмін. підтримка
- ✗ Off-line підтримка користувачів
- ✗ On-line підтримка користувачів

### Стандарт

**\$1500**  
Щомісячно

Рекомендовано для більшості компаній з кількістю середніх та великих проектів від 5 до 10. Максимальна кількість користувачів: 100.

- ✓ Доступ до розгорнутої АСУПр
- ✓ Технічне адміністрування АСУПр
- ✓ Резервування та відновлення
- ✓ Адміністративна документація
- ✓ Користувацька документація
- ✓ Off-line адмін. підтримка
- ✓ Off-line підтримка користувачів
- ✗ On-line підтримка користувачів

### Екстра

**\$2500**  
Щомісячно

Рекомендовано для великих компаній з кількістю середніх та великих проектів від 10 і більше. Максимальна кількість користувачів: 250.

- ✓ Доступ до розгорнутої АСУПр
- ✓ Технічне адміністрування АСУПр
- ✓ Резервування та відновлення
- ✓ Адміністративна документація
- ✓ Користувацька документація
- ✓ Off-line адмін. підтримка
- ✓ Off-line підтримка користувачів
- ✓ On-line підтримка користувачів



# Planner Premium + PDS Sync Tool (<https://www.projectdata.io/sync>)

Marketing Campaign - Project Professional

File Task Resource Report Project View Help pdms.io Gantt Chart Format Tell me what you want to do

Build Team Help Center app.pdms.io Synchronization Settings Synchronization About Help and Support

Project for the Web

Timeline: Today, May '22, Jun '22, Jul '22, Aug '22, Sep '22, Oct '22, Nov '22, Dec '22, Jan '23

Tasks: Review Business Strategy (Mon 4/4/22 - Tue 5/10/22), Develop Campaign Concepts (Wed 5/11/22 - Mon 7/18/22), Create (Tue 7/19/22 - ...)

Task Name

Marketing Campaign Planning

- Review Business Strategy Landscape
- Complete SWOT analysis
- Review business model
- Review organizational marketing strategy
- Review local marketing strategy

Timeline: Nov '21, Dec '21, Jan '22, Feb '22, Mar '22, May 1, 2022

pdms.io

Applying Project for the Web task updates

© 2022 WACG Inc. Support

Project Management Dashboard

Copy Project Deactivate Delete Refresh Check Access


Resources Tasks Risks Issues Changes Status

Filters (0) Zoom Go to date Group members

Apr 17 19 20 21 Apr 24 May 1

- Project Request
- Project Management
- Program
- Projects
- Resources
- Reporting
- Projects

- Review Business Strategy Landscape
- Identify service/product gaps and opportu...
- Complete SWOT analysis
- Review business model
- Review organizational marketing strategy
- Review local marketing strategy
- Review global marketing strategy
- Review marketing plan for campaign budget
- Add new task

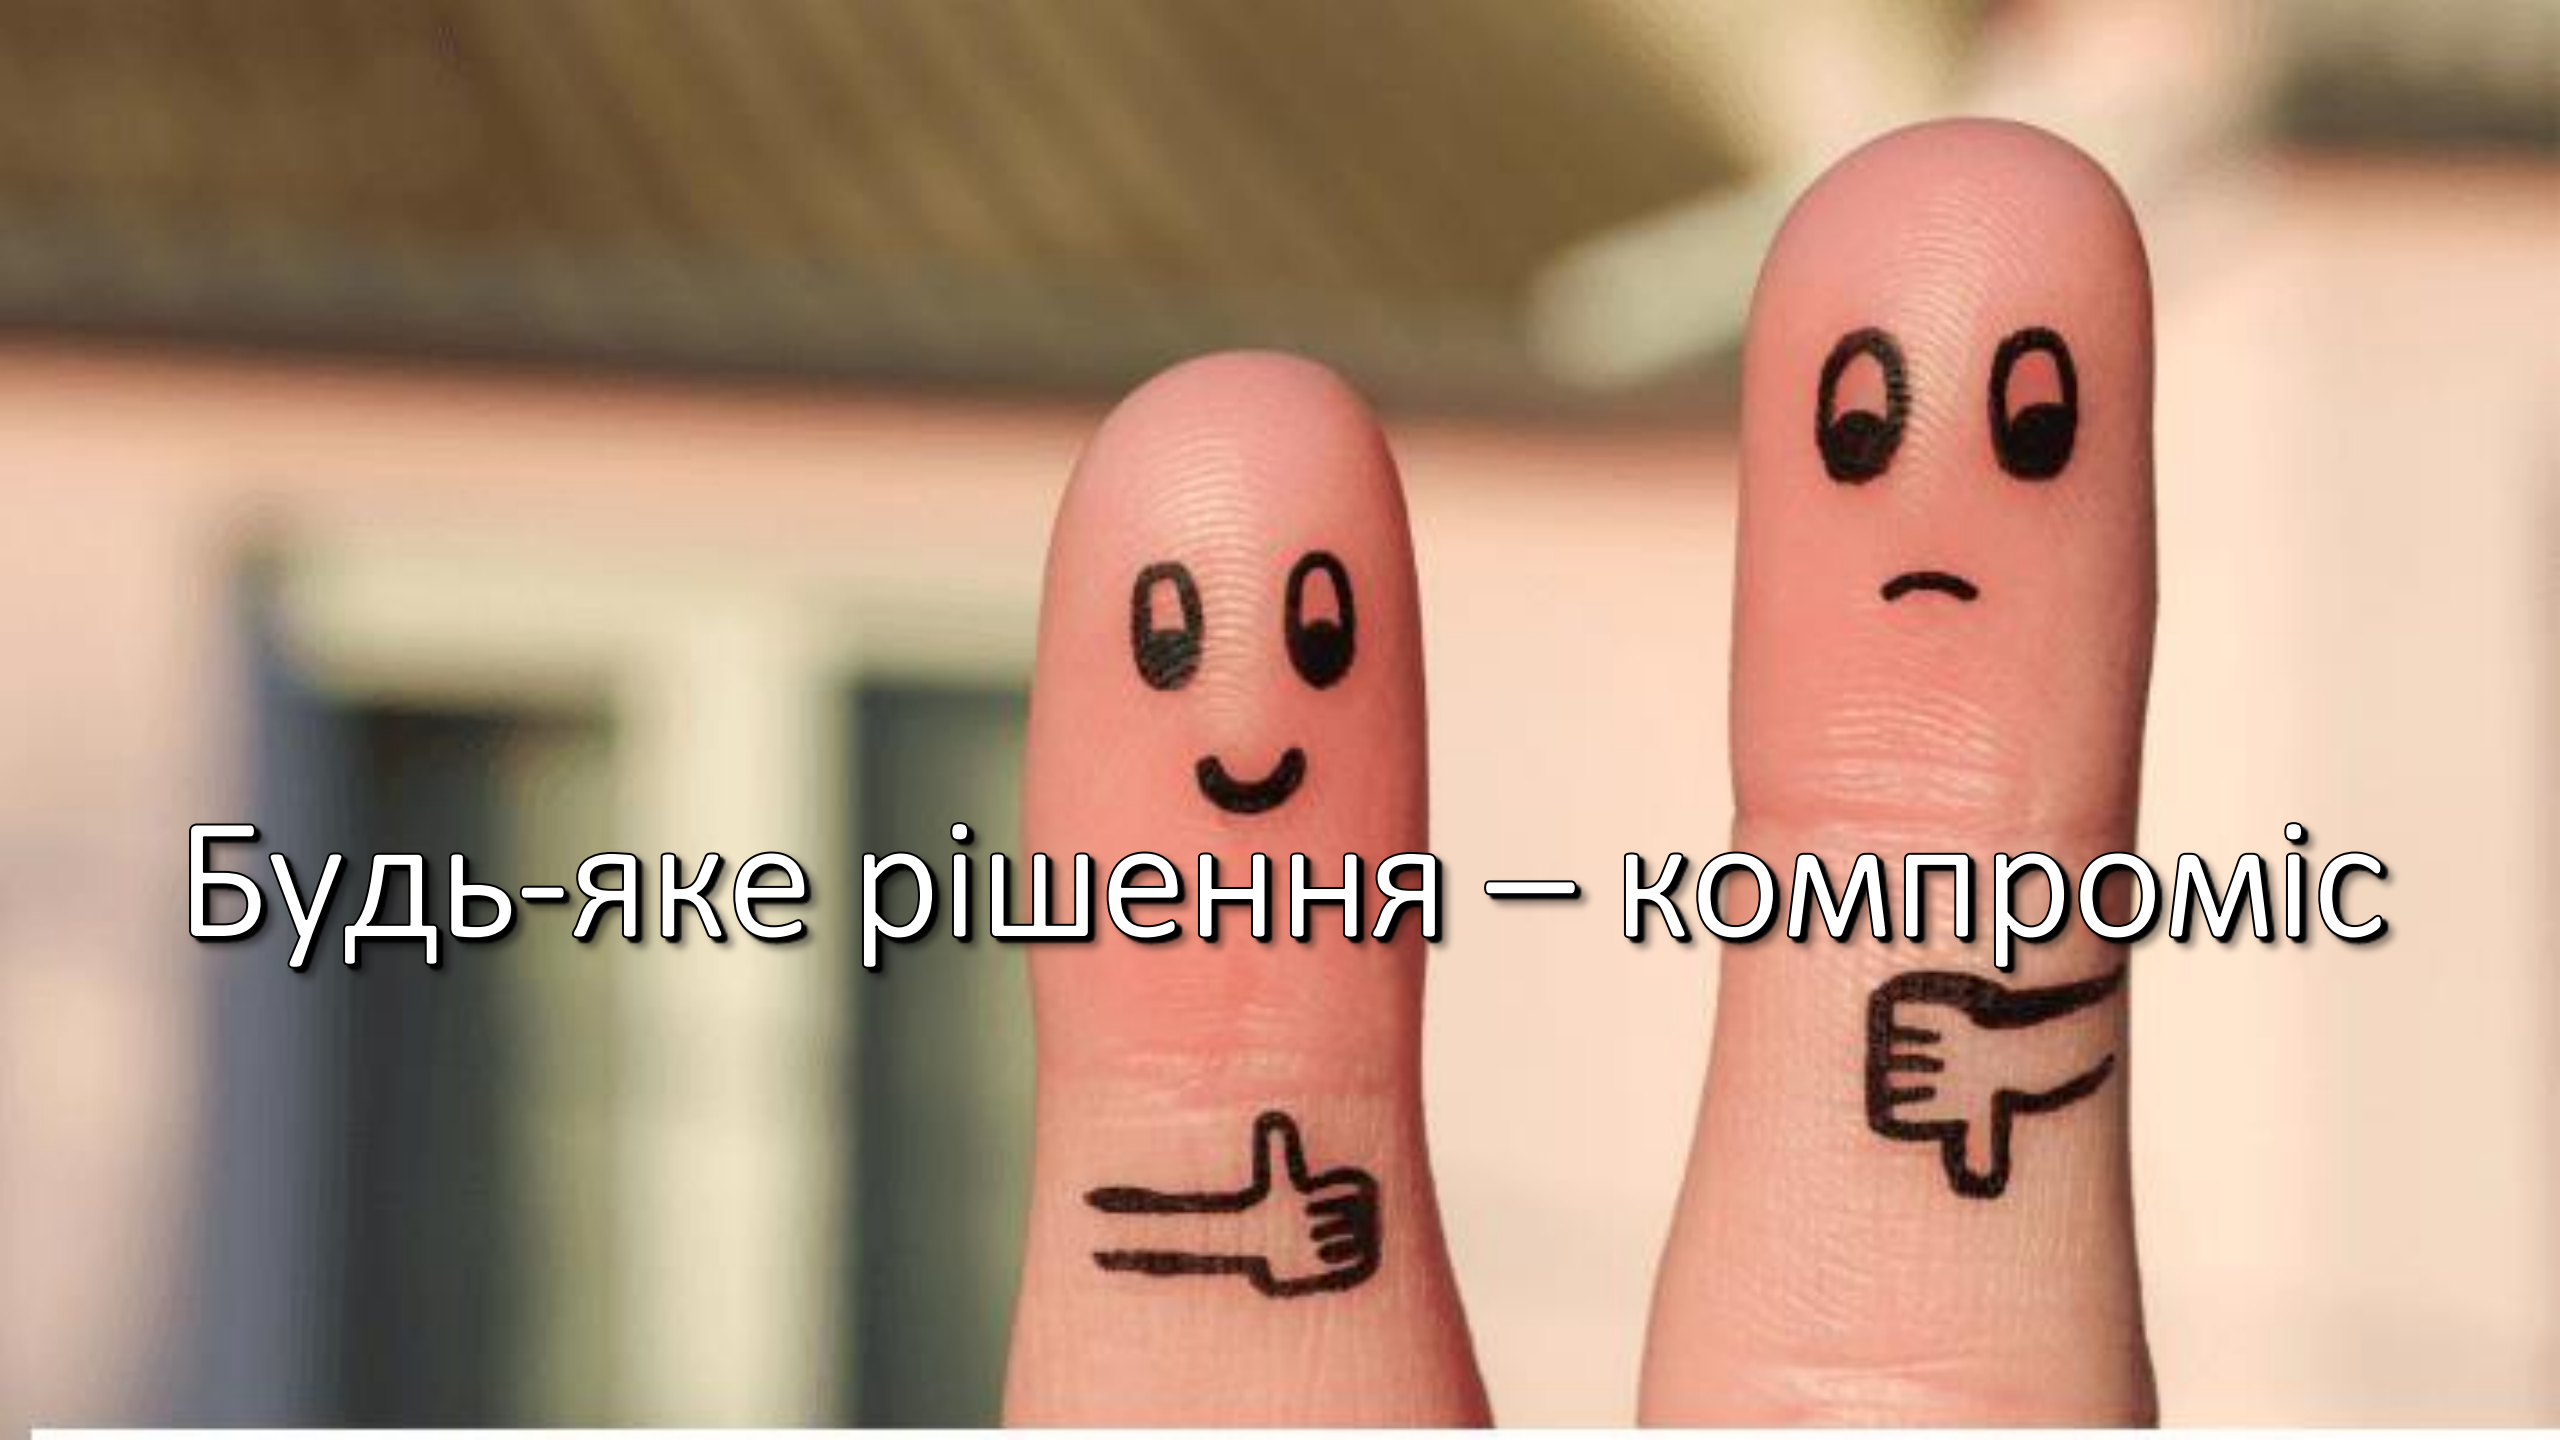A close-up photograph of two human fingers. The left finger has a simple black drawing of a smiling face with two dots for eyes and a curved line for a mouth. Below the face is a black drawing of a hand with the thumb pointing up, representing a 'thumbs up' gesture. The right finger has a simple black drawing of a sad face with two dots for eyes and a downward-curving line for a mouth. Below the face is a black drawing of a hand with the thumb pointing down, representing a 'thumbs down' gesture. The background is a blurred indoor setting.

Будь-яке рішення – компроміс

	<b>Прості проєкти (трудові ресурси)</b>	<b>Тривалі проєкти (трудові ресурси)</b>	<b>Будівельний проєкт</b>	<b>Звітність виконавців</b>
Управління проєктами	Planner Premium	LEO Plan OnePlan Project Server	Microsoft Project + PDS	OnePlan Power PPM Project Operations
Управління проєктами + ідеями + звіти	LEO Plan	LEO Plan Project Server	LEO Plan Microsoft Project + PDS Oracle Primavera	OnePlan Power PPM Project Operations
PPM	LEO PPM Planner Edition LEO PPM Gantt Edition OnePlan Power PPM	LEO PPM Planner Edition LEO PPM Gantt Edition OnePlan Power PPM	LEO Plan Oracle Primavera	OnePlan Power PPM Project Operations





<https://t.me/+JmAXYL7VHxJkMWNi>

Клуб цинічних і  
добрих  
керівників  
проектів



# LEO Consulting

Oleksiy Prosnitskyy  
[mvp@leoconsulting.com.ua](mailto:mvp@leoconsulting.com.ua)  
+38 067 405 4701
