

# Розвиток проєктної культури в Brocard: шлях до переходу на LEO Gantt



# A SKY FULL OF STARS

01.

Сильна культура  
розвитку людей

02.

Проекти ведуть  
не лише РМ

03.

Керівники виростають  
у ролі РМ



project 1

project 2



project 3

project 4





# BROCARD сьогодні — це:

17

проєктів одночасно  
у реалізації

62


користувачі  
в системі

8+

кросфункціональних  
команд

26

активних ініціатив  
у портфелі

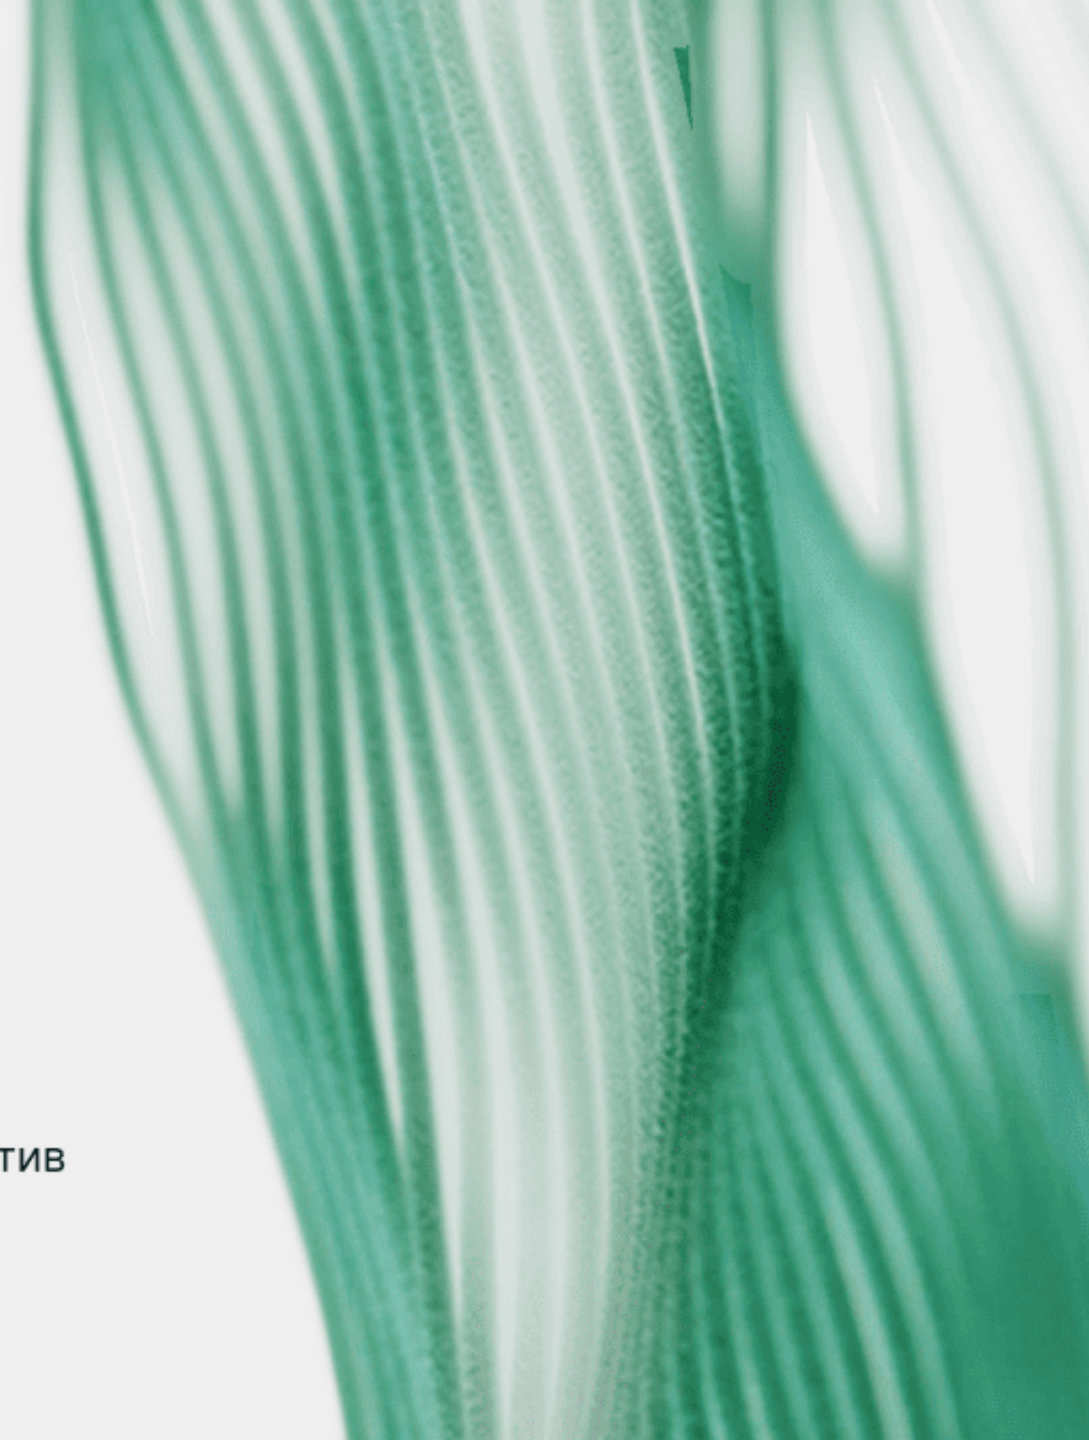

# Еволюція переходу Від LEO PPM до LEO GANTT

Травень 2025

Розгортання LEO PPM  
на проді

Відзнака за  
«Найшвидше  
впровадження»



Червень 2025

Знайомство з  
МОЖЛИВОСТЯМИ  
LEO GANTT

Липень 2025

Тест- драйв у Sandbox

Листопад-грудень 2025

Міграція на LEO GANTT

# Чому ми обрали **LEO GANTT**?



## Ресурсний менеджмент:

Внесення планових та фактичних трудовитрат, автоматичний розрахунок % виконання



## Швидкість старту:

Імпорт планів з Excel та запуск проєкту за 3 кліки через шаблони

## Робочі пакети

Незамінний інструмент для чек-листів при передачі проєкту на підтримку.



# Алгоритм прийняття рішення



Рішення прийнято лише після позитивного відгуку від команди та ключових користувачів.

- ✓ Демонстрація функціонала від LEO Consulting.
- ✓ Самостійне тестування малою групою.
- ✓ Сценарне тестування з ключовими користувачами та збір фідбеку.
- ✓ Фінансовий аналіз (ліцензія LEO RPM без обмежень по користувачам)



# Міграція у «високий сезон»



**Листопад:** Аудит середовищ (4 шт., 4 ГБ), вирівнювання даних



**Грудень:** Активна фаза міграції логіки та автоматизацій.

Запуск:

Навчання техкоманди

Навчання користувачів

Go-Live

Блокування доступів до старого середовища LEO PPM



Перенесли 24 проекти та 42 ініціативи фактично за добу (Впроваджено без зупинки бізнес-процесів)



24 проекти  
24 години



# До впровадження

## до впровадження

- ✗ 2 тижні на підготовку до ПК
- ✗ Ручний запуск проєктів
- ✗ Використання Excel
- ✗ 80% часу на збір інформації



## LEO GANTT

- ✓ кілька годин
- ✓ автоматизація з допомогою шаблонів
- ✓ єдина система ведення проєктів
- ✓ фокус на управління






# Вивчені уроки

## Технічні нюанси:




- ⚠ Особливості збереження базових планів
- ⚠ Критичність заповнення дат
- ⚠ Потреба у переналаштуванні звітів Power BI
- ⚠ Косметичні правки - коректність перекладів та адаптація під внутрішні процеси

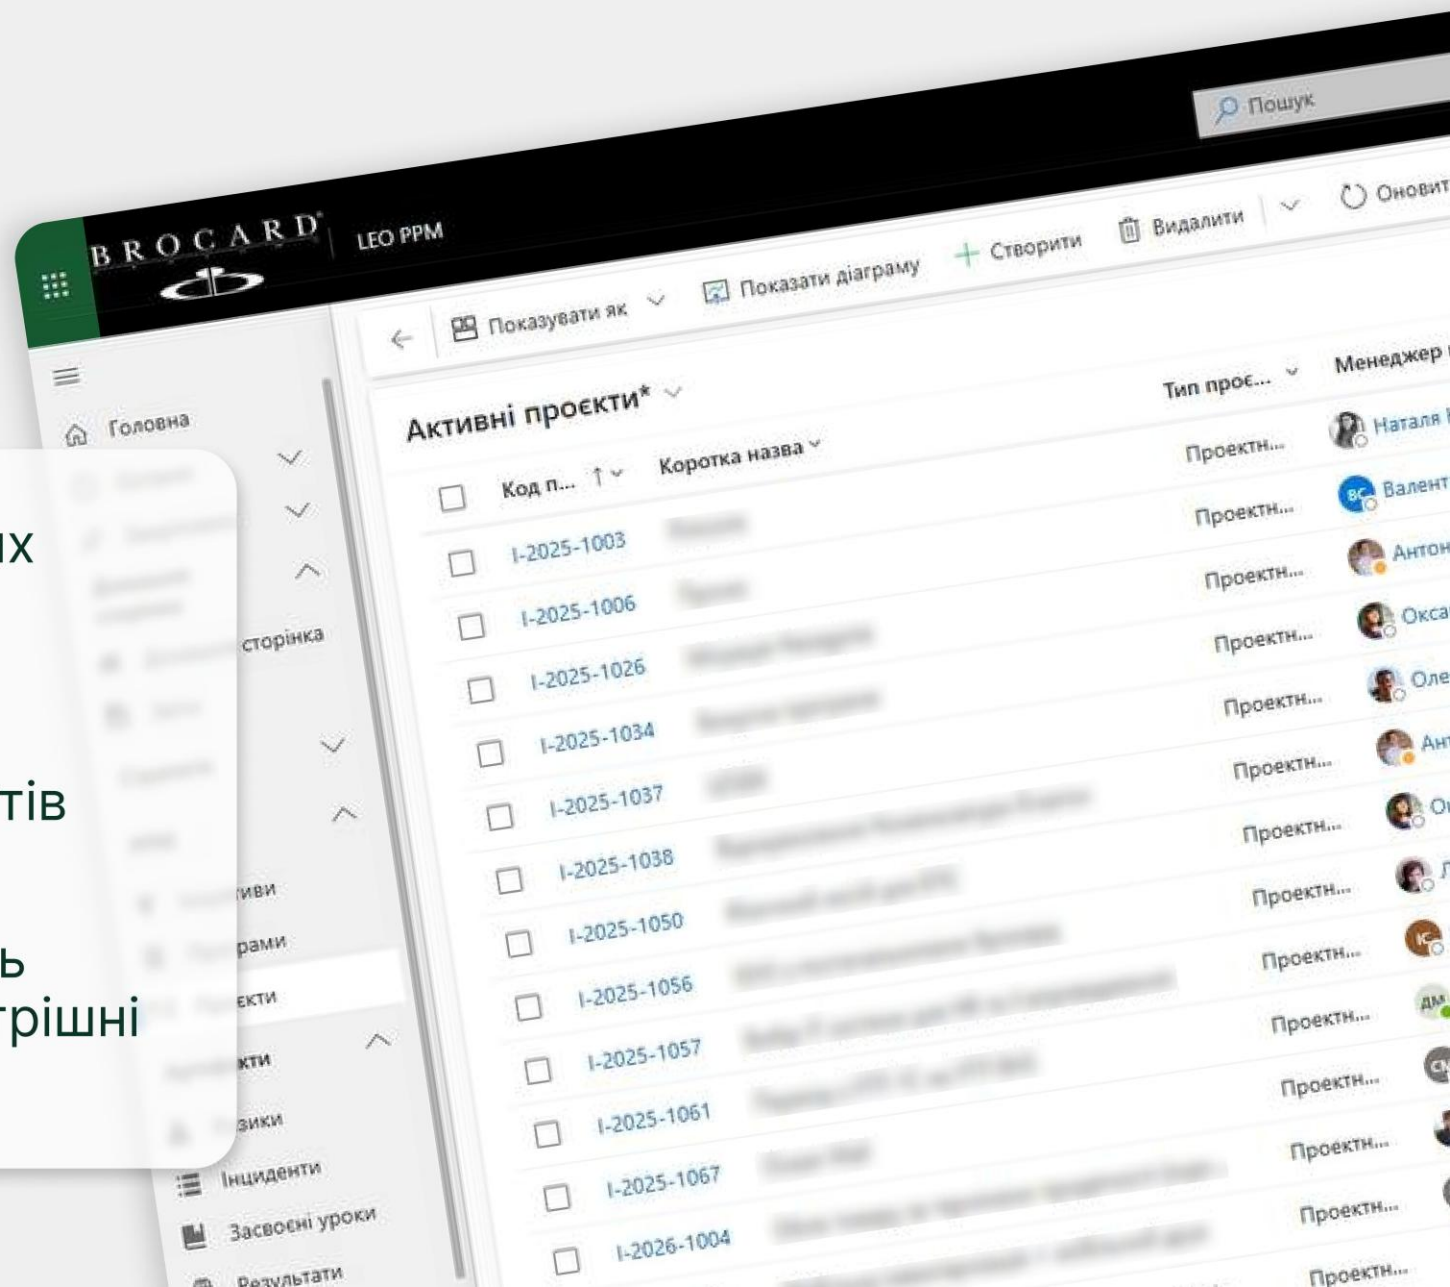

# На що звернути увагу

Три кити міграції



Команда



Гігієна даних



Безпека



І найосновніше - Партнер: важливо мати надійну підтримку

# Погляд у майбутнє та висновки

Система будує шлях, але Культура — це основа, яка визначає, як далеко ми зайдемо.





# Дякуємо



**PM-команді BROCARD**  
за витривалість



**LEO Consulting** за  
партнерство та увагу  
до наших побажань
