

16 листопада

Київ, Unit.City

online&offline

Project Conference

Як відслідкувати
реалізацію
стратегії?





PROJECT CONFERENCE 2020



MERCURE CONGRESS CENTRE,
М. КИЇВ, ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 6



06/03



LEO CONSULTING



Центр компетенцій в Україні з управління проектами та Microsoft Project

<https://leoconsulting.com.ua>

13

Years
of work

75

Implemented
projects

38

Conferences
and clubs

300

Articles

9

Books and
self-readers


105

Companies





sense bank



acino





Олексій Просніцький

Співзасновник LEO Consulting

Співзасновник PRO PM

Автор книг з Microsoft Project

Методолог впроваджень РМО та цифровізації
десятків компаній України

Член журі з вибору найкращого РМО в Україні

Член журі з вибору найкращого РМ в Україні

Організатор 14 конференцій з управління
проектами

Організатор 26 клубів «Цинічних та добрих
керівників проектів»


Microsoft MVP 2011-2024

PMP 2009-2024

PgMP 2024-2027



Most Valuable Professional
Celebrating 20 Years

Richard Kaplan
Richard Kaplan
Corp. Vice President,
Customer &
Partner Advocacy



Mike Hickman
Mike Hickman
Director,
Community &
Online Support

Oleksiy Prosnitskiy
Project
April 1st, 2013

 We recognize and value your exceptional contributions and commitment to technical communities worldwide. By sharing your real world expertise and technical skills, you demonstrate outstanding technical community leadership. Thank you. 



Project Management Institute.

THIS IS TO CERTIFY THAT

Alexei Prosnitskiy

HAS BEEN FORMALLY EVALUATED FOR DEMONSTRATED EXPERIENCE, KNOWLEDGE AND PERFORMANCE IN ACHIEVING AN ORGANIZATIONAL OBJECTIVE THROUGH DEFINING AND OVERSEEING PROJECTS AND RESOURCES AND IS HEREBY BESTOWED THE GLOBAL CREDENTIAL

Project Management Professional (PMP)®

IN TESTIMONY WHEREOF, WE HAVE SUBSCRIBED OUR SIGNATURES UNDER THE SEAL OF THE INSTITUTE

Luann Picard
Luann Picard, PMP | Chair, Board of Directors



Pierre Le Moth
Pierre Le Moth | President & CEO

PMP# Number: 1212929 PMP# Original Grant Date: 23 April 2009 PMP# Expiration Date: 23 April 2027



Project Management Institute.

THIS IS TO CERTIFY THAT

Oleksiy Prosnitskiy

HAS BEEN FORMALLY EVALUATED FOR EXPERIENCE, KNOWLEDGE AND PERFORMANCE OF PROGRAM MANAGEMENT AND IS HEREBY BESTOWED THE GLOBAL CREDENTIAL

Program Management Professional (PgMP)®


IN TESTIMONY WHEREOF, WE HAVE SUBSCRIBED OUR SIGNATURES UNDER THE SEAL OF THE INSTITUTE

Luann Picard
Luann Picard, PMP | Chair, Board of Directors



Pierre Le Moth
Pierre Le Moth | President & CEO

PgMP# Number: 3844100 PgMP# Original Grant Date: 22 May 2024 PgMP# Expiration Date: 22 May 2027

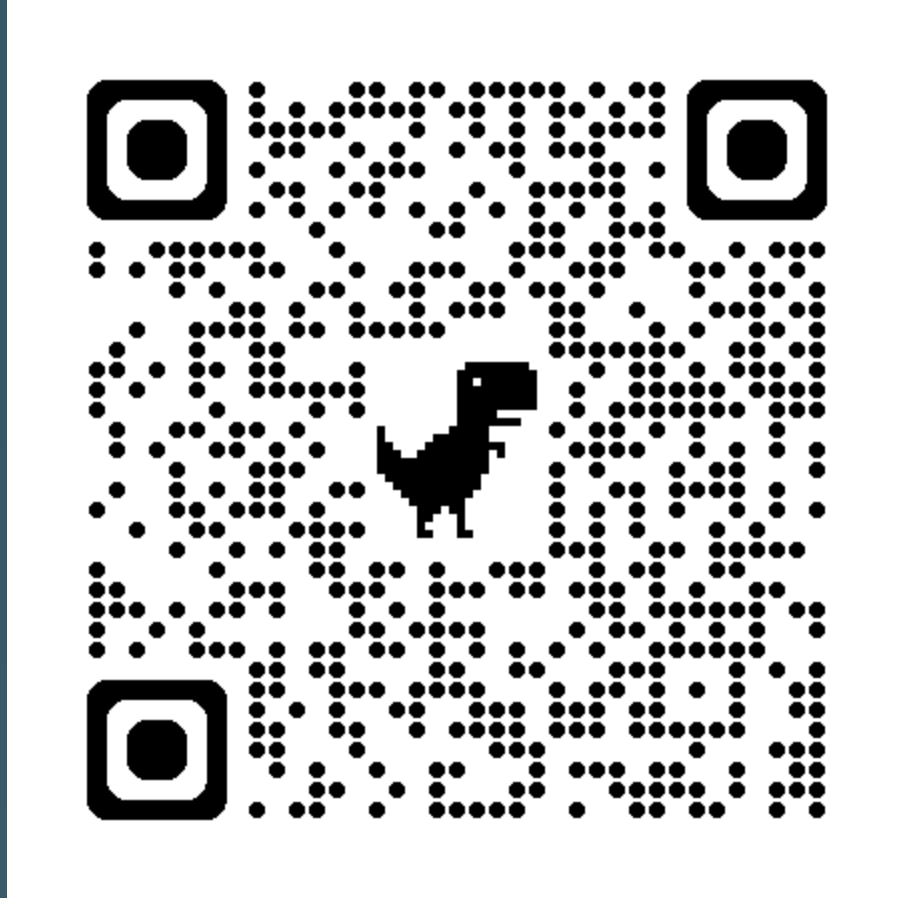

Олексій
Просніцький

ЯК
НЕ
ПРО ІТИ
ПРОЄКТ

формат

IT інструменти
реалізації стратегії компанії

Інструменти управління проектами



Управління термінами
Управління ресурсами
Управління вартістю

Управління змістом
Управління комунікацією



Requirements

2019



Project Management
Office



Strategic Portfolio
Management Office

92%

of managers asked by Forbes insights
perceives the PMO function as the
driving power when organizations are
transforming digitally

2019



Project and Portfolio Management (PPM)



Strategic Portfolio Management (SPM)

92%

of managers asked by Forbes insights perceives the PMO function as the driving power when organizations are transforming digitally



Gartner визначає стратегічне управління портфелем (SPM) як набір бізнес-можливостей, процесів і допоміжних технологій управління портфелем з акцентом на досягненні стратегічних цілей



SRM ЯК ТЕХНОЛОГІЯ

Парасолька та хаб для
різних інструментів

Контроль реалізації стратегії

Підтримка OKR

Управління ідеями/запитами

Управління портфелями

Управління програмами

Інтеграція різних PMIS

Централізація з децентралізацією

Робота з артефактами



Requirements

An overhead view of a business meeting around a large, light-colored conference table. There are 12 people seated around the table, each with a white chair. The participants are engaged in various activities: some are looking at documents, some are using tablets, and some are talking. The table is cluttered with papers, pens, coffee cups, and other office supplies. The background is a wooden floor.

Стратегічні сесії або бла-бла-бла

Планування

Аналіз As-Is

Встановлення
цілей

Формування
переліку проектів



- «Установка» на впровадження



Формування
переліку проектів



1. Змінити підходи управління
2. Започаткувати в компанії культуру новаторства та генерації ідей
3. Зрозуміти спроможність компанії
4. Визначити відповідальних за майбутні створені продукти
5. Впровадити критерії вибору найкращих ідей
6. Реалізувати проекти
7. Оберігати проекти від ризиків та управляти змінами
8. Почати відслідковувати прогрес досягнення стратегічних цілей
9. Адаптуватися, реагувати та бути проактивним

1. Змінити підходи управління
2. Започаткувати в компанії культуру новаторства та генерації ідей
3. Зрозуміти спроможність компанії
4. Визначити відповідальних за майбутні створені продукти
5. Впровадити критерії вибору найкращих ідей
6. Реалізувати проекти
7. Оберігати проекти від ризиків та управляти змінами
8. Почати відслідковувати прогрес досягнення стратегічних цілей
9. Адаптуватися, реагувати, бути проактивним

Контроль реалізації стратегії

Підтримка OKR

Управління ідеями/запитами

Управління портфелями

Управління програмами

Інтеграція різних PMIS

Централізація з децентралізацією

Робота з артефактами



Requirements

- OnePlan, США
- Power PPM, Данія
- LEO PPM, Україна
- ~~Microsoft Project (Online/Server), США~~

Можливості OnePlan & Power PPM & LEO PPM

Стратегія

Портфель

Програми

Проекти

Ініціативи

Фінанси

OKR

Ризики

Зміни

Ресурси

Стейкхолдери

Продукти

Вигоди

База знань

Документи

Графіки

Інтеграції

Звіти

Шаблони

Тренди

2020

MODUS X


[Product](#) ▾[Solutions](#) ▾[Customer Success](#) ▾[Resources](#) ▾[About Us](#)[Pricing](#)[Login](#)[Contact](#)[Try OnePlan](#)

Microsoft Enhance Your Microsoft Platform Investment

OnePlan is a Microsoft Gold Partner and has been recognized for 5 consecutive years as a Global PPM leader. Our solutions are specifically designed to work seamlessly in any Microsoft platform, leveraging the unique capabilities and UI of each to provide a complete and seamless user experience. One Interface, One Experience, OnePlan.

Built on the MSFT cloud, scalable, secure, seamless experience, more value out of existing tools/investment, adoption.

[Learn More](#) →

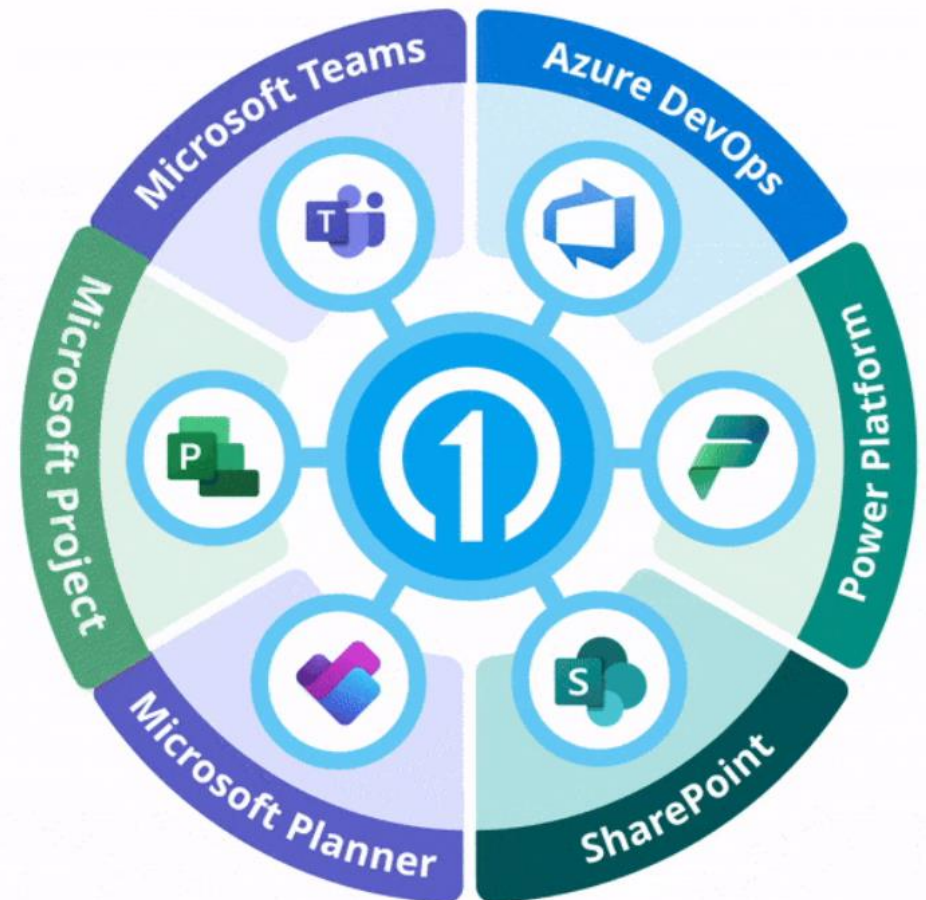

OnePlan

Strategy

Stakeholders



OKRs



Enterprise Architecture




Ideation / Requests

Planning

Portfolio Managers




Portfolio Planning



Capacity Planning



Financial Planning



What-if Scenario Modeling

Execution

Plan Managers



Work Plan



Agile Plan



Issues



Risks



Changes

Resource Managers

Resource Planning

Resource Negotiation

Team Members

My Work

Timesheets

Analysis

Executives




Status Reports



Dashboards



Visualizations







- > Products
- > Applications
- > Services
- > Business Value
- > Benefits
- > Realization

OKR ієрархія

OnePlan											
Search											
LEO DEMO											
Oleksiy Prosnitskyy LEO CONSULTING											
My Strategy											
List Board Roadmap Dashboard											
Plan Type: Objective Filter Columns Group By: None Row Height Objective Compliance											
	Plan Type	Name	Compliance	Governance Pr...	Governance W...	Status	Estimated End	Current Metric	Business Unit		
+	Objective	LEO PPM V2 (1)	100%	0	0	(1) On Track		53%	IT		
	Key Result	Add GCH	100%	0	0	(1) On Track		53%	IT		
+	Objective	Launch The New Product Successfully (3)	100%	0	0	(1) On Track	31/12/2022	52%	Product Develop		
	Key Result	Create 20 customer case studies	50%	1.00	0	(1) On Track	01/10/2022	5%	Marketing		
	Key Result	Get into the Gartner Magic Quadrant	50%	1.00	0	(1) On Track	01/07/2022	75%	Marketing		
	Key Result	Win a "Best Product of the Year" award at the industry conference	50%	1.00	0	(1) On Track	01/01/2023	75%	Marketing		
+	Objective	Improve Customer Excellence (4)	100%	0	0	(1) On Track	31/12/2022	78%	IT		
	Key Result	Achieve NPS of 9 from our customers	50%	1.00	0	(2) At Risk	30/10/2022	89%	IT		
	Key Result	Increase Customer Retention to 98%	50%	1.00	0	(1) On Track	01/10/2023	81%	Marketing		
	Key Result	Achieve a product engagement of 80% WAU	50%	1.00	0	(3) Off Track	01/10/2022	69%	Product Develop		
	Key Result	Interview 20 Customers and get Feedback	50%	1.00	0	(1) On Track	01/01/2023	75%	Product Develop		
+	Objective	Transform Corporate Culture (4)	100%	0	0	(1) On Track	31/12/2022	37%	IT		
+	Objective	Generate More Marketing Qualified Leads (4)	100%	0	0	(2) At Risk	30/09/2022	43%	Marketing		
+	Objective	Launch a New Customer Community (2)	100%	0	0	(1) On Track	30/09/2022	47%	Product Develop		

Objective

OnePlan LEO DEMO    Oleksiy Prosnitskyy LEO CONSULTING 

My Strategy List Board Roadmap Dashboard

Objective Prioritization

Strategic Alignment:	Extreme	Lower Cost:	Moderate
Improve Employee Retent...	Strong	Risk Reduction:	Strong
		Prioritization Score:	75

Key Results

Key Results:

- + New Item

Name

- Create 20 customer case studies
- Get into the Gartner Magic Quadrant
- Win a "Best Product of the Year" award at the industry conference

Associated Plans

Associated Items:

- + New Item
- + Existing Item

Name

Key Result

OnePlan Search LEO DEMO Oleksiy Prosnitskyy LEO CONSULTING

Create 20 customer case studies

Details Work Plan Reporting

Proposed Active Closed

Key Result Information

Name:	Create 20 customer case studies	Lead:	
Objective:	Launch The New Product Successfully	Priority:	(2) Medium
State:	Active	Business Unit:	Marketing
Status:	(1) On Track	Estimated End:	01/10/2022
Plan Budget:	0		

Key Result Metric

Metric:	#	Current Number:	1	Target Number:	20
	No Metric			Current Metric:	5%

Key Result Description

%
\$

Step: Closed
Status: Not Started

MODERN SOLUTIONS AND PRODUCTS

FOR MICROSOFT POWER PLATFORM

projectum

POWER PPM



A comprehensive and modern solution for strategy and project execution. Built entirely on the Microsoft Power Platform following best practices and available from Microsoft Teams natively.

Power PPM supports all delivery models from Scaled Agile, Hybrid to Traditional. With the future deprecation of Microsoft Project Online, this is the modern alternative allowing customers to migrate to a future proof Power Platform environment.

TEAM PLANNER



Backed up by thousands of users from some of the largest enterprise companies, this solution allows any team member or manager, to balance, allocate and improve their resource workload and efficiency.

Team Planner has been designed to assist matrix style organizations with a simplified digital handshake and process between Project and Resource Managers to ensure real-time capacity and demand insights available to the organization.

TIME FOR TEAMS



A simple and user-friendly solution for time sheeting. Built on Microsoft Azure and made available through Microsoft Teams, this solution ensures quick time sheeting with high user satisfaction.

Time connects to any data source, and only requires users to be licenses with any O365 subscription. Time is designed by team members for team members to ensure the best user adoption curve.

PRESENT IT



Export data in real time to predefined Word or Power Point templates. Combine data, work with lists, generate charts and save time.

Present IT is a Power Automate solution for any company or Microsoft partner in need of a better reporting experience.

POWER HUB



A database as a service allowing customers to import and snapshot critical financial, task, resource and project portfolio data.


With Power Hub enabled in Azure, organizations can monitor how data has changed over time, thereby allowing for trend and forecasting analysis to driver better management decisions

Search

← 📄 📁 💾 Save 📄 Save & Close ➕ New 🚫 Deactivate 🗑️ Delete 🔄 Refresh 🔍 Check Access 📄 Process 👤 Assign 📄 Flow 📄 Word Templates 📄 Run Report 🔗 Share


ASR Program - Saved 10 % Complete Dupco Partner Modified By 2/7/2024 3:14 PM Modified On 12 # of Initiatives

Details Timeline Financials Initiatives Risks Dependencies Stakeholders Dashboard

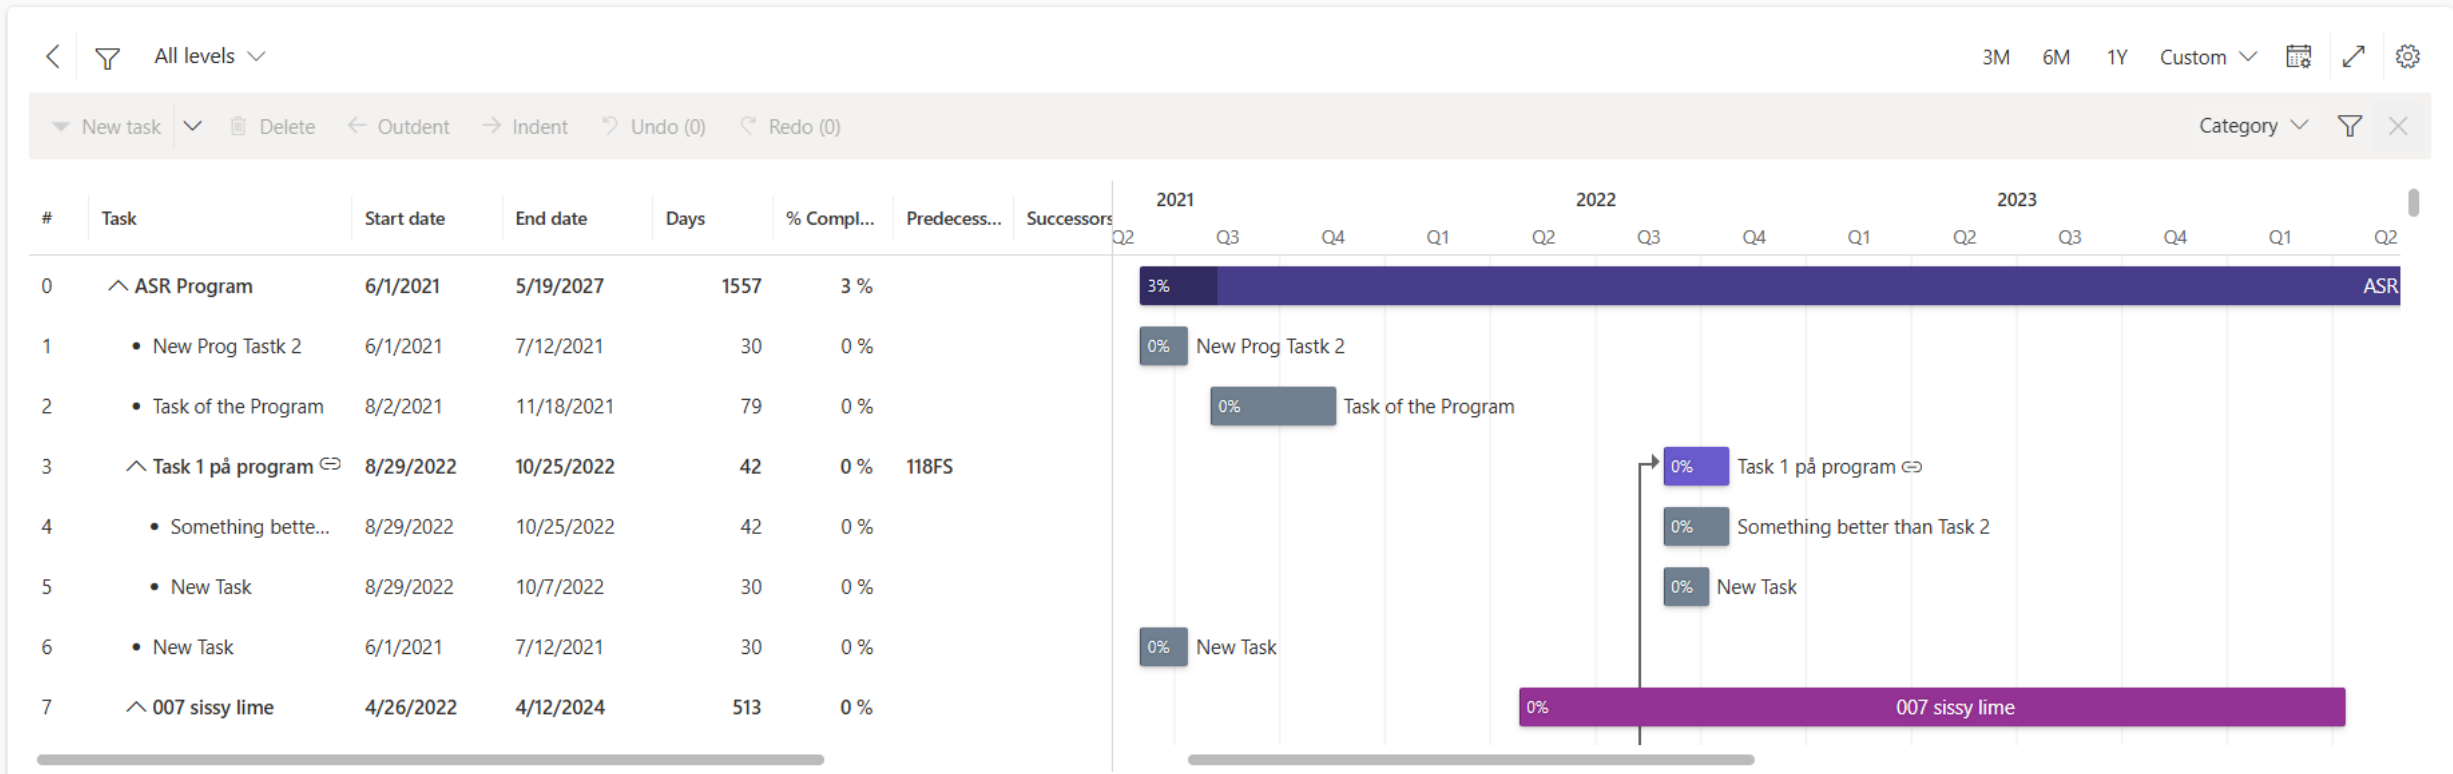



Team Planner



projectum




- Aktivitet
- Chat
- Teams
- Kalender
- Opkald
- Filer
- Time
- Team Plann...
- ...
- Apps
- Hjælp

	2021										2022									
	feb	mar	apr	may	jun	jul	aug	sep	oct	nov	dec	jan	feb	mar	apr	may	jun	jul	aug	sep
	Total		5-9 Feb 2021		9-13 Mar 2021		13-17 Apr 2021		17-22 May 2021		22-26 Jun 2021									
	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R									
Implement Dynamics Sales Insi...	210,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	55,00	0,00	50,00	0,00	35,00									
Projectum.Denmark.Team ...	100,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00									
Projectum.Denmark...	100,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00									
Team PHB - Product Mana...	50,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00									
Team PHB - Product...	50,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00									
Team PHB - Team Lead	50,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	10,00	0,00	0,00									
Team PHB - Team L...	50,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	10,00	0,00	0,00									
Team Projectum - Project ...	10,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00									
Team Projectum - P...	10,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00									

Sat Aug 14 2021 — Tue Sep 14 2021

Christian Fannin...

Time for Teams



Person	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	Total	Submitted	Submitted By	Reply	Approve
13-19 Sep (4)												
Christian Fanning (global admin)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Christian Fanni...	Jes Allersted		Not Created
Christian Holse Fanning	8.00	7.50	7.50	8.00	9.00	0.00	0.00	40.00	Christian Holse...	Jes Allersted		Open
Dariana C. Kestenholz	0.00								Dariana C. Kest...	Jes Allersted		Not Created
Morten Mencke	0.00								Morten Mencke	Jes Allersted		Not Created
6-12 Sep (4)												
Christian Fanning (global admin)	0.00								Christian Fanni...	Jes Allersted		Not Created
Christian Holse Fanning	0.00								Christian Holse...	Jes Allersted		Open
Dariana C. Kestenholz	0.00								Dariana C. Kest...	Jes Allersted		Not Created
Morten Mencke	0.00								Morten Mencke	Jes Allersted		Not Created
1-7 Sep (4)												
Christian Fanning (global admin)	0.00								Christian Fanni...	Jes Allersted		Not Created
Christian Holse Fanning	0.00								Christian Holse...	Jes Allersted		Open
Dariana C. Kestenholz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dariana C. Kest...	Jes Allersted		Not Created
Morten Mencke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Morten Mencke	Jes Allersted		Open
30-5 Sep (4)												
Christian Fanning (global admin)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Christian Fanni...	Jes Allersted		Not Created
Christian Holse Fanning	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	Christian Holse...	Jes Allersted		Open
Dariana C. Kestenholz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dariana C. Kest...	Jes Allersted		Not Created


Details

Project/Task	Hours	Comments
Bountiful Agriculture Monitoring System (1)		
Development	30.00	
Continues Process Improvements (1)		
Identify	5.00	
Business Operations (1)		
Support	3.00	
Digital Cashier (1)		
Online ticket booking	2.00	

Jes Allersted (Change user)

LEO PPM

Це наш досвід, квінтесенція знань про управління портфелем, програмами та проектами та реалізацію стратегії в налаштованому інструменті

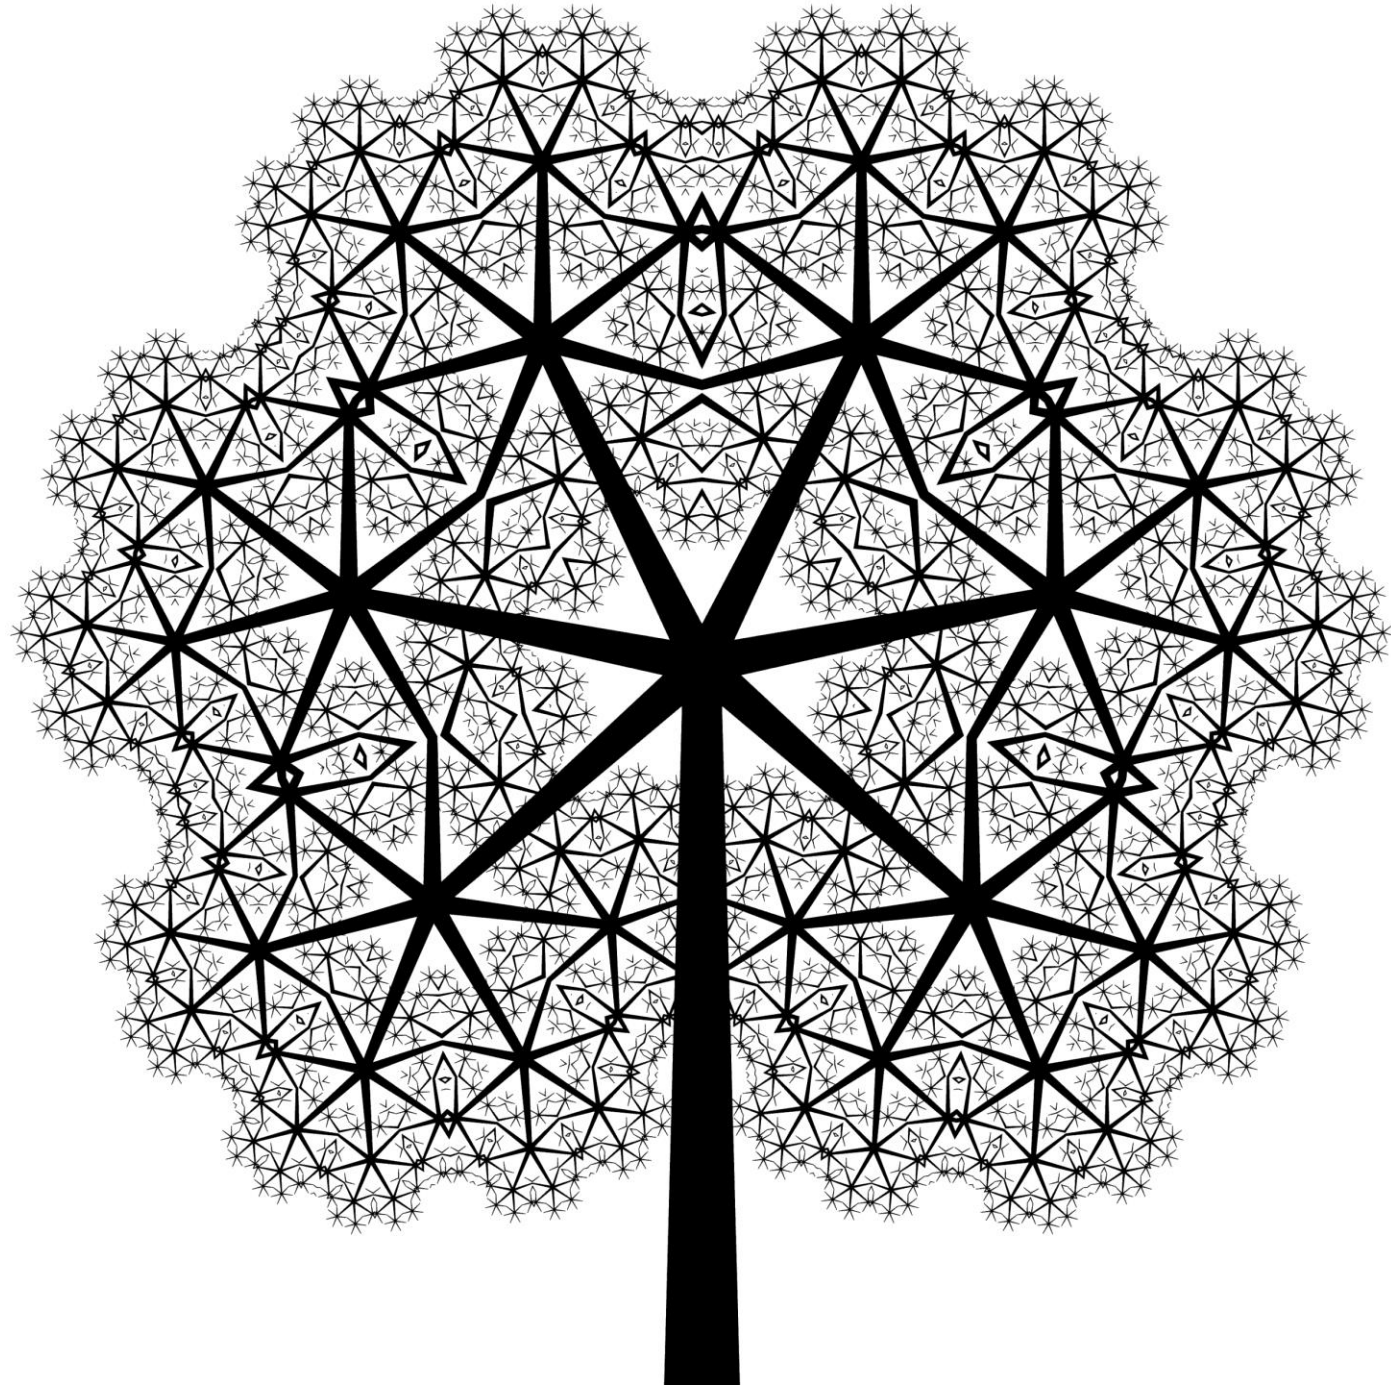

TAS Agro



acino

КОВАЛЬСЬКА

ДАРНИЦЯ



ЮРІЯ-ФАРМ

Q PARTNERS

енzym



Стратегічні цілі або Pillars

- Home
- Recent
- Pinned
- Home page
- Home
- Strategy
- Reports
- Strategic Pillars
- Objectives
- Key Results
- Dashboards
- PPM
- Project Requests
- Portfolios
- Programs
- Projects
- Artefacts

Show As Show Chart Edit Activate Deactivate Delete Assign Share Email a Link Flow Run Report Word Templates Share

Active Strategic Pillars

Edit columns Edit filters Filter by keyword

Name	Status	Responsible	Priority	Start Date	Expected Finish Date
Клієнт-орієнтовані інновації	New	Daniil Balya (Busy)	High		
Підвищення операційної ефективності	New	Serhii Chekhla (Available)	Critical		
Покращення в продажах	In Progress	Anastasiia Komendant (Off...)	High	12/31/2023	2/23/2025

Name	Objective Status	Objective Progress, %
Вирости в кількості продажів 2024	New	0
Покращення клімату в компанії 2024	Achieved	100
Покращити рівень задоволеності клієнтів 2024	In Progress	0

Rows: 3 Selected: 3

Розширення можливостей співробітників	New	Oleksiy Prosnitskyy (Availa...)	Middle		
Сталий розвиток	New	Serhii Chekhla (Available)	Middle		
Цифрова трансформація	New	Daniil Balya (Busy)	Critical		

Objectives


Покращення клімату в компанії 2024 - Saved

Objective

Achieved
Objective Status

9/9/2024 4:30 AM
Created On

Daniil Balya
Created By

 Daniil Balya
Owner


Summary  Project Requests 

Name * Покращення клімату в компанії 2024


Objective Progress, % 




Description
Через великий стрес багато співробітників потребують тепла і келиха вина перед обідом

Count of Requests  1
Last updated: 11/15/2024 9:19 AM

Progress Trend



Key Results

+ New Key Result  Refresh 

<input type="checkbox"/>	Name	Status	Weight	Measure as	Initial Value	Current Value	Target Value	Progress...
<input type="checkbox"/>	Збільшення долі кавоварок в ...	Achieved	50	% Percenta...	3	10	8	140
<input type="checkbox"/>	Впровадження обов'язкових о...	Achieved	30	# Numerical	4	7	7	100
<input type="checkbox"/>	Встановлення ваз з квітами в ...	Achieved	20	# Numerical	5	15	9	250

Rows: 3

Key Results

Збільшення долі кавоварок в офісі - Saved

Key Result

Achieved
Status

9/12/2024 4:47 AM
Created On

Daniil Balya
Created By



Daniil Balya
Owner


General Related Projects

Name	* Збільшення долі кавоварок в ...	Result Progress	
Measure as	* % Percentage		
Initial Value	* 3	Weight Rate, %	* 50
Current Value	🔒 10	Related Objective	* Покращення клімату в...
Target Value	* 8	Count of Projects	📅 1
Description	---	Last updated:	11/15/2024 9:27 AM

Active Status Reports

Realization Tracker

● (Current Value)



Status Reports

+ New Status Report

<input type="checkbox"/>	Current Value ▾	Report Date ▾	Additional comments ▾	
<input type="checkbox"/>	10	6/25/2025	Коментар Червня	
<input type="checkbox"/>	8	3/27/2025	Коментар березня	
<input type="checkbox"/>	7	9/23/2024	Коментар вересня	
<input type="checkbox"/>	5	8/5/2024	Коментар Серпня	
<input type="checkbox"/>	3	7/1/2024	Коментар Липня	

Реєстр Запитів на проєкт або Ідей

LEO CONSULTING		LEO PPM Demo		Пошук		+		?		+										
Показувати як		Показати діаграму		Створити		Видалити		Оновити		Візуалізувати це пода...		Надіслати посилання		Потік		Створити звіт		Надати спільний доступ		
Активні запити на проєкт		Змінити стовпці		Змінити фільтри		Фільтрування за кл...														
<input type="checkbox"/>	Назва запиту ↑	Власник зап...	Поточна стадія	Статус	Тип запиту на проєкт	ROI, %	Пріоритет запиту проєкту	Проект												
<input type="checkbox"/>	LEO PPM Implementation in A company	Daniil Balya (Д...	New	На погодженні	Розробка нових продуктів	25.00	7													
<input type="checkbox"/>	LEO PPM in Apple Music	Olesia Honcha...	New	Активний	Розробка нових продуктів	30.00	8													
<input type="checkbox"/>	Відбудова моста у Стоянці	Serhii Chekhla ...	Approved	Погоджено	Операційний	50.00	6													
<input type="checkbox"/>	Відкриття відділення в Варшаві	Oleksiy Prosnit...	Analisis	Активний	Розробка нових продуктів	36.36	8													
<input type="checkbox"/>	Впровадження Dynamics 365 Sales	Olesia Honcha...	Analisis	На погодженні	Операційний	30.00	6													
<input type="checkbox"/>	Впровадження бюджетування в компанії	Vitalii Denysov...	On Review	На погодженні	Операційний	66.67	4													
<input type="checkbox"/>	Впровадження в Disney Europe	Olesia Honcha...	Analisis	Погоджено	Операційний	70.00	4													
<input type="checkbox"/>	Зробити сайт підтримки Замовників	Anastasiia Kom...	Analisis	Активний	Маркетинг	100.00	5													
<input type="checkbox"/>	Міграція локального серверу Sharepoint в хм...	Olesia Honcha...	Strategy Alignment	Активний	ІТ	36.00	6													
<input type="checkbox"/>	Новий кампус у м. Ірпінь для айті робітників	Oleksiy Prosnit...		Активний	Розробка нових продуктів															
<input type="checkbox"/>	Організація соціального пакету для співробіт...	Olesia Honcha...		Відхилено	Операційний															
<input type="checkbox"/>	Почати проводити раз на квартал вебінари п...	Anastasiia Kom...		Активний	Маркетинг															
<input type="checkbox"/>	Почати продаж мерчу компанії	Anastasiia Kom...		Активний	Операційний		6													
<input type="checkbox"/>	Редизайн сайту компанії	Larysa Oliinyk		На погодженні	Операційний	100.00	5													

Рядки: 17

Вбудовані звіти Power BI



Дерево стратегічних цілей




🔒 Стратегічні цілі
Підвищити лояльність Зам...

🗖 Портфель ✕
Розробка нового продукту

📄 Проекти ✕
01. Business Central Imple...

📦 Продукти ✕

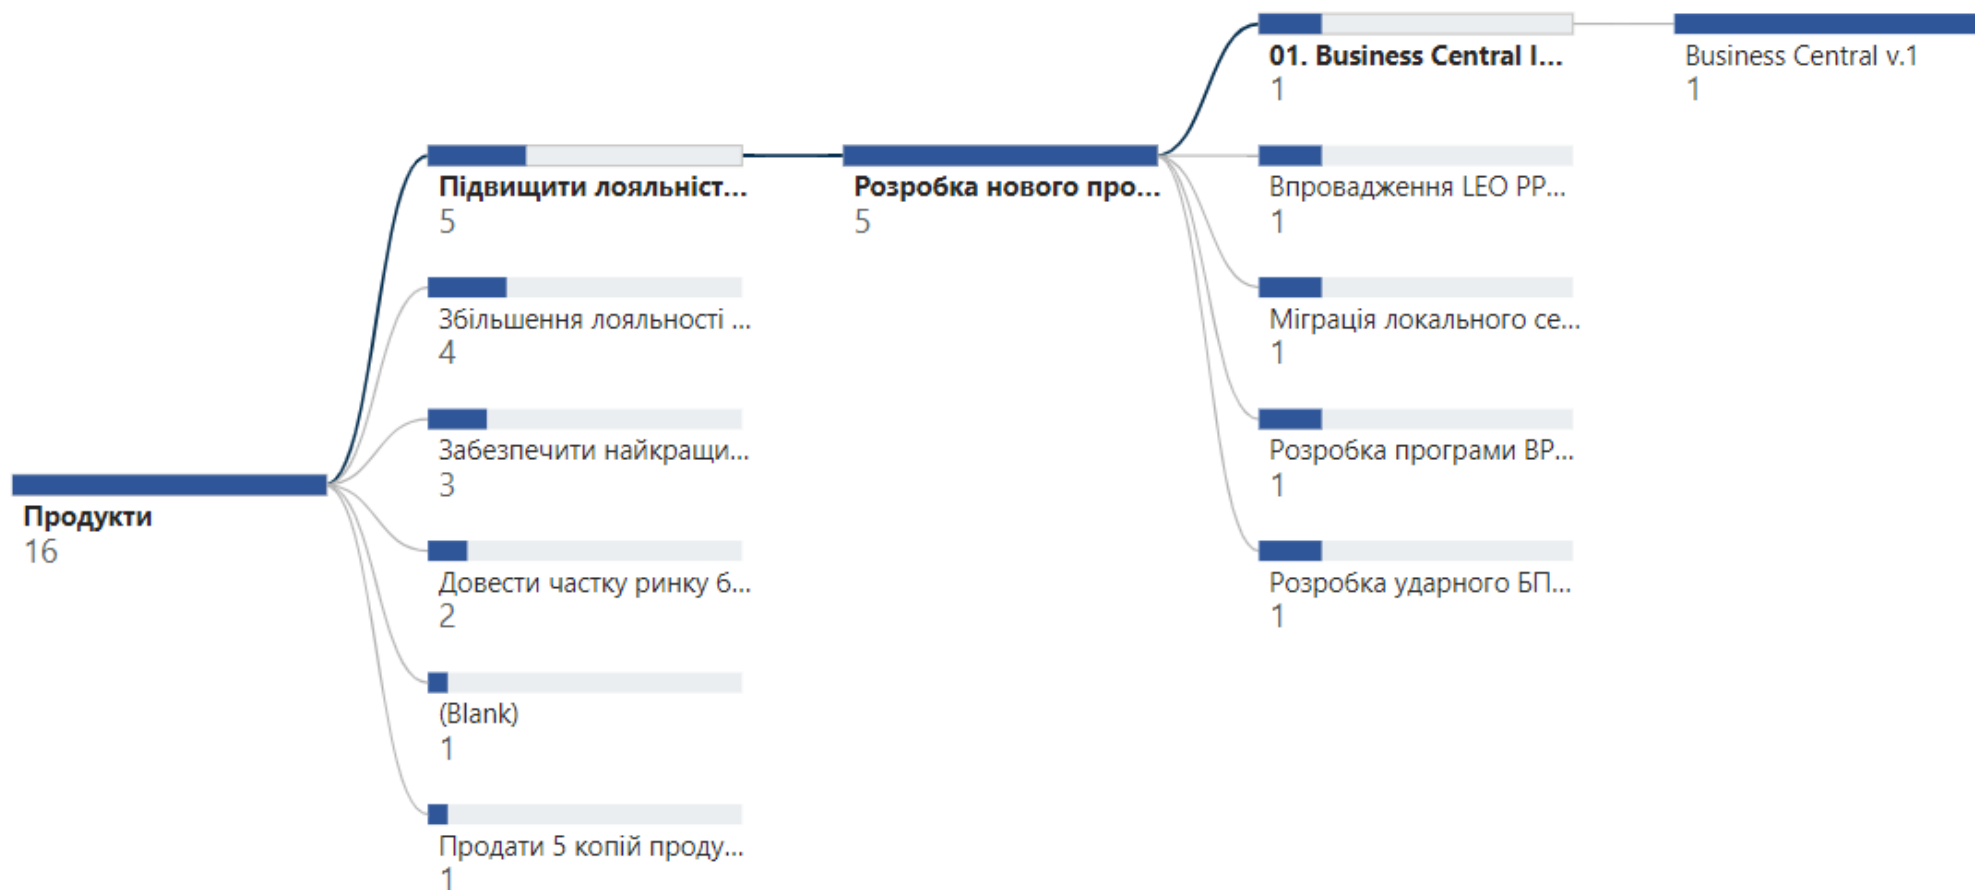

Проекти



Портфель

All


Програма

All


Спонсор

All


Розподіл проектів по типу



Розподіл проектів по стадіям ЖЦ

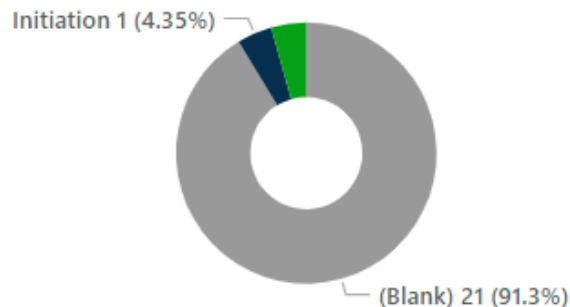

Розподіл проектів по Менеджерам

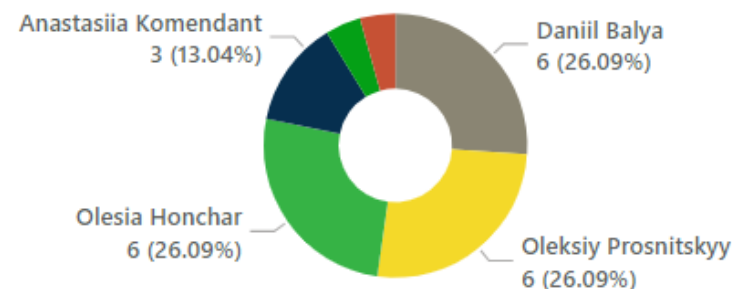


Проект	Стадія ЖЦ	Стан	%	Завдання	Початок	Завершення	Трудовитрати	Project Manager	Спонсор
Business Central Implementation	Initiation	Active	42%	3	16/11/2023	01/03/2024	496	Oleksiy Prosnitskyy	Daniil Balya
Business Central	Closing	Proposed		3	18/01/2023	03/11/2023	78	Olesia Honchar	Yurii Stepanov
Ведення YouTube каналу		Proposed			06/01/2024	06/01/2024		Anastasiia Komendant	Oleksiy Prosnitskyy
Відбудова моста в с. Романівка		Active		3	21/12/2023	01/01/2024	18	Daniil Balya	Serhii Chekhla
Відбудова моста у Стоянці		Active	23%	7	21/12/2023	02/01/2024	430	Daniil Balya	Oleksiy Prosnitskyy
Впровадження Dynamics 365 Sales		Active			16/01/2024	16/01/2024		Olesia Honchar	Oleksiy Prosnitskyy
Впровадження LEO PPM в компанії А		Active	40%	3	02/11/2023	25/12/2023	280	Oleksiy Prosnitskyy	Nataliia Prysukhina
Впровадження в Disney Europe		Active	2%	1	05/01/2024	15/03/2024	400	Oleksiy Prosnitskyy	Olesia Honchar
Котедж №2 220 кв.м.		Active	45%		07/12/2023	23/01/2025	2,600	Daniil Balya	Serhii Chekhla
Котедж №5 135 кв.м.		Active	52%		07/12/2023	06/03/2025	3,072	Daniil Balya	Larysa Oliinyk
Котедж №8 175 кв.м.		On Hold	93%		07/12/2023	03/03/2025	3,037	Daniil Balya	Serhii Chekhla
Котеджне містечко "Аквамарин"		Active		2	21/12/2022	15/02/2023	328	Daniil Balya	Natalia Deren
Котеджне містечко "Зелений острів"		Active			06/01/2024	06/01/2024		Olesia Honchar	Nataliia Prysukhina
Котеджне містечко "Край спокою"		Closed			06/01/2024	06/01/2024		Olesia Honchar	Larysa Oliinyk
Міграція локального серверу Sharepoint в хмару		Active			16/01/2024	16/01/2024		Serhii Chekhla	Oleksiy Prosnitskyy
Організація соціального пакету для співробітників		Active			01/02/2024	01/03/2024	98	Larysa Oliinyk	Oleksiy Prosnitskyy
Проведення конференції з управління проектами		Active			06/01/2024	06/01/2024		Anastasiia Komendant	Daniil Balya




MANKIND'S NEXT STEP WILL BE OUR GREATEST.

A FILM BY CHRISTOPHER NOLAN

INTERSTELLAR

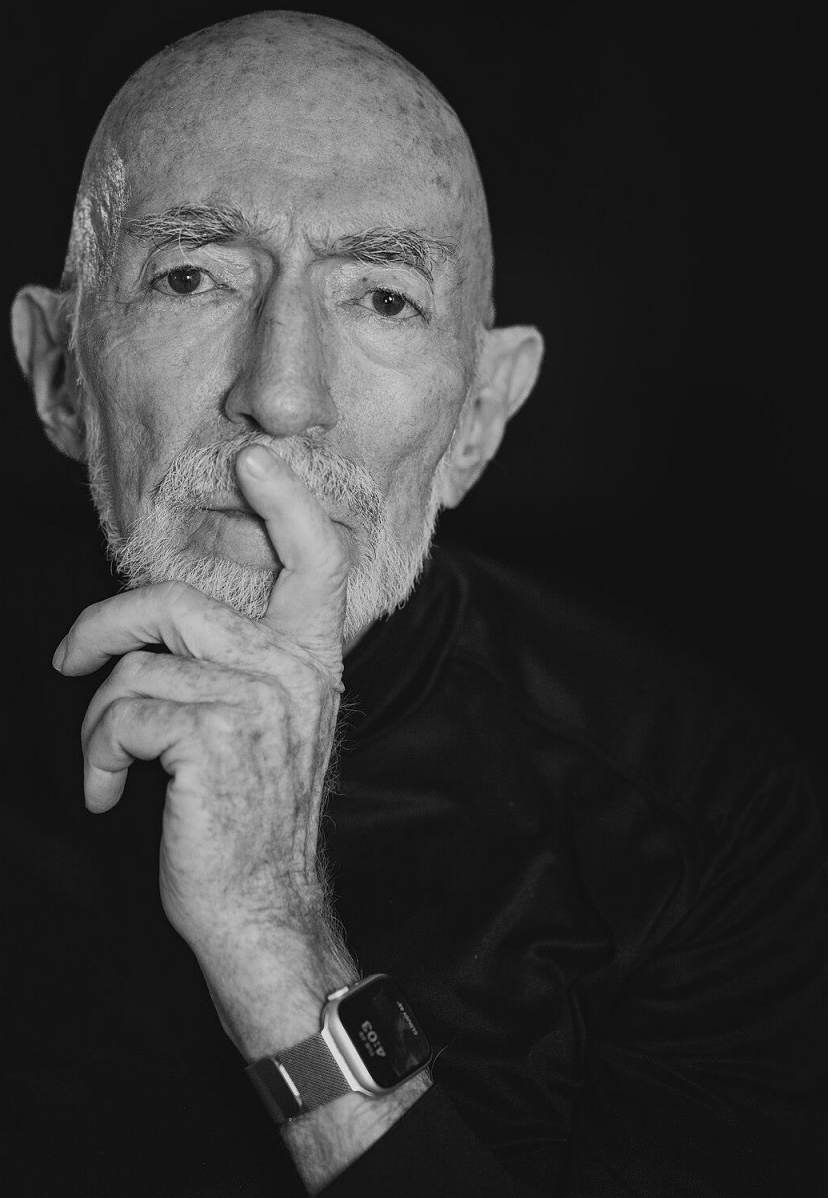


NEW YORK TIMES BESTSELLER



THE
SCIENCE
OF
INTERSTELLAR

KIP THORNE

FOREWORD BY CHRISTOPHER NOLAN

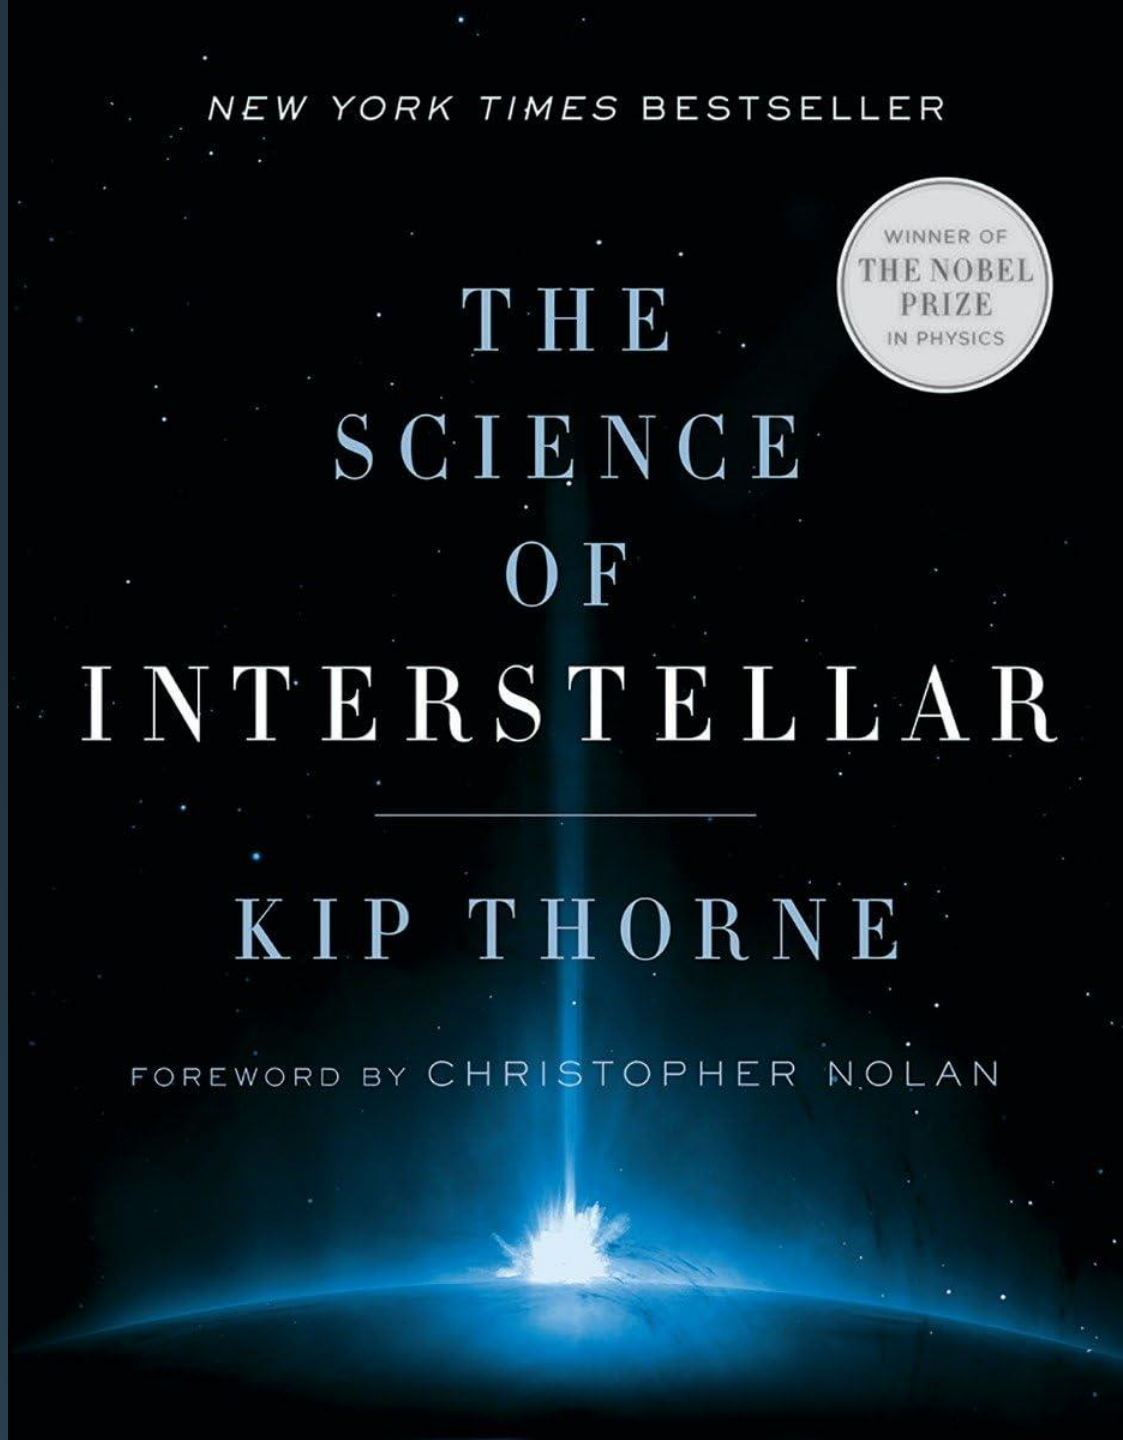





Олексій Просніцький

+ 38 067 4054701

mvp@leoconsulting.com.ua

LEO Consulting

